

แผนงานก่อสร้างและผลงานการปฏิบัติงาน


แผนงานก่อสร้างและผลงานการปฏิบัติงาน งานทาง/สะพาน/อาคาร ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน ::	สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)
จำนวนสัญญา ::	83 แผน
รองลงนาม ::	0 แผน
มูลค่าตามสัญญา ::	1,121,138,259 บาท
วันที่รายงาน ::	25 สิงหาคม 2565

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนแผนงาน	แผนงานสะสม (%)	ผลงานสะสม (%)	แผนเบิกจ่ายสะสม (%)	ผลเบิกจ่ายสะสม (%)	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
1	สทล. 8 (มหาสารคาม)	3	100.00	65.79	100.00	82.32	1
2	มหาสารคาม	42	100.00	99.98	99.90	99.73	40
3	ยโสธร	15	100.00	99.69	98.95	87.98	11
4	ร้อยเอ็ด	11	100.00	98.55	99.98	96.86	10
5	กาฬสินธุ์	12	100.00	100.00	100.00	100.00	12
รวม		83	100.00	99.58	99.75	97.07	74
เบิกจ่ายสะสม 1,088,304,937.37 บาท							
ผลงาน -0.42 %							
ผลเบิกจ่าย -2.68 %							

แผนงานก่อสร้างและผลงานการปฏิบัติงาน 2565

รายงานการเบิกจ่าย

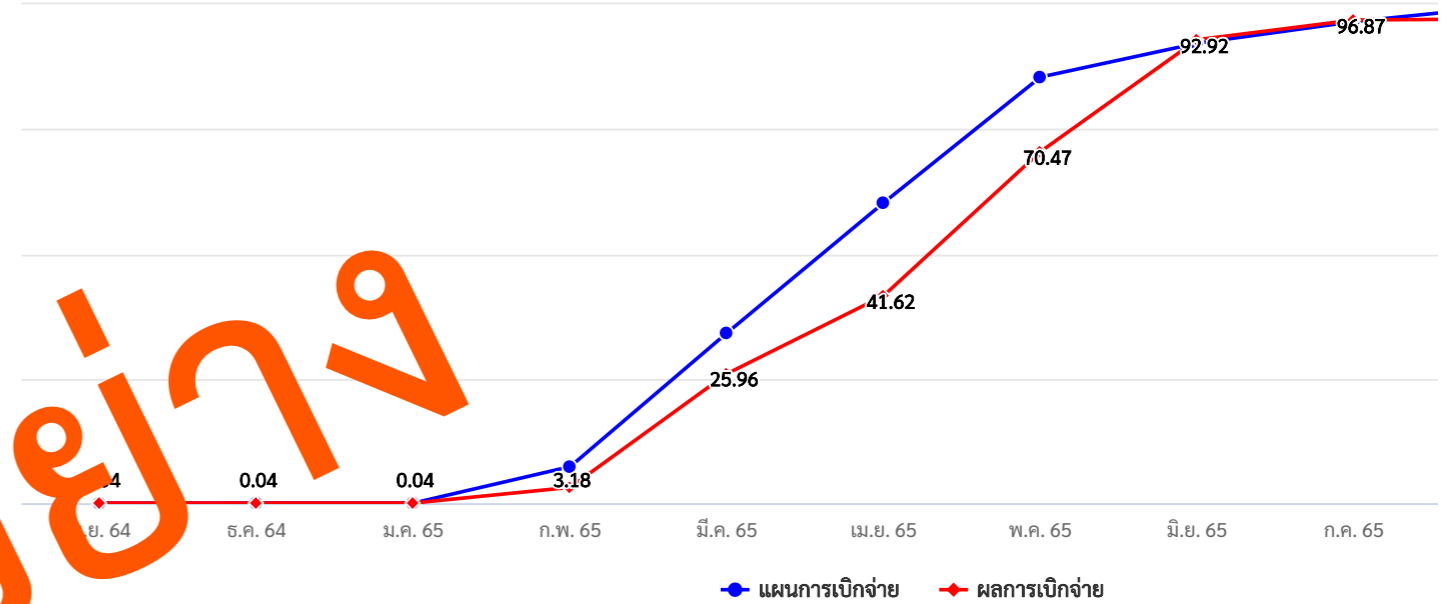

ตัวเลขอย่าง

รายการ	2564				2565							
	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
แผนงาน (%)	ก่อสร้าง ประจำเดือน	0.01	0.03	0.21	9.16	36	39.58	11.24	2.89	0.83	0.05	0
	ก่อสร้าง สะสม	0.01	0.04	0.25	9.41	45.41	84.99	96.23	99.12	99.95	100	100
	เบิกจ่าย ประจำเดือน	0	0.04	0	7.3	26.8	26.1	25.19	6.78	4.32	3.21	0.17
	เบิกจ่าย สะสม	0	0.04	0.04	7.34	34.14	60.24	85.43	92.21	96.54	99.75	99.92
ผลงาน (%)	ก่อสร้าง ประจำเดือน	0	0.04	0.31	5.38	29.18	25.56	18	16.95	2.39	1.77	
	ก่อสร้าง สะสม	0	0.04	0.35	5.74	34.92	60.48	78.48	95.43	97.82	99.58	
	เบิกจ่าย ประจำเดือน	0.04	0	0	3.14	22.78	15.66	28.85	22.45	3.95	0.2	
	เบิกจ่าย สะสม	0.04	0.04	0.04	3.18	25.96	41.62	70.47	92.92	96.87	97.07	
