

## ขั้นตอนการทำงานระบบ PLANNET

ขั้นตอนที่ 1 แนวทางหลวง ส่งแผนฯ สำนักงานทางหลวง

ขั้นตอนที่ 2 สำนักงานทางหลวง ตรวจสอบ เสนอ สำนักบริหารบำรุงทาง

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้า

### ขั้นตอนการติดตามความก้าวหน้าแผนงบประมาณ งานปีเดียว พ.ร.บ.ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่านระบบบริหารแผนงานทางหลวง PLANNET


ลำดับ ที่	หน่วยงาน	การอนุมัติผ่านระบบ	รายงานสถานะ ความก้าวหน้าแผนฯ
1	แขวงฯ	แนบไฟล์ PDF แผนฯ และ Breakdown และ กต “เสนอแผนรายประมาณการ”	กรอกข้อมูล วันที่หนังสือนำส่งจากแขวงฯไป สทล.
2	สทล.	กต “ตรวจสอบแผน”	กรอกข้อมูล วันที่หนังสือนำส่งจาก สทล.ไป ส่วนกลาง
3	ส่วนกลาง (สผ. สร. สป.)	กต “เห็นชอบแผน”	กรอกข้อมูล วันที่หนังสือเห็นชอบแผนจากส่วนกลาง
4	แขวงฯ		รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง <ul style="list-style-type: none"> <li>● ข้อมูลการเผยแพร่ TOR</li> <li>● ข้อมูลการออกประกาศ</li> <li>● ข้อมูลการเสนอราคา</li> <li>● ข้อมูลการอนุมัติรับราคา</li> <li>● ข้อมูลผลประกวดราคา</li> </ul>
5	ส่วนกลาง (สผ. สร. สป.)	กต “ขออนุมัติจัดสรรเงินงวด”	รายงานการขออนุมัติเงินงวด <ul style="list-style-type: none"> <li>● ข้อมูลการอนุมัติเงินงวด</li> </ul>
6	กองบัญชี	กต “อนุมัติจัดสรรเงินงวด”	เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ GFMS ของสำนักงานประมาณ
7	แขวงฯ		รายงานการลงนามสัญญา และเปิด PO <ul style="list-style-type: none"> <li>● ข้อมูลสัญญา</li> </ul> รายงานการบริหารสัญญา <ul style="list-style-type: none"> <li>● ข้อมูลแผนงาน แผนเบิกจ่าย</li> <li>● ข้อมูลผลงาน ผลเบิกจ่าย</li> <li>● ข้อมูลการส่งมอบและตรวจรับงาน</li> </ul>

\*หมายเหตุ

ขอความร่วมมือดำเนินการตามระบบให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน เพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายผ่านระบบ ของทุกหน่วยงานได้อย่างทันต่อสถานการณ์และข้อเท็จจริง

## คู่มือระบบบริหารแผนงานทางหลวง PLANNET

Log in	Plannet.doh.go.th	
แขวงทางหลวง	(User&Pass)	disxxx (xxx ใส่รหัสแขวงทางหลวง)
เขตทางหลวง	(User&Pass)	divxxx (xxx ใส่รหัสเขตทางหลวง)

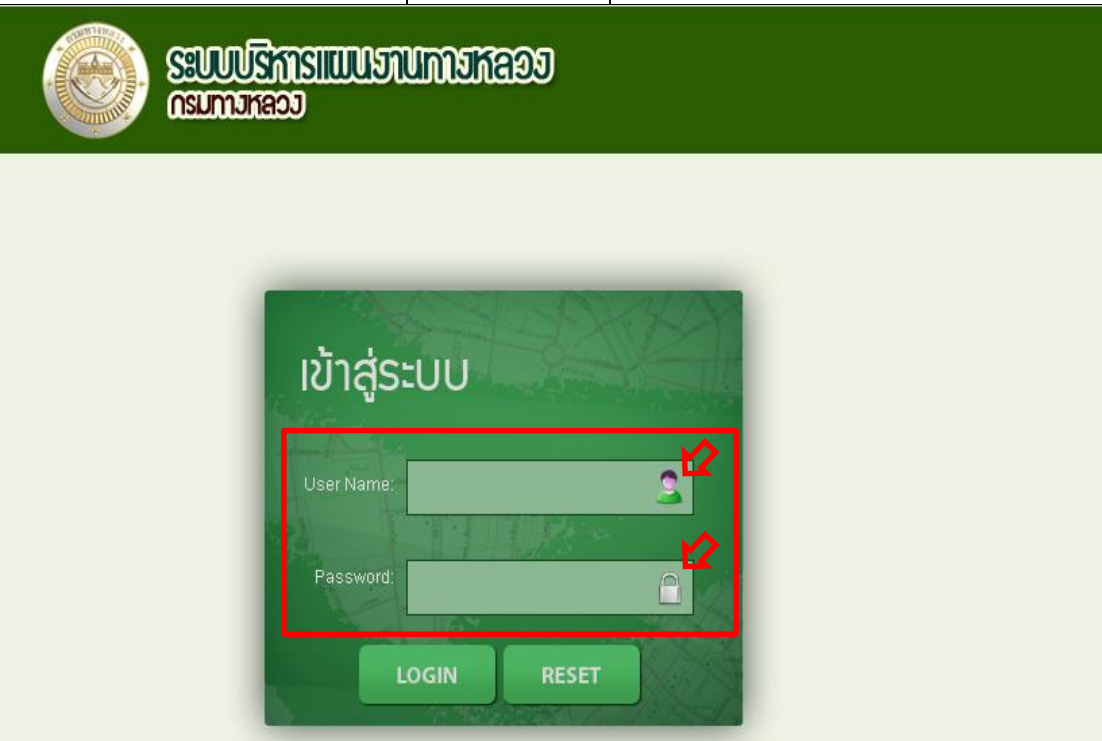

- ในส่วนของศูนย์สร้างทาง และ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 - 4

User Name และ Password คือ disxxx (xxx คือ รหัสศูนย์)

ชื่อหน่วยงาน	รหัส
ศูนย์สร้างทางลำปาง	101
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก	102
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น	103
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี	104
ศูนย์สร้างทางสงขลา	105
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)	718
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)	719
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)	755
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)	756

ขั้นตอนการลงข้อมูลระบบบริหารแผนงานทางหลวง PLANNET (ระดับแขวงทางหลวง)

<p>ขั้นตอน1 แขวงฯ ส่งแผนฯ สทล.</p>	<p>(1.) เลือก บัญชีแผนงาน (2.) เลือก จัดทำแผนรายประมาณการแผนประจำปี (ระบบจะแสดงจำนวนแผนที่หน่วยงานยังไม่ได้แนบแผนฯ)</p>
<p>ค้นหาแผนฯ ตามรหัสงาน</p>	<p>(3.) เลือก รหัสงาน (ระบบแสดงรายการแผนที่ยังไม่ได้แนบแผนฯ) (4.) กดค้นหาข้อมูล (ระบบจะแสดงรายการแผน) (5.) กดปุ่ม เพิ่มแผนฯ (ระบบจะแสดงหน้าต่างระบุข้อมูลพื้นฐาน)</p>

ลงข้อมูลรายละเอียดแผนฯ	กรอกสาระสำคัญของแผนฯ ที่ปรากฏในรูปแบบฟอร์มสรุป
รหัสงานย่อย	(6.) เลือกรหัสงานย่อย (ถ้ามี เช่น งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ 20510)
งบประมาณที่เสนอ	(7.) กรอก งบประมาณตามเล่มแผนฯ
รูปแบบการดำเนินงาน	(8.) เลือกจ้างเหมา/ดำเนินการเอง/จ้างเหมาและดำเนินการเอง
เวลาดำเนินการ	(9.) กรอก วันดำเนินการ สภาพทางเดิม/รายละเอียดแผน/เหตุผลความจำเป็น
ข้อมูลที่ตั้งโครงการ	(10.) ระบุ กม.ดำเนินการ ตามเล่มแผนฯ (สามารถเพิ่มมากกว่า 1 ช่วง กม. กรณีดำเนินการเป็นช่วงๆ) (11.) กดถัดไป (ระบบจะแสดงหน้าต่างระบุข้อมูลพื้นฐาน)

ถัดไป >>

รหัสแผนงาน : 02-2563-531-0036

ปีงบประมาณ : 2563

สำนัก : สำนักบริหารช่างทาง

สำนักงานกองช่าง : สำนักบริหารช่างทางที่ 2 (แม่พ)

กิจกรรมหลัก : ป่าชุมชนทางหลวง

แหล่งงบประมาณ : งบประมาณประจำปี

งบประมาณ : 10,500,000.00 บาท

แชร้งางหลวง : แม่พ

รหัสงาน : 22100 : งานควบคุมและก่อสร้าง

**ระบุข้อมูลพื้นฐาน**

รหัสงบประมาณ : 22100 : งานควบคุมและก่อสร้าง ↗ 9.

งบประมาณตามบัญชี : 10,500,000.00 บาท

ปีงบประมาณ : 58.020.00 ↗ 9.

รหัสงานย่อย :  ↗ 6.-8.

งบประมาณที่เสนอ : 0.00

รูปแบบการดำเนินงาน : งานจ้างเหมา

เวลาดำเนินการ : 0  วัน

สภาพทางเดิม :

รายละเอียดของงาน :

เหตุผลและความจำเป็น :

ระบุข้อมูลที่ตั้งโครงการ

เลือก  9999  0+000 - 0+000

ชื่อถนน :  0  - 0  รูปแบบ (xxx+xxx.xxx)

ทางหลัก  ทางขนาน

LT+RT

หมายเหตุ :

เห็นด้วยทาง ↗ 10.

หมายเลข	ชื่อย่อ	ชื่อถนน	ชื่อถนนในแผนงาน	งบ.เริ่มต้น	งบ.สิ้นสุด
11	0602	ปางตะ - ปางะโอ	ปางตะ - ปางะโอ ตอน 3	400+566.000	406+300.000

11. ↗

ถัดไป >>



ขั้นตอนการลงข้อมูลระบบบริหารแผนงานทางหลวง PLANNET (ระดับสำนักงานทางหลวง)

**ขั้นตอนที่ 2**  
สทล. ตรวจสอบ เสนอ สร.

(1.) เลือก บัญชีแผนงาน  
(2.) เลือก พิจารณาแผน

ระบบบริหารแผนงานทางหลวง (กรมทางหลวง)

บัญชีแผนงานที่เลือกใช้งาน : 2563

ปีงบประมาณที่เลือกใช้งาน : 2563

ปีงบประมาณที่เลือกใช้งานโดยกองช่าง : 2563

- ข้อมูลการสำรวจ
- บัญชีความคืบหน้าโครงการ : 2563
- บริหารงบประมาณ : 2563
- บัญชีแผนงาน : 2563

พจน. ประจำปี

ส่งแผนรายปีประมาณการ  
133 แผน

พิจารณาแผน

พิจารณาแผน  
96 แผน

พจน. ประจำปี

จัดทำแผนรายปีประมาณการประจำปี  
(ส่งไปบัญชีความคืบหน้าโครงการประมาณ)

จัดทำแผนรายปีประมาณการอื่นๆ  
(ไม่ส่งไปบัญชีความคืบหน้าโครงการประมาณ)

สรุป  
แผนรายปีประมาณการ

- สถานะโครงการก่อสร้าง : 2563
- พิมพ์รายงาน
- แผนที่

**ค้นหาแผนฯตามรหัสงาน**

(3.)เลือกรหัสงาน (ระบบแสดงรายการแผนที่ยังไม่ได้แนบแผนฯ)  
(4.)กดปุ่ม เพื่อไป พิจารณาแผนฯ

ระบบบริหารแผนงานทางหลวง (กรมทางหลวง)

ปีงบประมาณที่เลือกใช้งาน : 2563

ปีงบประมาณที่เลือกใช้งานโดยกองช่าง : 2563

ค้นหาแผนงานตามรายการหรือพิจารณา

ปีงบประมาณ : 2563

สำนัก : เลือกทั้งหมด

รหัสงาน : 22100:งานหนักและสปีด

แผนงาน : เลือกทั้งหมด

ประเภท : เลือกทั้งหมด

รหัสงาน	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อแผน	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ระยะทาง	งบประมาณ จัดสรร	แขวง	ปีงบเงิน	งบรวม	สถานะ	ดำเนินการ
22100	109	แม่สรวย - ห่มป่าไร่	0+000	10+000	9.300	13,000,000	เชียงใหม่ 1	92,916,000	คร.ม.	ดำเนินการ	พิจารณาแผน
22100	118	คลองยางแก้ว - หาดหิน 1	64+500	69+000	4.500	12,000,000	เชียงใหม่ 1	91,468,000	คร.ม.	ดำเนินการ	พิจารณาแผน
22100	1130	ป่าขาม - คีรีตอง	42+500	50+553	8.353	13,000,000	เชียงใหม่ 1	92,146,000	คร.ม.	ดำเนินการ	พิจารณาแผน
22100	1190	จำนง - เติล่องำ	1+000	4+000	3.000	13,000,000	เชียงใหม่ 1	91,604,000	คร.ม.	ดำเนินการ	พิจารณาแผน
	1190	จำนง - เติล่องำ	16+000	23+175	7.175						
22100	1202	พญา - สันติชน	2+400	19+000	16.600	12,000,000	พญา	89,805,000	คร.ม.	ดำเนินการ	พิจารณาแผน
22100	1251	น้ำเงิน - เขื่อนวร	36+150	47+730	11.580	15,000,000	พญา	108,752,000	คร.ม.	ดำเนินการ	พิจารณาแผน

แผนงานทั้งหมด : 6 แผน    งบประมาณรวม : 78,000,000.00 บาท

● แร่งส่งแผน   
 ● เสร็จสิ้นแล้ว   
 ● ส่วนกลางให้คะแนน   
 ● ไม่พิจารณา

สทล. ตรวจสอบแผน ในระบบ

(5.)เลือก ตรวจสอบแล้ว

(6.)กดปุ่ม บันทึกการอนุมัติ

ระบบบริการแผนงานทางหลวง  
กรมทางหลวง

ปี งบประมาณ: ๒๕๖๓ | ผู้ใช้งาน: เป็ญจกิตติวัฒน์ | ออกจากระบบ  
 div530 | วันที่: 27 มิถุนายน 2563 |  
 สำนักงาทางหลวงที่ 2 (นพ)

ข้อมูลบัญชีแผนงาน ▼

<b>จัดสรรงบประมาณ :</b>	<b>ประเภท :</b> แผนประจำปี
<b>ปีงบประมาณ :</b> 2563	<b>แหล่งงบประมาณ :</b> งบประมาณประจำปี (บัญชี 63-พจน.(๑๐10))
<b>แผนงาน :</b> แผนงานพื้นฐานด้านความปลอดภัยทางถนนในทางแขวงชั้น	<b>รหัสชื่อ/โครงการ :</b> โครงการทางหลวงได้รับการบูรณาการ
<b>ID Code :</b> 632097	<b>กิจกรรมหลัก :</b> บำรุงรักษาทางหลวง
<b>จัดสรร :</b> 22100 :: งบดำเนินงานและสิ่งก่อสร้าง	<b>จัดสรรย่อย :</b>
<b>สำนักงาทางหลวง :</b> สำนักงาทางหลวงที่ 2 (นพ)	<b>แนวทางการง :</b> แนวทางการงถึงรายการที่ 1
<b>วงเงินแผน พ.ร.บ./พ.ร.ด :</b> 13,000,000.00 บาท	<b>งบประมาณเงิองง :</b> 13,000,000.00 บาท

รายละเอียดโครงการ

การพิจารณาแผน

ผลการพิจารณา :  ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ไม่ได้รับชอบ

คำอธิบาย :

โดย : div530 ผ่านทาง :: สำนักงาทางหลวง :: สำนักงาทางหลวงที่ 2 (นพ)  
วันที่พิจารณา : 27 มิถุนายน 2563 IP 172.16.8.5


บันทึกการอนุมัติ

ขั้นตอนการลงข้อมูลระบบบริหารแผนงานทางหลวง PLANNET  
(ระดับสำนักงานทางหลวง, แขนงทางหลวง)

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานความก้าวหน้า

- (1.) เลือกสถานะโครงการก่อสร้าง: 2563
- (2.) เลือกรายงานความก้าวหน้า

เลือกแผนงาน

- (3.) เลือกรหัสงาน
- (4.) กดค้นหาข้อมูล
- (5.) กดเลือก  แก้ไขสถานะ



ข้อมูลการพิจารณาแผน	ส่วนภูมิภาค
แขวงทางหลวง (1.)	- เลือกส่งแผน - ทำเครื่องหมายถูกที่กล่อง ลงวันที่ กรอกข้อมูล วันที่ส่งแผน กรอกข้อมูลเลขที่หนังสือนำส่งแผน
สำนักงานทางหลวง (2.)	- เลือกอนุมัติ - ทำเครื่องหมายถูกที่กล่อง ลงวันที่ กรอกข้อมูล วันที่ส่งแผน กรอกข้อมูลวันที่อนุมัติแผน เลขที่หนังสือนำส่งแผน

หน้าหลัก | คู่มือการใช้งาน | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | หน้า 4

แขวงทางหลวง

---


ข้อมูลแผนรายประเภทการ


รหัสประเภทการ :	ประเภท :	แผนประจำปี
ปีงบประมาณ : 2563	แผนงบประมาณ :	งบประมาณประจำปี (บัญชี 63-ทบ. (ง10))
แผนงาน :	แผนงานพื้นฐานด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน	หมวดหมู่/โครงการ :
ID Code : 631813		โครงการ/โครงการ :
รหัสงาน :	22200 :: งานเสริมกิจกรรม	กิจกรรมหลัก :
สำนักงานทางหลวง :	สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	รหัสงานย่อย :
วงเงินตาม พ.ร.บ./พ.ร.ก. :	11,000,000.00 บาท	แขวงทางหลวง :
		งบประมาณจัดสรร :
		11,000,000.00 บาท

แก้ไขข้อมูลการพิจารณาแผน บันทึก ย้อนกลับ

ข้อมูลเงิน/โครงการ เลขที่ :

ส่วนภูมิภาค

1.  แขวงทางหลวง

2.  สำนักงานทางหลวง

\*ส่งแผน  ออนไลน์  ส่งร่าง

วงเงินแผน/วงเงินขอ : 11,000,000.00 บาท

เลขที่ :

ลงวันที่ : 27 / 6.ค. / 2563

ลงวันที่ : 27 / 6.ค. / 2563

เลขที่ : สวท 1 268


ส่วนกลาง

สน./สร./สป. :

ลงวันที่ : 28 / 6.ค. / 2563

วงเงินเงินขอ : 11000000

การจัดซื้อจัดจ้าง	1.ข้อมูลการหาตัวผู้รับจ้าง
	2.ข้อมูลการพิจารณาผล
	3.ข้อมูลการรับราคา
	4.ข้อมูลการขออนุมัติเงินงวด


ระบบบริหารแผนงานทางหลวง  
กรมทางหลวง

หน้าหลัก | คู่มือการใช้งาน | เปลี่ยนรหัสผ่าน | ออกจากระบบ  
 dms21  
 แรจกทกรมหลวงชนบท

**ข้อมูลแผนงานประเภทงาน** บันทึก

รหัสงานประเภท :	ประเภท :
ปีงบประมาณ : 2563	แผนประจำปี
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านกาสร้างถนนทางหลวงในภาคเหนือ	งบประมาณประจำปี (บัญชี 63-พจน.(สูง10))
ID Code : 631813	ผลผลิต/โครงการ : โครงการทางหลวงได้บริการบำรุงรักษา
รหัสงาน : 22200 :: งานเสริมคันแอสฟัลต์	กิจกรรมหลัก : บำรุงรักษาทางหลวง
สำนักงานแหล่งผล : สำนักงานหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	รหัสงานหลัก :
วงเงินตาม พ.ร.บ./พ.ร.ก : 11,000,000.00 บาท	วงเงินตามแผน :
	วงเงินตามงบ : แผนหลวงเชียงใหม่ที่ 1
	งบประมาณจัดสรร : 11,000,000.00 บาท

**แก้ไขข้อมูลกลุ่มสัญญา** บันทึก

**ข้อมูลหลัก**

การหาตัวผู้รับจ้าง

วันที่ลงเชิญใบขายการ : 27 / 5.ค. / 2563	
ด้วยวิธี : ควบคู่กัน	วงเงินราคากลาง : 0
วันที่ยื่นซองราคากลาง : 27 / 5.ค. / 2563	
วันที่ลงประกาศซองซองงาน (TOR) : 27 / 5.ค. / 2563	
วันที่ลงเปิดซองจ้าง : 27 / 5.ค. / 2563	
วันที่ขายเอกสารประกวดราคา : 27 / 5.ค. / 2563	ตั้งวันที่ : 27 / 5.ค. / 2563
	จำนวนผู้ซื้อแบบ : 0

การพิจารณาผล

วันที่เสนอราคา : 27 / 5.ค. / 2563	จำนวนผู้ยื่นเอกสาร : 0
วันที่ยื่นเอกสาร : 27 / 5.ค. / 2563	จำนวนผู้มีสิทธิ์เสนอ : 0
	วงเงินเสนอราคา : 0.00

การรับราคา

วันที่เสนอซองผู้รับราคา : 27 / 5.ค. / 2563	
วันที่ประกาศผลประกวดราคา : 27 / 5.ค. / 2563	วงเงินประกาศผลประกวดราคา : 0
ผู้รับจ้าง : <input type="text"/>	
ไฟล์แนบ (ขนาดไม่เกิน 5120 KB ต่อไฟล์)	
ไฟล์แนบประกวดราคา : <input type="text"/>	

การขออนุมัติเงินงวด

วันที่เสนอสำนักงบประมาณ : 27 / 5.ค. / 2563	วันที่สำนักงบประมาณเห็นชอบ : 27 / 5.ค. / 2563
วันที่เสนอกระทรวงฯ / กรม : 27 / 5.ค. / 2563	วันที่กระทรวงฯ / กรมอนุมัติ : 27 / 5.ค. / 2563

**ข้อมูลผู้สิทธิ์เสนอราคา** เพิ่ม

ไม่มีข้อมูล
-------------

ข้อมูลสัญญา

1.รายละเอียดสัญญา

2.การส่งมอบและตรวจรับงาน



ระบบบริหารแผนงานทางหลวง  
กรมทางหลวง

คู่มือการใช้งาน | คู่มือการใช้งาน | เปลี่ยนรหัสผ่าน | ...  
แนวทางการใช้งาน

ข้อมูลแผนรายปีรวมการ		แก้ไข
รหัสงบประมาณ :	ประเภท :	
ปีงบประมาณ : 2563	แผนรายปี :	
แผนงาน :	แหล่งงบประมาณ :	
ID Code : 631813	ผลผลิต/โครงการ :	
รหัสงาน :	กิจกรรมหลัก :	
สำนักงานทางหลวง :	รหัสงานย่อย :	
วงเงินตาม พ.ร.บ./พ.ร.ศ. : 11,000,000.00 บาท	วงรวมทางหลวง : 1	
	วงรวมทางหลวงเชิงใหม่ที่ 1	
	งบประมาณจัดสรร : 11,000,000.00 บาท	

แก้ไขข้อมูลสัญญา บันทึก

สัญญา

1. สัญญาเลขที่ :

วันที่เริ่มสัญญา/ดำเนินการ : 27 / 12 / 2563

ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา : 90 วัน

ผู้รับจ้างก่อสร้าง :

สัญญาฉบับย่อ (พ.1-05) :

\*กรณีแก้ไขวันที่เริ่มสัญญาใหม่ ระบบจะลบข้อมูลแผนดำเนินการและรายงานความก้าวหน้าที่ไม่อยู่ในช่วงวันที่ดำเนินการ\*

สรุปผลงาน

2. ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ : 27 / 12 / 2563

จำนวนวันส่งงานเข้า :

ค่าจัดส่งจริง : 0.00 บาท

ตารางรับงานวันที่ : 27 / 12 / 2563

ค่าปรับปิดสัญญาจำนวนทั้งสิ้น :

ข้อมูลประวัติสัญญาเบื้องต้น

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลการเงินและบัญชี  
(เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ GFMS จากระบบ  
สำนักงบประมาณ)

- 1.รายละเอียดการขออนุมัติเงินงวด
- 2.รายละเอียดการจัดสรรงบ(ใบGF)
- 3.สถานะเบิกจ่ายงบประมาณ

ข้อมูลบัญชีแผนงาน	
รหัสงบประมาณ :	0800630002410006, 0800628702410404
ปีงบประมาณ :	2563
แผนงาน :	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขัน
ID Code :	631002
รหัสงาน :	21000 :: งานบำรุงปกติ
สำนักงานแหล่งวง :	สำนักงานแหล่งวงที่ 1 (เชียงใหม่)
วงเงินตาม พ.ร.บ./พ.ร.ก :	46,960,000.00 บาท
ประเภท :	แผนประจำปี
แหล่งงบประมาณ :	งบประมาณประจำปี (บัญชี 63-บำรุงปกติ)
ผลผลิต/โครงการ :	โครงการแหล่งวงได้รับการบำรุงรักษา
กิจกรรมหลัก :	บำรุงรักษาแหล่งวง
รหัสงานย่อย :	
แหล่งวงแหล่งวง :	แหล่งวงแหล่งวงเชียงใหม่ที่ 1
งบประมาณจัดสรร :	46,960,000.00 บาท



รายละเอียดโครงการ	การพิจารณาแผน	ค้นหาสัญญา	ข้อมูลสัญญา	<b>ข้อมูลทางบัญชี</b>	กำหนดคณะทำงาน	กำหนดแผนดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย	รายงานงาน
-------------------	---------------	------------	-------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-------------------------	-----------

ข้อมูลทางบัญชี  
 ชื่อรายการตาม พ.ร.บ. : งานบำรุงปกติแหล่งวงแหล่งวงเชียงใหม่ที่ 1 เป็นโครงการย่อย

รายการขออนุมัติเงินงวด **1.**

เลขที่หนังสือ	วันที่ขออนุมัติเงินงวด	ชำระจากระบบ PlanNet
สร.1/3681	10 ธ.ค. 2562	<input checked="" type="checkbox"/>

การจัดสรรงบ (ใบGF) **2.**

	วันที่อนุมัติเงินงวด	-/+	ยอดเงิน
10045/2563/8	16 ธ.ค. 2562	+	23,313,500.00
10284/2563/8	02 มี.ค. 2563	+	23,286,500.00
วันที่อนุมัติเงินงวด : 16 ตุลาคม 2562		วงเงินอนุมัติเงินงวดรวม : 46,600,000.00 บาท	

สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ **3.**

รหัสงบประมาณ	จัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	รวมใบสั่งซื้อ/สัญญาและเบิกจ่าย	คงเหลือ
0800628702410404	46,600,000.00	11,785.00	4,966,221.11	4,978,006.11	41,621,993.89
0800630002410006	23,313,500.00	0.00	17,806,201.97	17,806,201.97	5,507,298.03
<b>รวม</b>	<b>69,913,500.00</b>	<b>11,785.00</b>	<b>22,772,423.08</b>	<b>22,784,208.08</b>	<b>47,129,291.92</b>
ณ วันที่ : 27 มีนาคม 2563		เวลา : 15.37 น.			

สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกัน)  
 ไม่มีข้อมูล  
 ณ วันที่ : - เวลา : -

แผนดำเนินโครงการ

กรอกข้อมูลแผนงาน และแผนเบิกจ่าย รายเดือน



ระบบบริหารแผนงานทางหลวง  
กรมทางหลวง

หน้าหลัก คู่มือการใช้งาน เปลี่ยนรหัสผ่าน  
แจ้งความประสงค์

ข้อมูลบัญชีแผนงาน ยืนยัน

รหัสโครงการ :	0800630002410006, 0800628702410404	ประเภท :	แผนประจำปี
ปีงบประมาณ :	2563	แหล่งงบประมาณ :	งบประมาณประจำปี (บัญชี 63-บำรุงปกติ)
แผนงาน :	แผนงานพื้นฐานด้านโครงสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ผลผลิต/โครงการ :	โครงการทางหลวงได้รับบริการบำรุงรักษา
ID Code :	631002	กิจกรรมหลัก :	บำรุงรักษาทางหลวง
รหัสงาน :	21000 :: งานบำรุงปกติ	รหัสงานย่อย :	
สำนักงานทางหลวง :	สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	แนวทางหลวง :	แนวทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
วงเงินตาม พ.ร.บ./พ.ร.ค. :	46,960,000.00 บาท	งบประมาณจัดสรร :	46,960,000.00 บาท

- รายละเอียดโครงการ
- การจัดทำแผน
- กองหน้าสัญญา
- ข้อมูลสัญญา
- ข้อมูลทางบัญชี
- กำหนดค่างาน
- กำหนดแผนดำเนินโครงการ**
- ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย
- รายงาน

กำหนดแผน บันทึก

	ความค่างาน (%)	การเบิกจ่าย (บาท)
ตุลาคม 2562	7.50	3,550,200.00
พฤศจิกายน 2562	9.61	4,510,200.00
ธันวาคม 2562	8.82	4,140,200.00
มกราคม 2563	7.75	3,640,200.00
กุมภาพันธ์ 2563	7.8	3,662,500.00
มีนาคม 2563	8.11	3,810,200.00
เมษายน 2563	8.17	3,835,134.00
พฤษภาคม 2563	9.23	4,335,134.00
มิถุนายน 2563	8.93	4,194,133.00
กรกฎาคม 2563	8.29	3,894,133.00
สิงหาคม 2563	7.87	3,695,962.00
กันยายน 2563	7.89	3,692,274.00
รวม :	100	46,960,000.00

หมายเหตุ : สามารถบันทึกแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อมีบัญชีแผนงาน "เงินต้นทำสัญญา" แล้วเท่านั้น

ผลการดำเนินงาน/ผลเบิกจ่าย

กรอกข้อมูลผลงาน และผลเบิกจ่าย รายเดือน

ข้อมูลบัญชีหน่วยงาน



รหัสงบประมาณ :	0800630002410006, 0800628702410404	ประเภท :	แผนประจำปี
ปีงบประมาณ :	2563	แหล่งงบประมาณ :	งบประมาณประจำปี (บัญชี 63-บำรุงปกติ)
แผนงาน :	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ผลผลิต/โครงการ :	โครงการทางหลวงได้รับกรมช่างศึกษา
ID Code :	631002	กิจกรรมหลัก :	บำรุงรักษาทางหลวง
รหัสงาน :	21000 :: งานบำรุงปกติ	รหัสงานย่อย :	
สำนักงานแหล่ง :	สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	แหล่งทางหลวง :	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
วงเงินตาม พ.ร.บ./พ.ร.ก. :	46,960,000.00 บาท	งบประมาณจัดสรร :	46,960,000.00 บาท

รายละเอียดโครงการ	การที่จรรยาแผน	ก่อนทำสัญญา	ข้อมูลสัญญา	ข้อมูลทางบัญชี	กำหนดค่างาน	กำหนดแผนดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย	รายงานงาน
-------------------	----------------	-------------	-------------	----------------	-------------	-----------------------	-------------------------	-----------

รายงานความก้าวหน้า

		2561							
		ความ	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม
ความก้าวหน้า (%)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
การเบิกจ่าย (บาท)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ปีเหตุ/อุปสรรค	แผน	1,870,979.35	3,282,821.06	3,091,065.22	5,889,538.43	4,380,030.99	4,601,647.90	3,554,730.28	3,667,411.11
	รวม	1,870,979.35	5,153,800.41	8,244,865.63	14,134,404.06	18,514,435.05	23,116,082.95	26,670,813.23	30,338,211.11

\*กรณีเป็นบัญชีหน่วยงานปี 2560 ขึ้นไปและเป็นโครงการย่อย ระบบจะดึงการเบิกจ่ายมาจาก งบประมาณประจำปี กรมทางหลวง

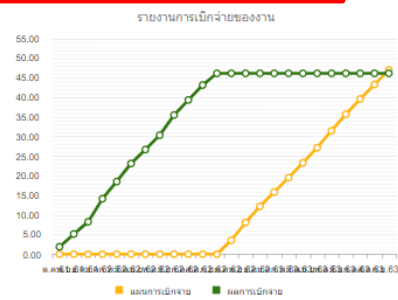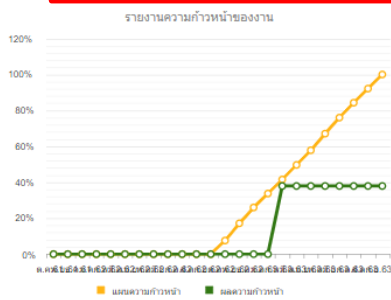


\*สามารถรายงานความก้าวหน้าได้ก็ต่อเมื่อ "เริ่มต้นทำสัญญา" และ "กำหนดแผนดำเนินโครงการ" แล้วเท่านั้น\*

ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด : แขวง เชียงใหม่ที่ 1


วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 16 มีนาคม 2563 11:11 น.

# ระบบ PLANET การลงแผนงานอาคาร (ขั้นตอนแขวงทางหลวง)

## 1. เข้าจัดทำแผนรายประมาณการ

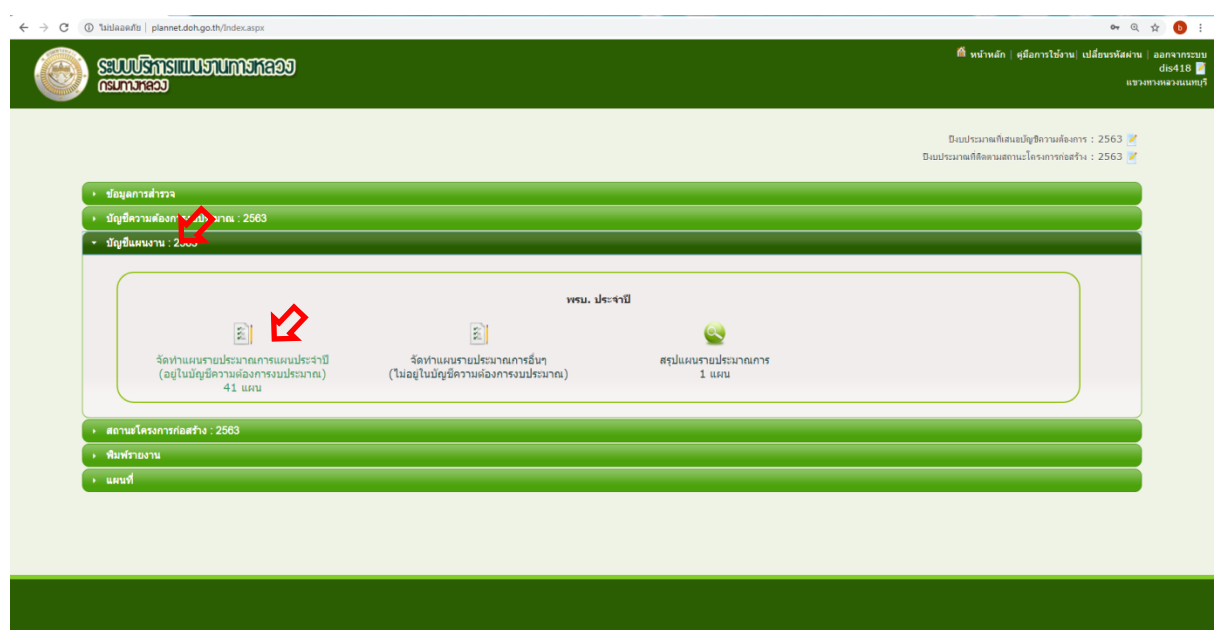

## 2. เลือกรหัสงบประมาณ งานอาคาร

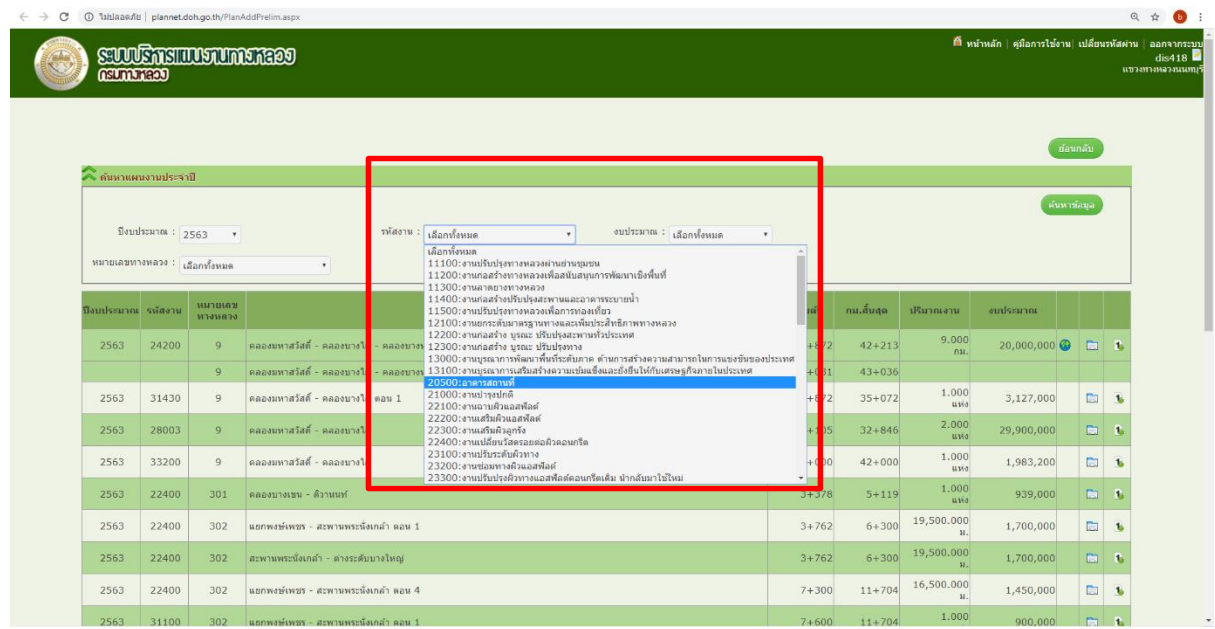

3. ระบบ PLANNET จะแสดงแผนงานประจำปี กดปุ่มเพื่อแนบไฟล์ PDF แผน ที่จะเสนอ

ระบบบริหารแผนงานทางหลวง กรมทางหลวง

ค้นหาแผนงานประจำปี

ปีงบประมาณ : 2563 รหัสงาน : 20500:อาคารสถานที่ งบประมาณ : เลือกทั้งหมด

ปีงบประมาณ	รหัสงาน	หมายเลขงานหลวง	ชื่อแผนงาน	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ปริมาณงาน	งบประมาณ	แนบไฟล์
2563	20510	9999	ศาลก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงโทรโยธ แขวงทางหลวงธนบุรี จ.นนทบุรี 1 หลัง	0+000	0+000	1,000 แห่ง	1,200,000	
2563	20520	9999	ศาลก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงธนบุรี แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	0+000	0+000	1,000 แห่ง	1,900,000	
2563	20520	9999	ศาลก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงบางใหญ่ แขวงทางหลวงธนบุรี จ.นนทบุรี 1 หลัง	0+000	0+000	1,000 แห่ง	1,900,000	
2563	20530	9999	ศาลปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงธนบุรี จ.นนทบุรี 1 แห่ง	0+000	0+000	1,000 แห่ง	900,000	
2563	20540	9999	ศาลปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงธนบุรี จ.นนทบุรี 1 แห่ง	0+000	0+000	1,000 แห่ง	1,000,000	

แผนงานทั้งหมด 5 แผน งบประมาณรวม 6,900,000.00 บาท

หมายเหตุ : ผู้ใช้งานระดับแขวงสามารถเพิ่มและลบรายการจากบัญชีความคืบหน้าการงบประมาณเพื่อสถานะ "เห็นชอบ" และ "ประกาศแผนงาน" แล้วเท่านั้น

4. เลือกแผนงานที่เสนอ แล้วจะแสดงหน้าต่าง การกรอกรายละเอียดของแผนงานอาคารฯ และกดถัดไป

รายละเอียดพื้นฐาน

รหัสงาน : 20500 : อาคารสถานที่ รหัสงานย่อย : 20510 : ศาลก่อสร้างอาคารที่...

งบประมาณตามบัญชี : 1,200,000.00 บาท งบประมาณประเมิน : 0.00

ปริมาณงาน : 1.00 แห่ง งบบริหารค่าจ้างงาน : งานจ้างเหมา

เวลาดำเนินงาน : 0 วัน

สภาพทางเดิม : [ ]

รายละเอียดของงาน : [ ]

เหตุผลและความจำเป็น : [ ]

ระบบบัญชีโครงการ

เลือก \* 9999 \* 0+000 - 0+000

ชื่อแผน : [ ] ประเภท (xxx+xxx.xxx)

หมวดหลัก : LT+RT หมวดงาน : -

หมายเหตุ : [ ]

ปุ่มส่งเวลา


รหัสงาน	ค่าเดิม	ชื่อแผน	ชื่องานในแผนงาน	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด
9999	9999		ศาลก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้าง	0+000.000	0+000.000

- 1.เลือกรหัสงานอาคาร 20500
- 2.เลือกรหัสย่อยงานอาคาร
- 3.งบประมาณที่เสนอ
- 4.ปริมาณงาน/แห่ง
- 5.รูปแบบการดำเนินการ
- 6.สภาพทางเดิม
- 7.รายละเอียดของงาน
- 8.เหตุผลความจำเป็น


ไม่ต้องกรอก



### 5.ระบุงรายการงาน ไม้ต้องกรอก จากนั้นกดถัดไป

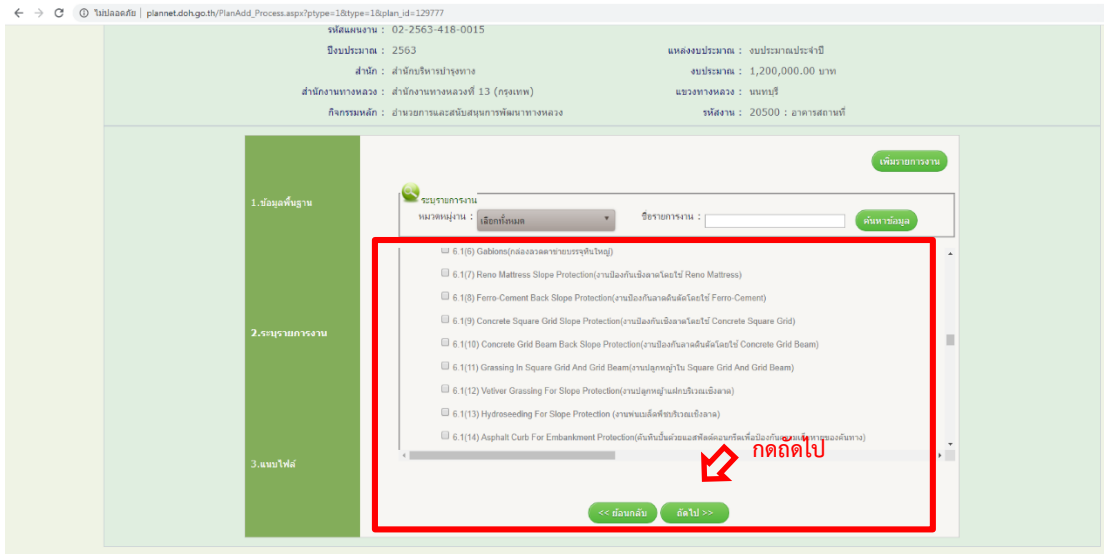

### 6.บันทึกไฟล์แนบ แนบไฟล์ เล่มแผนรายประมาณการ และ เล่ม Breakdown (ขนาดไฟล์ 20480 KB ต่อไฟล์) กดปุ่ม เสนอแผนรายประมาณการ

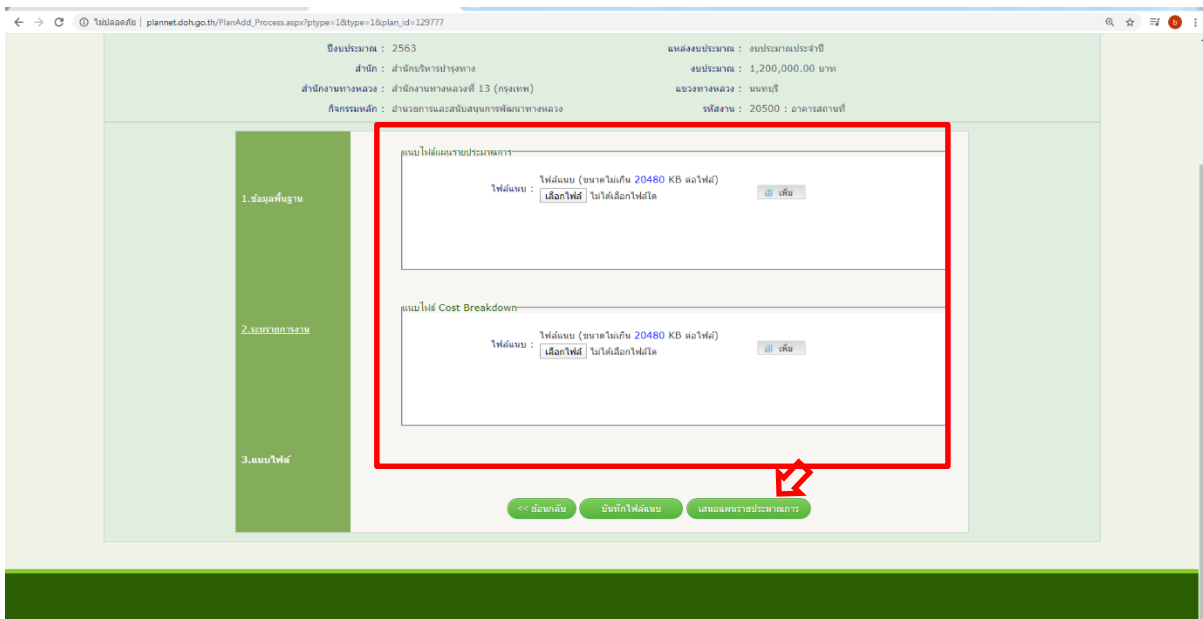

ขั้นตอนการเรียกดูรายงาน

รูปแบบรายงาน	สรุปสถานะจากข้อมูลในระบบ
	<p>สถานะรายแผนงาน</p> <p>- รูปแบบแนะนำ</p> <p>1.รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามรหัสงาน (แบบ ก-1) ข้อ 3.1</p> <p>2.รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (แบบ ก-3) ข้อ 3.3</p> <p>3.แบบฟอร์มติดตามความก้าวหน้า (1) ข้อ 3.7</p> <p>4.แบบฟอร์มติดตามความก้าวหน้า (3) ข้อ 3.9</p>

