



คู่มือใช้งานระบบบริหารแผนงานทางหลวง

PN2021

กรมทางหลวง

13 มิถุนายน 2567

เวลา 9.00 ถึง 10.00

ประชุมผ่านสื่อออนไลน์ระบบ Zoom Meeting

KU
KASETSART
UNIVERSITY

วางแผนการเบิกจ่าย



- 1 แผนรหัสงบประมาณเดียว
- 2 แผนใช้รหัสงบประมาณร่วมกัน



1. วางแผนการเบิกจ่าย

บัญชีความต้องการงบประมาณ

- ➕ เพิ่มบัญชีความต้องการ
- ☰ สรุปงาน
- 📅 จัดลำดับความสำคัญ
- 📅 งบประมาณจัดสรรเบื้องต้น
- 🔍 ค้นหาแผนงาน

แผนรายประมาณการ

- 📅 จัดทำแผนรายประมาณการ
- ☰ สรุปแผนรายประมาณการ
- ☰ บริมาณงาน

ติดตามโครงการ

- 📅 ติดตามความก้าวหน้า
- 📅 คาดการณ์จัดซื้อจัดจ้าง

📌 วางแผนการเบิกจ่าย

- แผนรหัสงบประมาณเดียว
- แผนใช้รหัสงบประมาณร่วมกัน

☰ ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

- 1. แผนรหัสงบประมาณเดียว**
การวางแผนการเบิกจ่าย ทุกๆรหัสงบประมาณที่แขวงได้รับงบประมาณ
- 2. แผนใช้รหัสงบประมาณร่วมกัน**
เป็นการวางแผนการเบิกจ่ายของแผนงานที่มีรหัสงบประมาณร่วมกัน
เช่น แผนงานขุดถนน และแผนงานขุดลอก



1. วางแผนการเบิกจ่าย

- แผนรหัสงบประมาณเดียว – ที่มาของข้อมูล

กำหนดแผนการเบิกจ่าย รหัสงบประมาณ : การวางแผน : ค้นหาข้อมูล

กำหนดแผนเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567
 การดำเนินการจากข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ ณ วันที่ 03 พ.ค. 2567 เวลา 16.10 น.
 แขนงทางหลวงสงขลาที่ 1

รหัสงบประมาณ	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลต่างระหว่างงบประมาณที่ได้รับและแผนการเบิกจ่าย	ปีงบประมาณ 2567											
				ค.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	
08006140004001000000	รายการงบประมาณประจำ งบบุคลากร : งบบุคลากร /งบส่วนราชการ	2,070,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,615.00	517,615.00	517,615.00
08006140004002000000	รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน : งบดำเนินงาน /งบส่วนราชการ	84,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,204.00	21,204.00	21,204.00
08006140004701000000	รายการงบประมาณประจำ งบบุคลากร : งบบุคลากร /งบส่วนราชการ	4,140,920.00	0.00	490,750.00	490,750.00	490,750.00	490,750.00	651,940.00	490,750.00	517,615.00	517,615.00	0.00	0.00	0.00	
08006140004702000000	รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน : งบดำเนินงาน /งบส่วนราชการ	187,894.00	0.00	20,702.00	20,702.00	20,702.00	20,702.00	23,732.00	38,946.00	21,204.00	21,204.00	0.00	0.00	0.00	
08006190013703220396	ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน	2,600,750.00	0.00	143,114.00	307,266.33	307,266.33	392,062.34	387,883.00	319,948.00	336,432.00	406,778.00	0.00	0.00	0.00	
08006190013703220441	ค่าควบคุมงานเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง	383,448.40	0.00	127,816.00	127,816.00	127,816.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08006190013705000037	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08006190014003220114	งานบูรณะโครงการทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองหะ - พังลา จ.สงขลา	20,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500,000.00	
08006190014003220115	งานบูรณะโครงการทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เนินพิชัย - คลองหะ จ.สงขลา	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	
08006190014003220116	งานบูรณะโครงการทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุหือ - เนินพิชัย ตอน 1 จ.สงขลา	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	
08006190014003220117	งานบูรณะโครงการทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุหือ - เนินพิชัย ตอน 2 จ.สงขลา	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	

เป็นการวางแผนการเบิกจ่าย ทุกๆรหัสงบประมาณ ที่แขวงหรือเขตได้รับจัดสรรงบประมาณ (อ้างอิงจากไฟล์ zfma47 ระบบ GFMIS) และกน.นำเข้าระบบ Plannet Account

*** หากตรวจสอบพบว่ารหัสงบประมาณ ชื่อรายการ หรืองบประมาณที่ได้รับ ไม่ถูกต้อง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กน. ***



1. วางแผนการเบิกจ่าย

• แผนรหัสงบประมาณเดียว

กำหนดแผนเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567
คาดการณ์จากข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2567 เวลา 08.39 น.
แนวทางหลวงสงขลาที่ 1

รหัสงบประมาณ	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลต่างระหว่างงบประมาณที่ได้รับและแผนการเบิกจ่าย	ปีงบประมาณ 2567					
				ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67
08006650006003220919	ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาคารสมุทรเร่งด่วน	99,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,172.00	
08006650006003220951	งานบำรุงปกตงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะและจุดจอดพักรถบรรทุก	242,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08006650007003210091	งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ค่างานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไข	2,985,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

รหัสงบประมาณ 1 และ 2 จะเป็นการวางแผนตามยอดรวมทั้งหมดของรหัสงบประมาณ 1 และ 2 และจะต้องวางแผนตามแผนงานอีกครั้ง

วางแผนเบิกจ่าย - แผนใช้รหัสงบประมาณร่วมกัน

ค้นหา

ปีงบประมาณ: 2567 | สำนักงานทางหลวง: สทล.18 (สงขลา) | แนวทางหลวง: สงขลาที่ 1 | รหัสส่งงบประมาณ: 08006650006003220919 | ค้นหา

ID Code	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	ชื่อตอน	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	งปม.ตามสัญญา	ผลต่างระหว่างงปม.และแผนเบิกจ่าย	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67
670191	407	0101	คลองพระ - ควนหิน	14+075	14+550	21,535.00	0.00		0.00	0.00	0.00	21,535.00	
670194	408	0202	สทิงพระ - เกาะยอ	138+061	139+300	69,402.00	0.00		0.00	0.00	0.00	69,402.00	
670195	4309	0100	สามแยกทุ่งหวัง - สงขลา	4+900	5+100	8,235.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8,235.00	



1. วางแผนการเบิกจ่าย

• แผนรหัสงบประมาณเดียว

กำหนดแผนการเบิกจ่าย รหัสงบประมาณ : การวางแผน : ค้นหาข้อมูล

กำหนดแผนเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567
 การดำเนินการจากข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ ณ วันที่ 03 พ.ค. 2567 เวลา 16.10 น.
 แขวงทางหลวงสงขลธานี 1

รหัสงบประมาณ	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลต่างระหว่างงบประมาณที่ได้รับและแผนการเบิกจ่าย	ปีงบประมาณ 2567											
				ค.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	
08006140004001000000	รายการงบประมาณประจำ งบบุคลากร : งบบุคลากร /งบส่วนราชการ	2,070,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,615.00	517,615.00	517,615.00
08006140004002000000	รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน : งบดำเนินงาน /งบส่วนราชการ	84,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,204.00	21,204.00	21,204.00
08006140004701000000	รายการงบประมาณประจำ งบบุคลากร : งบบุคลากร /งบส่วนราชการ	4,140,920.00	0.00	490,750.00	490,750.00	490,750.00	490,750.00	651,940.00	490,750.00	517,615.00	517,615.00	0.00	0.00	0.00	
08006140004702000000	รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน : งบดำเนินงาน /งบส่วนราชการ	187,894.00	0.00	20,702.00	20,702.00	20,702.00	20,702.00	23,732.00	38,946.00	21,204.00	21,204.00	0.00	0.00	0.00	
08006190013703220396	ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน	2,600,750.00	0.00	143,114.00	307,266.33	307,266.33	392,062.34	387,883.00	319,948.00	336,432.00	406,778.00	0.00	0.00	0.00	
08006190013703220441	ค่าควบคุมงานเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง	383,448.40	0.00	127,816.00	127,816.00	127,816.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2.

3.

1.

เป็นการวางแผนการเบิกจ่ายจากงบประมาณที่ได้รับ (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (2.)) เมื่อมีการโอนเปลี่ยนแปลงหรือดึงเงินกลับจะทำให้ยอดงบประมาณที่ได้รับเปลี่ยนแปลง แขวงจะต้องปรับการวางแผนให้ตรงกับงบประมาณที่ได้รับ

4.

- ขั้นตอนวางแผนการเบิกจ่าย
1. คีย์จำนวนเงินวางแผนเบิกจ่ายในแต่ละเดือน
 2. ยอดรวมการวางแผนต้องเท่ากับคอลัมน์ที่ 2
 3. ผลต่างระหว่างงบประมาณที่ได้รับและแผนการเบิกจ่ายต้องเป็น 0 ทุกแถวจึงจะสามารถบันทึกได้
 4. คลิก **บันทึก**



1. วางแผนการเบิกจ่าย

- แผนรหัสงบประมาณเดียว

หลังจากวางแผนการเบิกจ่ายแล้ว แขวงสามารถเรียกดูได้ในรายงานลำดับที่ 11

11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

11.1 เอกสารแนบ 2 - คัดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ

11.2 เอกสารแนบ 3 - คัดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ(เฉพาะรายการที่กันจ่าย)

13. แผนงานเงินกัน

13.1 แผนงานเงินกัน

13.2 แผนงานเงินกัน คัดการณ์จากเงินเหลือณ.วันที่ (ดึงข้อมูลจากที่ กง.ให้คัดการณ์เงินกันในระบบ Plannet Account)



1. วางแผนการเบิกจ่าย

- แผนรหัสงบประมาณเดียว

11.1 รายงานคาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ

แสดงแผนการเบิกจ่ายที่ได้บันทึกไว้ในสไลด์ที่ 6 ส่วนผลการเบิกจ่ายระบบจะดึงมาให้จากการนำเข้าสู่ข้อมูลจากระบบ GFMS โดยจะจำแนกตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ของแขวง

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567																
สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1																
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	ตัวเลข GFMS				แผน/ผลการเบิกจ่าย	ปีงบประมาณ 2567 (บาท)										
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย 1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน		คงเหลือ (บาท)		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3				
		เบิกจ่ายสะสม	%			ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,155,276.00	0.00	0.00 %	2,155,276.00												
บุคลากรภาครัฐ																
รายการบุคลากรภาครัฐ	2,155,276.00	0.00	0.00 %	2,155,276.00												
1) รายการประจำ งบบุคลากร : งบบุคลากร / งบส่วนราชการ	2,070,460.00	0.00	0.00 %	2,070,460.00	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,615.00	517,615.00	
2) รายการประจำ งบดำเนินงาน : งบดำเนินงาน / งบส่วนราชการ	84,816.00	0.00	0.00 %	84,816.00	ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,204.00	21,204.00	
					ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการแข่งขัน	3,719,163.88	435,027.35	11.70 %	3,284,136.53												
ผลผลิตที่ 1 โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา																
อำนวยความสะดวกสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง	3,625,643.88	383,965.40	10.59 %	3,241,678.48												
1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและชำนาญการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ.สงขลา	1,500,000.00	0.00	0.00 %	1,500,000.00	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
					ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ.สงขลา	1,200,000.00	0.00	0.00 %	1,200,000.00	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
					ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง	917,649.90	383,965.40	41.84 %	533,684.50	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	127,768.14	128,568.14	127,768.12	177,848.50	177,848.50	177,848.50	0.00	
					ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	2,304.00	129,776.65	126,144.30	125,740.45	0.00	0.00	0.00	
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการสำรวจและออกแบบ รวมทั้งสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา	7,993.98	0.00	0.00 %	7,993.98	แผนเบิกจ่าย	0.00	0.00	7,993.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



1. วางแผนการเบิกจ่าย

- แผนรหัสงบประมาณเดียว

11.2 รายงานคาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ(เฉพาะรายการที่กันจ่าย)

แสดงแผนการเบิกจ่ายที่ได้บันทึกไว้ในสไลด์ที่ 6 โดยจะดึงมาเฉพาะแผนที่มีการกันเงินไปปีงบประมาณถัดไป

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567															
สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1															
แผนงาน / ผลិត / โครงการ	ตัวเลข GFMS				แผน/ผลการเบิกจ่าย	ปีงบประมาณ 2565 (บาท)						แผน/ผลเบิกจ่ายรวมในปีงบประมาณ 2567 (บาท)	เงินกันจ่ายปีงบประมาณ 2568 (บาท)	รวม (บาท)	ชี้แจงเหตุผล
	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย		คงเหลือ (บาท)		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
		1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน				เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67				
		เบิกจ่ายสะสม	%												
1) งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าฉนวนวง - ควนลิ่ง จ.สงขลา	39,977,000.00	5,996,550.00	15.00 %	33,980,450.00	แผนเบิกจ่าย	-	-	5,996,550.00	5,996,550.00	5,996,550.00	13,991,950.00	31,981,600.00	7,995,400.00	39,977,000.00	
ผลการเบิกจ่าย						-	5,996,550.00	-	-	-	2,498,800.00	5,996,550.00			
2) งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงหมายเลข 4309 ตอน สท.แยกทุ่งหวัง - สงขลา จ.สงขลา	12,494,000.00	1,874,100.00	15.00 %	10,619,900.00	แผนเบิกจ่าย	-	1,874,100.00	-	-	-	2,498,800.00	4,372,900.00	8,121,100.00	12,494,000.00	
ผลการเบิกจ่าย						-	1,874,100.00	-	-	-		1,874,100.00			
3) งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 43 ตอน นท.จอม - จ.นบ. ตอน 1 จ.สงขลา	24,974,000.00	3,746,100.00	15.00 %	21,227,900.00	แผนเบิกจ่าย	-	-	3,746,100.00	-	-	13,735,700.00	17,481,800.00	7,492,200.00	24,974,000.00	
ผลการเบิกจ่าย						-	-	3,746,100.00				3,746,100.00			
4) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ.	1,398,000.00	-	0.00 %	1,398,000.00	แผนเบิกจ่าย	-	-	209,700.00	209,700.00	139,800.00	209,700.00	768,900.00	629,100.00	1,398,000.00	
ผลการเบิกจ่าย						-	-								
5) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ.สงขลา	1,200,000.00	-	0.00 %	1,200,000.00	แผนเบิกจ่าย	-	-	162,750.00	162,750.00	108,500.00	162,750.00	596,750.00	603,250.00	1,200,000.00	
ผลการเบิกจ่าย						-	-								
6) งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าฉนวนวง - ควนลิ่ง จ.สงขลา	40,000,000.00	5,996,700.00	14.99 %	34,003,300.00	แผนเบิกจ่าย	-	5,996,700.00	-	5,996,700.00	9,194,940.00	10,394,280.00	31,582,620.00	8,417,380.00	40,000,000.00	
ผลการเบิกจ่าย						-	5,996,700.00	-				5,996,700.00			
รวมงบประมาณ	120,043,000.00	17,613,450.00	14.67 %	102,429,550.00	แผนเบิกจ่าย	-	7,870,800.00	10,115,100.00	12,365,700.00	15,439,790.00	40,993,180.00	86,784,570.00	33,258,430.00	120,043,000.00	
ผลการเบิกจ่าย						-	13,867,350.00	3,746,100.00				17,613,450.00			



1. วางแผนการเบิกจ่าย

• แผนรหัสงบประมาณเดียว

13.1 แผนงานเงินกัน

แสดงแผนการเบิกจ่ายที่ทง.ได้ยืนยันในระบบแล้ว ว่าแผนงานใดจะเป็นแผนเงินกัน โดยจะแสดงแผนการเบิกจ่ายที่ได้วางแผนไว้ในสไลด์ที่ 6 และแสดงเป็นรายเดือน

รายงานข้อที่ 13.1 เปรียบเสมือนแผนเงินกันต้นปีงบประมาณถัดไป หากขึ้นปีงบประมาณถัดไปจะไม่สามารถแก้ไขแผนการเบิกจ่ายนี้ได้ *** กรณีที่ต้องการแก้ไขแผนการเบิกจ่ายเงินกัน จะต้องคาดการณ์จากเงินเหลือ ณ วันที่ ... ตามที่ทง.ระบุในระบบ Plannet Account ***

รายการ	ค.ง.เหลือ	ภายในปี งบประมาณ 2566			ปีงบประมาณ 2567 (เงินกัน)												รวมเงินกัน	บัญชีงบประมาณ	เหตุผลของความล่าช้า	หมายเหตุ	
จ่าย	เบิกจ่าย	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67	(บาท)				
04/2567	0.00	543,300.00	0.00	0.00	543,300.00	0.00	0.00	543,300.00	0.00	0.00	543,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1,629,900.00	ส. - บัญชี พ.ร.บ.		คงเหลือเฉพาะค่างานการบำรุงรักษา ระยะเวลา 12 เดือน (365 วัน)
03/2567	8,330,000.00	2,100,000.00	0.00	4,200,000.00	2,100,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	7,700,000.00	ส. - บัญชี พ.ร.บ. (งานอาคาร)	รายการปรับแผน	เนื่องจากงานสัญญาดังกล่าว จะ สัญญาในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 จะต้องมีการกันเงินไว้เบิกในปี 2567
	8,330,000.00	2,643,300.00	0.00	#####	2,643,300.00	2,800,000.00	2,800,000.00	543,300.00	0.00	0.00	543,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	9,329,900.00			

จากรูปเป็นแผนงานเงินกันปี 2566 ซึ่งมีการคาดการณ์การเบิกจ่ายไว้ในปีงบประมาณ 2566



1. วางแผนการเบิกจ่าย

• แผนรหัสงบประมาณเดียว

13.2 แผนงานเงินกัน คาดการณ์จากเงินเหลือณ.วันที่ (ดึงข้อมูลจากที่ กว.ให้คาดการณ์เงินกันในระบบ Plannet Account)

แสดงแผนการเบิกจ่ายที่แขวงได้ทำการระบุไว้ในคาดการณ์เบิกจ่ายเงินกันในระบบ Plannet Account

																AO	AP	AQ	AR
คงเหลือ เบิกจ่าย (บาท)	กันเงินไปปี งบประมาณ 2567	คงเหลือ คาดการณ์ 02 ต.ค. 2566	เงินกัน ไม่มีความจำเป็น ต้องใช้	ปีงบประมาณ 2567 (เงินกัน)												รวมเงินกัน (บาท)	บัญชีงบประมาณ	เหตุผลของความล่าช้า	หมายเหตุ
				ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67				
0.00	1,684,230.00	1,684,230.00	0.00	488,970.00	0.00	0.00	488,970.00	0.00	0.00	706,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1,684,230.00	สน. - บัญชี พ.ร.บ.		คงเหลือเฉพาะค่างานการบำรุงรักษาเป็นระยะเวลา 12 เดือน (365 วัน)
8,330,000.00	10,220,000.00	10,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	6,020,000.00	0.00	0	10,220,000.00	สร. - บัญชี พ.ร.บ. (งานอาคาร)	รายการปรับแผน	เนื่องจากงานสัญญาดังกล่าว จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 จึงจะต้องมีการกันเงินไว้เบิกปีงบประมาณ 2567
8,330,000.00	11,904,230.00	11,904,230.00	0.00	488,970.00	0.00	0.00	488,970.00	0.00	2,100,000.00	706,290.00	0.00	2,100,000.00	6,020,000.00	0.00	0.00	11,904,230.00			

จากรูปเป็นแผนงานเงินกันปี 2566 ซึ่งมีการคาดการณ์การเบิกจ่าย จากเงินคงเหลือที่มีอยู่ในระบบ GFMS ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566



1. วางแผนการเบิกจ่าย

• แผนใช้รหัสงบประมาณร่วมกัน

- หน้าแรก
- Dashboard
- บัญชีความต้องการงบประมาณ
- เพิ่มบัญชีความต้องการ
- สรุปงาน
- จัดลำดับความสำคัญ
- งบประมาณจัดสรรเบื้องต้น
- ค้นหาแผนงาน
- แผนรายการประมาณการ
- จัดทำแผนรายการประมาณการ
- สรุปแผนรายการประมาณการ
- ปริมาณงาน
- ติดตามโครงการ
- ติดตามความก้าวหน้า
- คาดการณ์จัดซื้อจัดจ้าง
- วางแผนการเบิกจ่าย
 - แผนรหัสงบประมาณเดียว
 - แผนใช้รหัสงบประมาณร่วมกัน

วางแผนเบิกจ่าย - แผนใช้รหัสงบประมาณร่วมกัน

ปีงบประมาณ: 2567 | สำนักงานทางหลวง: สทล.18 (สงขลา) | แขวงทางหลวง: สงขลาที่ 1

รหัสงบประมาณ: กรุณาเลือกรหัสงบประมาณ

08006650007003210091
08006280002703210507

ค้นหา

*** หากต้องการลบรายการวางแผน (ศูนย์) ในช่องเดือนที่ต้องการแก้ไข

ขั้นตอนวางแผนการเบิกจ่าย แผนใช้รหัสงบประมาณร่วมกัน

เช่น แผนงานงบฉุกเฉิน สร. แผนงานงบกลาง สร. และงบเร่งด่วน สป.

1. เลือกรหัสงบประมาณที่ต้องการวางแผน
2. คลิก **ค้นหา**



1. วางแผนการเบิกจ่าย

• แผนใช้รหัสงบประมาณร่วมกัน

วางแผนเบิกจ่าย - แผนใช้รหัสงบประมาณร่วมกัน

ค้นหา

ปีงบประมาณ: 2567 | สำนักงานทางหลวง: สทล.18 (สงขลา) | แขวงทางหลวง: สงขลาที่ 1 | รหัสงบประมาณ: 08006650007003210091

ID Code	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	ชื่อตอน	กม. เริ่มต้น	กม. สิ้นสุด	งปม. ตามสัญญา	ผลต่างระหว่างงปม.และแผนเบิกจ่าย	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
67036117	4	1401	พรุท้อ - เนินพิชัย ตอน 5	1,233+900	1,249+359	0.00	0.00	1. 66	66	66	67	67	67	67	67
67036118	407	0102	ควนหิน - เขารูปช้าง	21+000	21+915	0.00	0.00								
	408	0202	ม่วงงาม - หุ้งหุ้ง	166+528	168+700										

เป็นการวางแผนการเบิกจ่ายจาก งบประมาณตามสัญญา (2.)

*** หากต้องการลบยอดการวางแผนของเดือนที่เคยวางแผนไว้แล้ว ให้ใส่เลข 0 (ศูนย์) ในช่องเดือนที่ต้องการแก้ไข

4.

- ขั้นตอนวางแผนการเบิกจ่าย
1. คีย์จำนวนเงินวางแผนเบิกจ่ายในแต่ละเดือน
 2. ยอดรวมการวางแผนต้องเท่ากับคอลัมภ์ที่ 2
 3. ผลต่างระหว่างงบประมาณตามสัญญาและแผนการเบิกจ่ายต้องเป็น 0 ทุกแถวจึงจะสามารถบันทึกได้
 4. คลิก **บันทึก**



1. วางแผนการเบิกจ่าย

- แผนรหัสงบประมาณเดียวและแผนใช้รหัสงบประมาณร่วมกัน

หลังจากวางแผนการเบิกจ่ายทั้งสองหัวข้อแล้ว แขนงสามารถเรียกดูได้ในรายงานลำดับที่ 7

7. รายงานสรุปสถานะความก้าวหน้าและการเบิกจ่ายรายเดือน
7.1. ทาง/สะพาน/อาคาร
7.2 งบบำรุงปกติ
7.3 งบดำเนินงาน
7.4 งบฉุกเฉิน
7.5 แผนนอกงบประมาณ



1. วางแผนการเบิกจ่าย

- แผนรหัสงบประมาณเดียวและแผนใช้รหัสงบประมาณร่วมกัน

7.1 ทว/สะพาน/อาคาร

แสดงแผน-ผลการดำเนินงาน และ แสดงแผน-ผล การเบิกจ่าย จำแนกรายแผนซึ่งเกิดจากการวางแผนทั้งแผนรหัสงบประมาณเดียว และ แผนใช้รหัสงบประมาณร่วมกัน

1	A										การเบิกจ่าย													
	ID CODE	รหัสงาน	รหัสแขวง	แขวง	สทล.	เลขรหัสงบประมาณ	งบประมาณ ทรบ.	งบประมาณจัดสรร	วงเงินตามสัญญา	เลขที่สัญญา	การวางแผนเบิกจ่าย				ผล									
											มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	ปีงบ 67	ปีงบ 68	รวม	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67			
24	67034484	33200	311	สขล.ที่ 1	สำนักงานทวทล.ที่ 18 (สขล.)	08006650007003211446	2,000,000.00	2,000,000.00	1,989,000.00	สข1/13/2567	0.00	0.00	1,989,000.00	0.00	1,989,000.00	0.00	1,989,000.00	0.00	0.00					
25	671504167	11700	311	สขล.ที่ 1	สำนักงานทวทล.ที่ 18 (สขล.)	08006190016003220233	40,000,000.00	40,000,000.00	39,977,000.00	สข1/27/2567	5,996,550.00	5,996,550.00	5,996,550.00	13,991,950.00	31,981,600.00	7,995,400.00	39,977,000.00	5,996,550.00	0.00	0.00				
26	67026305	28100	311	สขล.ที่ 1	สำนักงานทวทล.ที่ 18 (สขล.)	08006190014003220172	25,000,000.00	25,000,000.00	24,718,000.00	สข1/7/2567	0.00	0.00	0.00	21,010,300.00	24,718,000.00	0.00	24,718,000.00	3,707,700.00	0.00	0.00				
27	67036117	31300	311	สขล.ที่ 1	สำนักงานทวทล.ที่ 18 (สขล.)	08006650007003210091	500,000.00	500,000.00	499,990.00	สข1/22/2567	499,990.00				499,990.00	0.00	499,990.00	0.00	0.00	0.00				
28	67022605	28100	311	สขล.ที่ 1	สำนักงานทวทล.ที่ 18 (สขล.)	08006190014003220118	30,000,000.00	30,000,000.00	29,992,000.00	สข1/16/2567	29,992,000.00	0.00	0.00	0.00	29,992,000.00	0.00	29,992,000.00	0.00	0.00	0.00				
29	67022020	22200	311	สขล.ที่ 1	สำนักงานทวทล.ที่ 18 (สขล.)	08006650006003220261	14,729,900.00	14,729,900.00	14,473,900.00	สข1/19/2567	0.00	0.00	12,302,815.00	0.00	14,473,900.00	0.00	14,473,900.00	2,171,085.00	0.00	0.00				
30	67032350	33400	311	สขล.ที่ 1	สำนักงานทวทล.ที่ 18 (สขล.)	08006190036003220119	12,500,000.00	12,500,000.00	12,494,000.00	สข1/17/2567	0.00	0.00	2,498,800.00	4,372,900.00	8,121,100.00	12,494,000.00	1,874,100.00	0.00	0.00	0.00				
31	67036118	31300	311	สขล.ที่ 1	สำนักงานทวทล.ที่ 18 (สขล.)	08006650007003210091	2,500,000.00	2,500,000.00	2,485,400.00	สข1/18/2567	0.00	0.00	2,485,400.00		2,485,400.00	0.00	2,485,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
32	67022391	20500	311	สขล.ที่ 1	สำนักงานทวทล.ที่ 18 (สขล.)	08006280001003210132	1,200,000.00	1,200,000.00	1,085,000.00	สข1/24/2567	162,750.00	162,750.00	108,500.00	162,750.00	598,750.00	603,250.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
33	67022347	20500	311	สขล.ที่ 1	สำนักงานทวทล.ที่ 18 (สขล.)	08006280001003210090	1,500,000.00	1,500,000.00	1,398,000.00	สข1/23/2567	209,700.00	209,700.00	139,800.00	209,700.00	768,900.00	629,100.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
34	67033220	31400	311	สขล.ที่ 1	สำนักงานทวทล.ที่ 18 (สขล.)	08006650007003210656	5,000,000.00	5,000,000.00	4,993,000.00	สข1/10/2567	0.00	0.00	4,993,000.00	0.00	4,993,000.00	0.00	4,993,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
35	67033236	31400	311	สขล.ที่ 1	สำนักงานทวทล.ที่ 18 (สขล.)	08006650007003210650	5,155,000.00	5,155,000.00	5,099,950.00	สข1/4/2567	0.00	0.00	5,099,950.00	0.00	5,099,950.00	0.00	5,099,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
36	67022219	28100	311	สขล.ที่ 1	สำนักงานทวทล.ที่ 18 (สขล.)	08006190014003220115	25,000,000.00	25,000,000.00	24,993,700.00	สข1/28/2567	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
37	67034098	31400	311	สขล.ที่ 1	สำนักงานทวทล.ที่ 18 (สขล.)	08006650007003211237	3,000,000.00	2,993,000.00	2,986,880.00	สข1/25/2567	0.00	0.00	2,986,880.00	0.00	2,986,880.00	0.00	2,986,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
38	67026702	28100	311	สขล.ที่ 1	สำนักงานทวทล.ที่ 18 (สขล.)	08006190014003220171	25,000,000.00	25,000,000.00	24,994,000.00	สข1/33/2567	3,749,100.00	0.00	0.00	21,244,900.00	24,994,000.00	0.00	24,994,000.00	0.00	3,749,100.00	0.00	0.00			
39	67032361	31400	311	สขล.ที่ 1	สำนักงานทวทล.ที่ 18 (สขล.)	08006650007003210657	1,200,000.00	1,200,000.00	1,120,200.00	สข1/14/2567	0.00	1,120,200.00	0.00	0.00	1,120,200.00	0.00	1,120,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40	67026967	29000	311	สขล.ที่ 1	สำนักงานทวทล.ที่ 18 (สขล.)	08006650006003210063	300,000.00	300,000.00	299,075.00	สข1/21/2567	0.00	0.00	299,075.00	0.00	299,075.00	0.00	299,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
41	รวม							553,604,800.00	493,597,800.00	437,074,560.00		46,604,510.00	99,295,470.00	113,590,985.00	121,029,180.00	403,959,430.00	33,258,430.00	437,217,860.00	29,435,935.00	7,495,200.00	0.00	0.00		

จากรูปเป็นแผนงานที่ใช้รหัสงบประมาณร่วมกัน แสดง 2 แผนงาน เนื่องจากเป็นการแสดงตามแผนงาน หากเป็นรายงานที่ 11.1 จะแสดงแค่รหัสงบประมาณเดียว เนื่องจากเป็นการแสดงตามรหัสงบประมาณ



2. คืบเงินเหลือ

งานทาง/สะพาน/อาคาร

- 1 เงินคงเหลือจากการเซ็นสัญญา
- 2 เงินคงเหลือท้ายสัญญา


รถตุ๊กตุ๊ก

- 1 เงินคงเหลือท้ายสัญญา



2. คืบวินเหลือ


- จัดทำคำร้องคืบวินเหลือจาก Plannet เขียว ไป Plannet ฟ้ำ (ไม่ต้องผูก GF เอง)

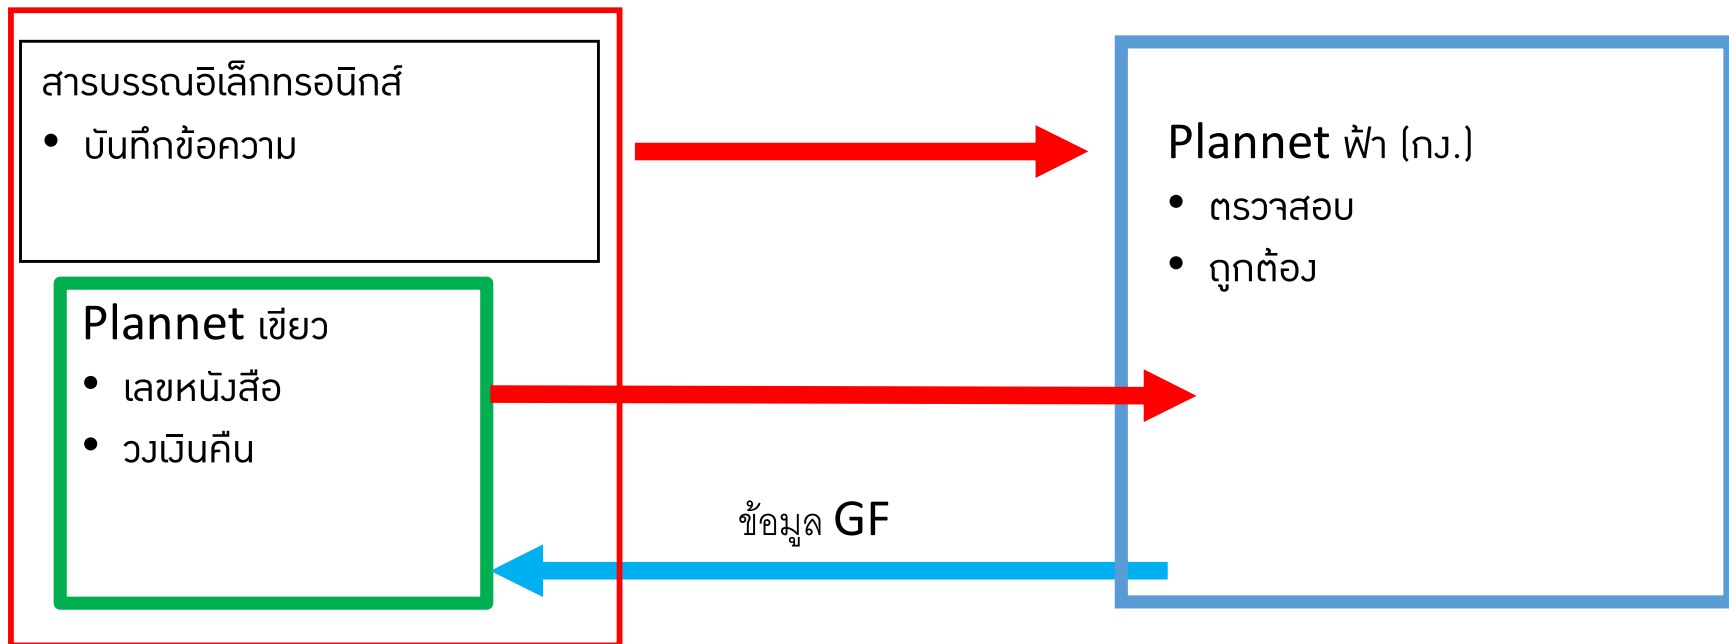



2. คืบวินเหลือ

- ไม่ได้จัดทำคำร้องผ่าน Plannet เขียว ไป Plannet พ้า (แขวงต้องผูก GF เอง)

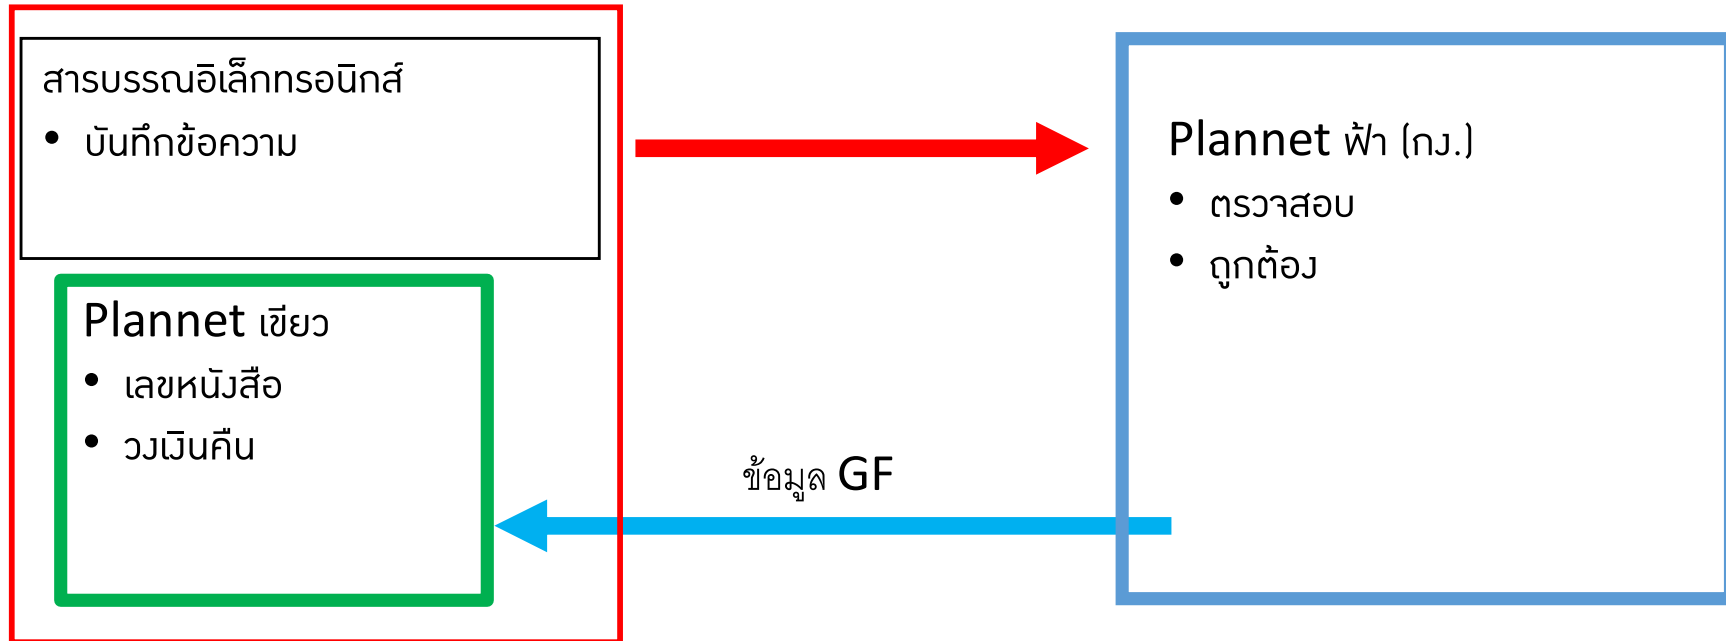



2. คืบเงินเหลือ – งานทาง/สะพาน/อาคาร

- เงินคงเหลือจากการเซ็นสัญญา

บัญชีความต้องการงบประมาณ

- + เพิ่มบัญชีความต้องการ
- ☰ สรุปงาน
- 📄 จัดลำดับความสำคัญ
- 📄 งบประมาณจัดสรรเบื้องต้น
- 🔍 ค้นหาแผนงาน

แผนรายประมาณการ

- 📄 จัดทำแผนรายประมาณการ
- ☰ สรุปแผนรายประมาณการ
- ☰ ปริมาณงาน

ติดตามโครงการ

- ⚙️ ติดตามความก้าวหน้า
- 📄 ค่าการณัจัดซื้อจัดจ้าง
- 🕒 วางแผนการเบิกจ่าย

คืบเงินเหลือ

- /i\ งานทาง/สะพาน/อาคาร
- เงินคงเหลือจากการเซ็นสัญญา**
- เงินคงเหลือท้ายสัญญา

ข่าวประชาสัมพันธ์



2. คืบเงินเหลือ – งานทาง/สะพาน/อาคาร

• เงินคงเหลือจากการเซ็นสัญญา

แจ้งคืบเงินเหลือจากการเซ็นสัญญา ก็ต่อเมื่อ

1. เป็นแผนงานจ้างเหมาที่ได้รับจัดสรรแล้ว และ
2. เป็นแผนงานจ้างเหมาที่มีการทำสัญญาแล้ว (มีเลขที่สัญญาและวงเงินในสัญญา) และ
3. วงประมาณจัดสรรมากกว่าวงประมาณในสัญญา (อ้างอิงยอดจัดสรรจากระบบ GFMS ไฟล์ zfma47)

—สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ

รหัสงบประมาณ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญาและเบิกจ่าย				คงเหลือ	
		ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	รวม (บาท)	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
08006650006003220029	19,939,500.00	14,586,463.26	5,330,536.74	19,917,000.00	99.89	22,500.00	0.11

1.

สัญญา/ข้อตกลง/ใบสั่งซื้อ

ประเภทสัญญา (การจัดจ้าง) e-bidding	<input type="checkbox"/> มาตรา 56(1)(ข)	เลขที่โครงการ 67039575935	เลขที่คุมสัญญา 670522010801	สัญญาเลขที่/ใบสั่งซื้อเลขที่ ชม.1/สร/28/2567	วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 22 เมษายน 2567	วันที่ลงนาม 09 พฤษภาคม 2567
วันที่เริ่มสัญญา 10 พฤษภาคม 2567	วันที่สิ้นสุดสัญญา 06 กันยายน 2567	ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 120	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0505541000349	แนบไฟล์สัญญา กดเพื่อเปิดไฟล์สัญญา	ลิงค์ไฟล์สัญญา ไม่มีไฟล์	วันที่คค.ทราบวันลงนามสัญญา
ชื่อผู้รับจ้าง บ. บลูแลนด์ เอ็นจิเนียริ่ง	<input type="checkbox"/> มาตรา 56(1)(ข)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0505541000349	วงเงินค่างานตามสัญญา(บาท) 19,917,000.00	ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ(บาท) 49,792.50		
วันที่แจ้งทำสัญญา 29 เมษายน 2567	วันที่ผู้รับจ้างมาทำสัญญา 09 พฤษภาคม 2567	หมายเหตุ (ก-3)				

2.



2. คืบเงินเหลือ – งานทาง/สะพาน/อาคาร

- เงินคงเหลือจากการเซ็นสัญญา

รายการคืบเงินเหลือ เงินคงเหลือจากการเซ็นสัญญา 2567

Q ค้นหาแผนรายประมาณการ

1. **แจ้งคืบเงินเหลือ**

วันที่ขออนุมัติ	เลขที่หนังสือ	กิจกรรมหลัก	สำนัก	รหัสงานหลัก	งบประมาณคืบเงินเหลือ	จำนวนแผน				
ไม่มีข้อมูลการแจ้งคืบเงินเหลือ										

1. คลิก “แจ้งคืบเงินเหลือ”



2. คืบเงินเหลือ – งานทาง/สะพาน/อาคาร

• เงินคงเหลือจากการเซ็นสัญญา

เลือกบัญชีแผนงานที่มีการจัดสรรเงินมากกว่างบประมาณในสัญญา

1. ระบุกิจกรรมที่ต้องการคืบเงิน

ปีงบประมาณ: 2567 | สำนักงานทางหลวง: สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) | แขวงทางหลวง: แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | สำนัก: สำนักบริหารบำรุงทาง

โครงการ: การบำรุงรักษาและบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงและสะพาน | กิจกรรม: บำรุงรักษาทางหลวง | รหัสสถาน: --เลือกรหัสสถาน--

1.

2. เลือกแผนงานและรหัสงบประมาณที่ต้องการคืบเงินเหลือ (แผนงานที่มีสถานะ "ดำเนินการ" และ เป็นแผนงานจ้างเหมาที่มีการทำสัญญาแล้ว และ งบประมาณจัดสรรมากกว่างบประมาณในสัญญา)

รหัสสถาน	ชื่อตาม พรบ.	รหัสงบประมาณ	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณตามสัญญา	จำนวนเงินคืบ	เลขที่สัญญา	เหตุผลการคืบเงิน
<input type="checkbox"/>	25900 ID Code 67021810 :: งานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กอง ลอย - แม่แอ่ใต้ ตอน 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	08006650006003220029	19,939,500.00	19,917,000.00	22,500.00	ชม.1/สร/28/2567	

2.

3. ส่งรายการคืบเงินเหลือ

แผนงานทั้งหมด(แผน): 0 | เงินเหลือรวม(บาท): 0.00 | เลขที่หนังสือ: | วันที่คืบเงินเหลือ: |

3.

- ขั้นตอนการแจ้งคืบเงินเหลือจากการเซ็นสัญญา
1. ระบุกิจกรรมและคลิก **ค้นหา**
 2. ระบบจะแสดงรายการแผนงานจ้างเหมาที่มีการทำสัญญาแล้ว และ งบประมาณจัดสรรมากกว่างบประมาณในสัญญา (อ้างอิงยอดจัดสรรจากระบบ GFMIS ไฟล์ zfma47) เลือกแผนงานที่ต้องการคืบเงินและใส่เหตุผล
 3. ระบุเลขที่หนังสือและคลิก **ส่งรายการ**
 4. หลังจากที กว.มีการดึงเงินกลับจากคำร้องที่แขวงส่งผ่านระบบ Plannet ระบบจะถูก GF ตามที่แสดงในข้อมูลทางบัญชีให้ทันที



2. คืบเงินเหลือ – งานทาง/สะพาน/อาคาร

- เงินคงเหลือท้ายสัญญา

บัญชีความต้องการงบประมาณ

- + เพิ่มบัญชีความต้องการ
- ≡ สรุปงาน
- 📄 จัดลำดับความสำคัญ
- 📄 งบประมาณจัดสรรเบื้องต้น
- 🔍 ค้นหาแผนงาน

แผนรายประมาณการ

- 📄 จัดทำแผนรายประมาณการ
- ≡ สรุปแผนรายประมาณการ
- ≡ ปริมาณงาน

ติดตามโครงการ

- ⚙️ ติดตามความก้าวหน้า
- 📄 คาดการณ์จัดซื้อจัดจ้าง
- 📄 วางแผนการเบิกจ่าย

คืบเงินเหลือ

- /i\ งานทาง/สะพาน/อาคาร
- เงินคงเหลือจากการเซ็นสัญญา
- เงินคงเหลือท้ายสัญญา**

ข่าวประชาสัมพันธ์



2. คืบเงินเหลือ – งานทาง/สะพาน/อาคาร

- เงินคงเหลือท้ายสัญญา

แจ้งคืบเงินเหลือท้ายสัญญา ก็ต่อเมื่อ

1. เป็นแผนงานที่เบิกเงินงวดสุดท้ายแล้ว และ
2. เป็นแผนงานที่ยังมีเงินคงเหลือค้างในระบบ
(งบประมาณจัดสรร – เบิกจ่ายจริง > 0 อ้างอิงจากไฟล์ zfma47 ที่นำเข้าล่าสุด)

การเบิกเงินงวดสุดท้าย

แก้ไขการเบิกเงินงวดสุดท้าย

เบิกเงินงวดสุดท้าย

วันที่เบิกเงินงวดสุดท้าย: 30 พฤษภาคม 2567
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด: แสง ยโสธร
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด: 31 พฤษภาคม 2567 08:48

สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ

รหัสงบประมาณ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญาและเบิกจ่าย				คงเหลือ	
		ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	รวม (บาท)	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
08006650006003220208	10,988,638.00	0.00	10,921,251.42	10,921,251.42	99.39	67,386.58	0.61



2. คืบเงินเหลือ – งานทาง/สะพาน/อาคาร

- เงินคงเหลือท้ายสัญญา

รายการคืบเงินเหลือ เงินคงเหลือท้ายสัญญา 2567

ค้นหาแผนรายประมาณการ▼

1. **แจ้งคืบเงินเหลือ**

วันที่ขออนุมัติ	เลขที่หนังสือ	กิจกรรมหลัก	สำนัก	รหัสงานหลัก	งบประมาณ คืบเงินเหลือ	จำนวนแผน				
ไม่มีข้อมูลการแจ้งคืบเงินเหลือ										

1. คลิก “แจ้งคืบเงินเหลือ”



2. คืบเงินเหลือ – งานทาง/สะพาน/อาคาร

• เงินคงเหลือท้ายสัญญา

1. ระบุกิจกรรมที่ต้องการคืบเงินเหลือ

ปีงบประมาณ: 2567 | สำนักงานทางหลวง: สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) | แขวงทางหลวง: แขวงทางหลวงยโสธร | สำนัก: สำนักบริหารบำรุงทาง
 โครงการ: การบำรุงรักษาและบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงและสะพาน | กิจกรรม: บำรุงรักษาทางหลวง | รหัสงาน: --เลือกรหัสงาน--

1. ค้นหาแผนงาน

ค้นหา

2. เลือกแผนงานและรหัสงบประมาณที่ต้องการคืบเงินเหลือ (แผนงานที่มีสถานะ "ดำเนินการ" และ มีการเบิกเงินงวดสุดท้ายแล้ว และ มีงบประมาณคงเหลือจากการจัดสรร) หรือ (แผนงานมีสถานะ "ยกเลิก" และมีการจัดสรรเงิน)

หมายเหตุ!!! กรณีที่เงินคืบ จากระบบ plannet มากกว่าเงินเหลือ(คง.) จะไม่สามารถเลือกรายการดังกล่าวเพื่อคืบเงิน ผู้ใช้จะต้องทำการตรวจสอบเงินเหลือให้ถูกต้อง

รหัสงาน	ชื่อตาม พรบ.	รหัสงบประมาณ	งบประมาณจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จำนวนเงินคืบ	เงินคงเหลือ (คง.)	เหตุผลการคืบเงิน
<input type="checkbox"/>	22300 ID Code 67024784 :: งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านยอ - บ้านสวน จ.ยโสธร 1 แห่ง	08006650006003220208	10,988,638.00	10,921,251.42	67,386.58	67,386.58	
<input type="checkbox"/>	22300 ID Code 67027211 :: งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ยโสธร - สะพานคลองลำเซ ตอน 1 จ.ยโสธร 1 แห่ง	08006650006003220897	14,991,900.00	14,991,640.83	259.17	259.17	
<input type="checkbox"/>	24100 ID Code 67024140 :: งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน สะเดา - คำเขื่อนแก้ว ตอน 2 จ.ยโสธร 1 แห่ง	08006650006003210251	9,779,366.00	9,655,711.45	123,654.55	9,779,366.00	

2. เลือกแผนที่จะคืบเงิน

3. ระบุเหตุผลของการคืบเงิน

3. ส่งรายการคืบเงินเหลือ

แผนงานทั้งหมด(แผน): 0 | เงินเหลือรวม(บาท): 0.00 | เลขที่หนังสือ: | วันที่คืบเงินเหลือ: | ส่งรายการ

5. กดส่งรายการ

4. กรอกข้อมูลเลขที่หนังสือที่คืบเงินให้ กง.



2. คืบเงินเหลือ – งานทาง/สะพาน/อาคาร

• เงินคงเหลือท้ายสัญญา

2. เลือกแผนงานและรหัสงบประมาณที่ต้องการคืบเงินเหลือ (แผนงานที่มีสถานะ "ดำเนินการ" และ มีการเบิกเงินงวดสุดท้ายแล้ว และ มีงบประมาณคงเหลือจากการจัดสรร) หรือ (แผนงานมีสถานะ "ยกเลิก" และมีการจัดสรรเงิน)

หมายเหตุ!!! กรณีที่เงินคืบ จากระบบ plannet มากกว่าเงินเหลือ(กจ.) จะไม่สามารถเลือกรายการดังกล่าวเพื่อคืบเงิน ผู้ใช้จะต้องทำการตรวจสอบเงินเหลือให้ถูกต้อง

รหัสงาน	ชื่อตาม พรบ.	รหัสงบประมาณ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	จำนวนเงินคืบ	เงินคงเหลือ	เหตุผลการคืบเงิน
			จัดสรร		1.	2. (กจ.)	
<input type="checkbox"/>	22300 ID Code 67024784 :: งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านย่อ - บ้านสวน จ.ยโสธร 1 แห่ง	08006650006003220208	10,988,638.00	10,921,251.42	67,386.58	67,386.58	
<input type="checkbox"/>	22300 ID Code 67027211 :: งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ยโสธร - สะพานคลองลำเซ ตอน 1 จ.ยโสธร 1 แห่ง	08006650006003220897	14,991,900.00	14,991,640.83	259.17	259.17	
<input type="checkbox"/>	24100 ID Code 67024140 :: งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน สะเดา - คำเขื่อนแก้ว ตอน 2 จ.ยโสธร 1 แห่ง	08006650006003210251	9,779,366.00	9,655,711.45	123,654.55	9,779,366.00	

1. จำนวนเงินคืบ หมายถึง จำนวนเงินคงเหลือจากระบบ Plannet เขียว ซึ่งได้จากการนำเข้าจากระบบ GFMIS
 2. เงินคงเหลือ (กจ.) หมายถึง จำนวนเงินคงเหลือ จากการทำใบสำคัญจ่ายในระบบ Plannet ฟ้า
- *** ระบบจะอนุญาตให้เลือกรายการได้ หาก (1) และ (2) มีจำนวนเงินเท่ากัน เท่านั้น
- *** ในกรณีที่จำนวนเงิน (1) และ (2) ไม่เท่ากัน ให้สอบถามจากทางบัญชีแขวงเพื่อตรวจสอบข้อมูล



2. คืบเงินเหลือ – งบผูกเงิน

- เงินคงเหลือท้ายสัญญา

แผนรายประมาณการ

- จัดทำแผนรายประมาณการ
- สรุปแผนรายประมาณการ
- ปริมาณงาน

ติดตามโครงการ

- ติดตามความก้าวหน้า
- คาดการณ์จัดซื้อจัดจ้าง
- วางแผนการเบิกจ่าย

คืบเงินเหลือ

- งานทาง/สะพาน/อาคาร
- งบผูกเงิน
- เงินคงเหลือท้ายสัญญา**

หน้าจอการใช้งานเหมือนกับคืบเงินเหลือ ทาง/สะพาน/อาคาร

ข่าวประชาสัมพันธ์



2. คืบเงินเหลือ

- การออก GF

1. เมื่อกดส่งรายการแล้ว จะส่งข้อมูลรายการคืบเงินเหลือไปปรากฏใน Plannet ฟ้า
2. กว. ทำการออกเลข GF คืบเงินกลับ ได้ 2 แบบ
 - 2.1 คืบเงินกลับจากคำร้องที่ส่งมาจากระบบ Plannet เขียว
 - *** ระบบจะผูก GF ให้กับแผนงานทันที
 - 2.2 คืบเงินกลับโดยระบบใน Plannet ฟ้าเอง
 - *** แหวงจะต้องผูก GF เองหลังจากได้รับแจ้งเลข GF จากกว.



2. คืนเงินเหลือ

- การออก GF – กรณี กว.ดึงเงินกลับจากคำร้องที่ส่งจากระบบ Plannet เชี่ยว

*** ระบบจะผูก GF ให้กับแผนงานทันที สามารถตรวจสอบได้จากหน้าจอตัวอย่าง

- รายละเอียดโครงการ
- การพิจารณาแผน
- ก่อนทำสัญญา
- ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน
- งานดำเนินการเอง
- ข้อมูลทางบัญชี
- คณะกรรมการ
- กำหนดแผนดำเนินโครงการ

ข้อมูลทางการบัญชี

ชื่อรายการตาม พรบ.

งานยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านย่อ - บ้านส

เป็นแผนงานที่ใช้รหัสงบประมาณร่วมกับแผนงานอื่น

รายการขออนุมัติเงินงวด

เลขที่หนังสือ	วันที่ขออนุมัติเงินงวด	คำขอจากระบบ PlanNet
สป.1/พ./3640	26 เมษายน 2567	<input checked="" type="checkbox"/>

การจัดสรรงบ (ใบGF)

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	-/+	ยอดเงิน	ประเภทใบ gf
10598/2567/1	30 เมษายน 2567	+	15,981,000.00	จัดสรร
40238/2567/11	28 พฤษภาคม 2567	-	45,324.96	คืนเงินจากการเซ็นสัญญา
			15,935,675.04	



2. คืบเมินเหลือ

- การออก GF – กรณี กว.ดึงเมินกลับโดยระบบใน Plannet ฟ้าเอจ

*** แหวงจะต้องผูก GF เอจหลังจากได้รับแจ้งเลข GF จากกว.



3. การผูก GF

หลังจากที่ตรวจสอบพบว่า กว.มีการตั้งเงินกลับแล้ว และเลข GF ตั้งเงินกลับยังไม่ปรากฏในหน้าจอข้อมูลทางบัญชี แขนงสามารถผูก GF ได้ตามขั้นตอนดังนี้

- รายละเอียดโครงการ
- การพิจารณาแผน
- ก่อนทำสัญญา
- ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน
- งานดำเนินการเอง
- ข้อมูลทางบัญชี
- คณะกรรมการ
- กำหนดแผนดำเนินโครงการ
- ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย
- รายงานงาน

ยอดรวมจัดสรรจากระบบ Plannet ฟ้ำ (1) และยอดจัดสรรจากระบบ GFMS (2) ไม่เท่ากัน แขนงจะต้องผูก GF เพิ่มเติม

เลขที่หนังสือ	วันที่ขออนุมัติเงินงวด	ค่าของจากระบบ PlanNet
สร.1/4216	30 เมษายน 2567	<input checked="" type="checkbox"/>

—การจัดสรรงบ (ใบGF)

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	-/+	ยอดเงิน	ประเภทใบ gf
10702/2567/8	01 พฤษภาคม 2567	+	25,000,000.00 จัดสรร	
			25,000,000.00	1

วันที่อนุมัติเงินงวดล่าสุด :: 1 พฤษภาคม 2567

—สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ

รหัสงบประมาณ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญาและเบิกจ่าย			คงเหลือ		
		ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	รวม (บาท)	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
08006190014003220116	24,714,000.00	24,714,000.00	0.00	24,714,000.00	100.00	0.00	0.00



3. การผูก GF

หลังจากที่ตรวจสอบพบว่า กว.มีการตั้งเงินกลับแล้ว และเลข GF ตั้งเงินกลับยังไม่ปรากฏในหน้าจอข้อมูลทางบัญชี แขนงสามารถผูก GF ได้ตามขั้นตอนดังนี้

—การจัดสรรงบ (ใบGF)

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	-/+	ยอดเงิน	ประเภทใบ gf
10702/2567/8	01 พฤษภาคม 2567	+	25,000,000.00 จัดสรร	
			25,000,000.00	

แก้ไข

1.กดแก้ไข

—การจัดสรรงบ (ใบGF)

2.กดเลือก

เลขที่ GF วันที่อนุมัติเงินงวด ยอดเงิน(ดึงจากระบบ GFMIS) ยอดเงิน ประเภทใบ gf

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	-/+	ยอดเงิน	ประเภทใบ gf		
10702/2567/8	01 พ.ค. 2567	+	25,000,000.00 จัดสรร		<input type="button" value="เลือก"/>	<input type="button" value="ลบ"/>

เลือกใบ GF

ระบบจะแสดงเลข GF ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานนี้ และยังไม่เคยผูก GF กับแผนงาน

เลขที่ GF

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	ยอดเงิน
40348.1/2567/11	29 พ.ค. 2567	-286,000.00

3.เลือกใบ GF



3. การผูก GF

หลังจากที่ตรวจสอบพบว่า กว.มีการตั้งเงินกลับแล้ว และเลข GF ตั้งเงินกลับยังไม่ปรากฏในหน้าจอข้อมูลทางบัญชี แขนงสามารถผูก GF ได้ตามขั้นตอนดังนี้

—การจัดสรรงบ (ใบGF)

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	ยอดเงิน(ดึงจากระบบ GFMS)	ยอดเงิน	ประเภทใบ gf
40348.1/2567/11	29 พ.ค. 2567	-286,000	-286,000	

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	-/+	ยอดเงิน	ประเภทใบ gf
10702/2567/8	01 พ.ค. 2567	+	25,000,000.00	จัดสรร

ปิด

เพิ่ม ยกเลิก

4.ระบุประเภทใบ gf และกดเพิ่ม

—การจัดสรรงบ (ใบGF)

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	ยอด	ประเภทใบ gf
10702/2567/8	01 พ.ค. 2567	+	เงินจากการเซ็นสัญญา
40348.1/2567/11	29 พ.ค. 2567	-	

ปิด

เพิ่ม ยกเลิก

วันที่อนุมัติเงินงวดล่าสุด :: 1 พฤษภาคม 2567

—สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ

บันทึกข้อมูล?

ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

OK

5.กด OK



3. การผูก GF

ยอดรวมจัดสรรจากระบบ Plannet ฟ้า (1) และยอดจัดสรรจากระบบ GF MIS (2) เท่ากัน แสดงว่ามีการผูก GF ครบถ้วนแล้ว

—การจัดสรรงบ (ในGF)

แก้ไข

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	-/+	ยอดเงิน	ประเภทใบ gf
10702/2567/8	01 พฤษภาคม 2567	+	25,000,000.00	จัดสรร
40348.1/2567/11	29 พฤษภาคม 2567	-	286,000.00	คืนเงินจากการเซ็นสัญญา
			24,714,000.00	

วันที่อนุมัติเงินงวดล่าสุด :: 1 พฤษภาคม 2567

—สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ

รหัสงบประมาณ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญาและเบิกจ่าย			คงเหลือ		
		ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	รวม (บาท)	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
08006190014003220116	24,714,000.00	24,714,000.00	0.00	24,714,000.00	100.00	0.00	0.00



4. การติดตามการคืนเงินเหลือ

- แขวงสามารถเรียกดูได้จากรายงานข้อ 4.1 รายงานก3 (ติดตามคืนเงินเหลือ)

4. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (แบบ ก-3)

4.1. ทาง/สะพาน/อาคาร || ทาง/สะพาน/อาคาร (ติดตามคืนเงินเหลือ)



4. การติดตามการคืนเงินเหลือ

- แขวงสามารถเรียกดูได้จากรายงานข้อ 4.1 รายงานก3 (ติดตามคืนเงินเหลือ)

แจ้งคืนเงินเหลือ					แจ้งคืนเงินเหลือจากท้ายสัญญา				
1. แจ้งคืนเงินเหลือจากการเซ็นสัญญา					2.				
วงเงิน	วันที่	GF No	เลขที่หนังสือ	เหตุผลการคืนเงิน	วงเงิน	วันที่	GF No	เลขที่หนังสือ	เหตุผลการคืนเงิน
10,200.00	17 พ.ค. 2567	40136.1/2567/9	สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 1/1029	เงินเหลือจากการเซ็นสัญญา					
			สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 1/1029	เงินเหลือจากการเซ็นสัญญา					
4,069.30	17 พ.ค. 2567	40136/2567/9	สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 1/1029	เงินคงเหลือจากการเซ็นสัญญา					
2,069.59	17 พ.ค. 2567	40136/2567/9	สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 1/1029	เงินคงเหลือจากการเซ็นสัญญา					
9,500.00	17 พ.ค. 2567	40139/2567/9							
21,100.00	17 พ.ค. 2567	40139/2567/9							
42,300.00	27 พ.ค. 2567	40322.1/2567/11	สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)/ 2.1/2/750	ขอโอนเงินเหลือกลับส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2567					

1. ข้อมูลเกี่ยวกับเลข GF
2. ข้อมูลคำร้องแจ้งคืนเงินเหลือ



4. การติดตามการคืนเงินเหลือ

- รายงานก3 (ติดตามคืนเงินเหลือ)

แจ้งคืนเงินเหลือ									
แจ้งคืนเงินเหลือจากการเซ็นสัญญา					แจ้งคืนเงินเหลือจากทำสัญญา				
วงเงิน	วันที่	GF No	เลขที่หนังสือ	เหตุผลการคืนเงิน	วงเงิน	วันที่	GF No	เลขที่หนังสือ	เหตุผลการคืนเงิน
201,000.00	02 มิ.ย. 2567	40443/2567/11	สทล.1ขท. แม่ฮ่องสอน.1/492	คืนเงินเหลือจากทำสัญญา					

1. มีข้อมูลครบทั้ง 2 ส่วนคือ (1)ข้อมูลเกี่ยวกับเลข GF (2)ข้อมูลคำร้องแจ้งคืนเงินเหลือ
2. ข้อมูล GF ที่แสดงอาจจะเกิดจาก 2 กรณี คือ
 - 2.1 กว.ดึงเงินจากคำร้อง ระบบจะแสดง ข้อมูล GF ให้ทันที
 - 2.2 กว.อาจจะไม่ได้ดึงเงินจากคำร้อง แต่แขวงได้มาผูก GF แล้ว



4. การติดตามการคืนเงินเหลือ

- รายงานก3 (ติดตามคืนเงินเหลือ)

แจ้งคืนเงินเหลือ									
แจ้งคืนเงินเหลือจากการเซ็นสัญญา					แจ้งคืนเงินเหลือจากท้ายสัญญา				
วงเงิน	วันที่	GF No	เลขที่หนังสือ	เหตุผลการคืนเงิน	วงเงิน	วันที่	GF No	เลขที่หนังสือ	เหตุผลการคืนเงิน
51,370.00	20 พ.ค. 2567	40156.1/2567/11							

- มีข้อมูล (1) ข้อมูลเกี่ยวกับเลข GF
- แขวงไม่ได้ส่งคำร้องคืนเงินเหลือ และแขวงได้ทำการผูก GF แล้ว



4. การติดตามการคืนเงินเหลือ

- รายงานก3 (ติดตามคืนเงินเหลือ)

แจ้งคืนเงินเหลือ									
แจ้งคืนเงินเหลือจากการเซ็นสัญญา					แจ้งคืนเงินเหลือจากทำสัญญา				
วงเงิน	วันที่	GF No	เลขที่หนังสือ	เหตุผลการคืนเงิน	วงเงิน	วันที่	GF No	เลขที่หนังสือ	เหตุผลการคืนเงิน
			สทล.1ขท. แม่ฮ่องสอน.1/507	คืนเงินเหลือจากทำสัญญา					

- มีข้อมูล (2) ข้อมูลคำร้องแจ้งคืนเงินเหลือ
- แขวงส่งคำร้องคืนเงินเหลือ แต่ข้อมูล GF ยังไม่ปรากฏเนื่องจาก
 - รอ กว.ตั้งเงินจากคำร้อง
 - กว.อาจจะตั้งเงินแล้ว แบบไม่ได้ตั้งจากคำร้อง แต่แขวงยังไม่ได้ผูก GF



5. คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

Q1 : งานอำนวยความสะดวกความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ค่างานอำนวยความสะดวกความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กรุงเทพมหานคร 90 แห่ง ไม่ใช่ งานของแขวง

A : เป็นรหัสงบประมาณเร่งด่วน ของ สป.



5. คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

Q1 :จะแจ้งคืนเงิน แต่ระบบไม่แสดงรายการที่ต้องแจ้งคืนเงิน

A :

1. เป็นแผนงานจ้างเหมาที่ได้รับจัดสรรแล้ว และ
2. เป็นแผนงานจ้างเหมาที่มีการทำสัญญาแล้ว (มีเลขที่สัญญาและวงเงินในสัญญา) และ
3. งบประมาณจัดสรรมากกว่างบประมาณในสัญญา
(อ้างอิงยอดจัดสรรจากระบบ GFMS โพล์ zfma47)
4. กง. อาจะดึงเงินกลับแล้ว สามารถสอบถามเลข GF ได้จากบัญชีแขวง หรือ ผูก GF แล้วระบบจะแสดงเลข GF
