



คู่มือการใช้งานระบบบริหารแผนงานทางหลวง Plannet ใหม่ (PN2021)

การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน
ประเภทงานทาง, งานอาคารและงานสะพาน

Version 1.0

01 พ.ย. 64



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• เลือกประเภทงานที่ต้องการ

- หน้าแรก
- Dashboard
- บัญชีความต้องการงบประมาณ
 - เพิ่มบัญชีความต้องการ
 - สรุปงาน
 - จัดลำดับความสำคัญ
 - ค้นหาแผนงาน
- แผนรายประมาณการ
 - จัดทำแผนรายประมาณการ
 - สรุปแผนรายประมาณการ
- ติดตามโครงการ
 - ติดตามความก้าวหน้า
 - งานทาง
 - งานสะพาน
 - งานอาคาร
 - งบบำรุงปกติ
 - งบดำเนินงาน
 - งบฉุกเฉิน
- คืนเงินเหลือ
- รายงาน
 - รายงานสรุปความก้าวหน้า

≡ ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

dis335, แขวงทางหลวงราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. คลิกที่เมนู **ติดตามความก้าวหน้า**
2. จากนั้นเลือกเมนูย่อย ตามประเภทงานที่ต้องการติดตามความก้าวหน้า

🕒 20 ตุลาคม 2564

จัดทำแผนรายประมาณการงานบำรุงปกติ ปี 2565

△ สำนักบริหารบำรุงทาง ขอแจ้งวงเงินงบประมาณสำหรับจัดทำแผนรายประมาณการงานบำรุงปกติ ปี 2565

- 📄 สร.2/4082 ลว.22 ก.ย. 2564.jpg
- 📄 “รายละเอียดครุภัณฑ์ งานพัฒนาทางหลวง งานบำรุงรักษาทาง งานอำนวยความสะดวก” ฉบับกันยายน ๒๕๕๖ (เอกสารแนบ 2).pdf
- 📄 คู่มือปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางหลวง (เอกสารแนบ3).pdf
- 📄 คู่มือการใช้งานระบบฯ http://planet.doh.go.th/pn2021 (เอกสารแนบ 4).pdf

1. **ติดตามความก้าวหน้า**
2. **งานทาง**

หากผู้ใช้เลือกเมนูย่อยประเภทงานทาง,งานสะพาน,งานอาคาร จะมีข้อมูลและรายละเอียดข้อมูลโครงการระหว่างจัดจ้างเหมือนกันแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย

△ ด้วยสำนักบริหารบำรุงทาง จะพิจารณารายละเอียดแผนงาน บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสนอขอจัดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักบริหารบำรุงทางจึงขอให้ สำนักงานทางหลวงพิจารณาจัดแผนงาน ความต้องการดังกล่าวเอกสารแนบ

- 📄 สร.2_3814_07.09.2564.pdf
- 📄 สร.2_4014_22.09.2564.pdf

🕒 14 กันยายน 2564

เสนอแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประจำปี พ.ศ. 2566

ดูรายละเอียดหน้าถัดไป >>



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

1). ข้อมูลรอกจัดทำแผนรายประมาณการ

≡ ระบบบริหารแผนงานทางหลวง


dis335, แขวงทางหลวงราชบุรี

ติดตามโครงการ


สรุปบัญชีแผนงาน งานทาง 2565


ค้นหาบัญชีแผนงาน


รอกจัดทำแผนรายประมาณการ
 16


 รอกพิจารณาแผนรายประมาณการ
 2


 ระหว่างจัดจ้าง
 0


 ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง
 0


 ดำเนินงานเสร็จสิ้น
 0

รอกจัดทำแผนรายประมาณการ






ID code	รหัสงาน	หมายเลขทางหลวง	ชื่อตอน
651501054	11100	4	สระกระเทียม
651538093	33300	4	คลองอี่จาง -
651538094	33300	4	คลองอี่จาง -
651530915	31100	376	ทางเลี้ยงเมื่อ
651530916	31300	376	ทางเลี้ยงเมื่อ
		3525	สามแยกกระ
651504103	12100	3087	ราชบุรี - แก้ม
651505056	13000	3087	ราชบุรี - แก้ม
651531094	31410	3087	ราชบุรี - แก้ม
651419	22200	3087	ราชบุรี - แก้ม
651636	24100	3090	บ้านเลือก - ห
651422	22200	3090	บ้านเลือก - ห
651620	24100	3206	ห้วยศาลา - จ
651505057	13000	3206	ห้วยศาลา - จ
653068	23300	3206	ห้วยศาลา - จอมบึง ตอน 1
651504106	12100	3208	เขาวัง - น้ำพุ

การติดตามความก้าวหน้า จะแบ่งสถานะการติดตามดังนี้

1. รอกจัดทำแผนรายประมาณการ



หมายถึงบัญชีความต้องการที่เห็นชอบและประกาศแจ้งทำแผน และยังไม่มีการจัดทำแผนรายประมาณการ หรือกำลังจัดทำและบันทึกเป็น “แบบร่าง” สามารถบอกได้ว่ารายการที่ยังไม่จัดทำแผนรายประมาณการหรือกำลังจัดทำมีรายการไหนบ้าง โดยผู้ใช้งานสามารถ

- กราบจำนวนแผนที่รอกจัดทำหรือกำลังจัดทำแผนรายประมาณการ
- กราบสถานะของแผน
- ดูแผนที่
- ดูข้อมูลรายละเอียด

85+100	88+000	1.000 แห่ง	15,000,000	15	ราชบุรี			
2+300	3+500	1.000 แห่ง	30,000,000	15	ราชบุรี			

หมายเหตุ ::

1. สถานะแขวง ประกอบด้วย

-  : แบบร่าง หมายถึง กำลังจัดทำแผนรายประมาณการและบันทึกเป็นแบบร่าง
-  : กรณีที่ไม่แสดงสัญลักษณ์ใด หมายถึง ยังไม่ได้นำไปจัดทำแผนรายประมาณการ

ดูรายละเอียดหน้าถัดไป >>



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

1). ข้อมูลรอกจัดทำแผนรายประมาณการ

≡ ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

dis335, แขวงทางหลวงราชบุรี


ติดตามโครงการ

สรุปบัญชีแผนงาน งานทาง 2565


บัญชีความต้องการรอกจัดทำแผนรายประมาณการทั้งหมดมี 16 แผน


ค้นหาบัญชีแผนงาน

 รอกจัดทำแผนรายประมาณการ
16
















































 รอกพิจารณาแผนรายประมาณการ
2

 ระหว่างจัดจ้าง
0

 ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง
0



 ดำเนินงานเสร็จสิ้น
0

รอกจัดทำแผนรายประมาณการ

ID code	รหัสงาน	หมายเลขทางหลวง	ชื่อตอน	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ปริมาณงาน (หน่วย)	งบประมาณ	สทล.	แขวง	แขวง		
651501054	11100	4	สระกระเทียม - คลองอ้อ		76+850	1.000 แห่ง	25,000,000	15	ราชบุรี			
651538093	33300	4	คลองอ้อ - หลุมดิน ตอน 1	80+988	85+350	1.000 แห่ง	10,000,000	15	ราชบุรี			
651538094	33300	4	คลองอ้อ - หลุมดิน ตอน 2	81+296	96+738	1.000 แห่ง	10,000,000	15	ราชบุรี			
651530915	31100	376	ทางเลี่ยงเมืองราชบุรี	0+000	4+950	1.000 แห่ง	4,000,000	15	ราชบุรี			
651530916	31300	376	ทางเลี่ยงเมืองราชบุรี	4+950	9+950	1.000 แห่ง	2,000,000	15	ราชบุรี			
		3525	สามแยกกระจับ - หมอโง่	0+000	4+000							
651504103	12100	3087	ราชบุรี - แก้มฮิ้น	5+850	7+300	1.000 แห่ง	30,000,000	15	ราชบุรี			
651505056	13000	3087	ราชบุรี - แก้มฮิ้น	12+850	14+850	1.000 แห่ง	50,000,000	15	ราชบุรี			
651531094	31410	3087	ราชบุรี - แก้มฮิ้น ตอน 1	17+280	47+000	1.000 แห่ง	10,000,000	15	ราชบุรี			
651419	22200	3087	ราชบุรี - แก้มฮิ้น	47+460	49+400	1.000 แห่ง	10,100,000	15	ราชบุรี			
651636	24100	3090	บ้านเลือก - หมอจางยา ตอน 2	23+435	25+461	1.000 แห่ง	14,000,000	15	ราชบุรี			
651422	22200	3090	บ้านเลือก - หมอจางยา	32+200	37+000	1.000 แห่ง	15,000,000	15	ราชบุรี			
651620	24100	3206	ห้วยศาลา - จอมบึง ตอน 2	44+000	45+900	1.000 แห่ง	15,000,000	15	ราชบุรี			
651505057	13000	3206	ห้วยศาลา - จอมบึง	78+900	84+050	1.000 แห่ง	50,000,000	15	ราชบุรี			
653068	23300	3206	ห้วยศาลา - จอมบึง ตอน 1	85+100	88+000	1.000 แห่ง	15,000,000	15	ราชบุรี			
651504106	12100	3208	เขาวัง - น้ำพุ	2+300	3+500	1.000 แห่ง	30,000,000	15	ราชบุรี			

หมายเหตุ ::

1. สถานะแขวง ประกอบด้วย

-  : แบบร่าง หมายถึง กำลังจัดทำแผนรายประมาณการและบันทึกเป็นแบบร่าง
-  : กรณีที่ไม่แสดงสัญลักษณ์ใด หมายถึง ยังไม่ได้นำไปจัดทำแผนรายประมาณการ

ดูรายละเอียดหน้าถัดไป >>



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

1). ข้อมูลรจัดทำแผนรายประมาณการ

ระบบบริหารแผนงานทางหลวง


dis335, แขวงทางหลวงราชบุรี

ติดตามโครงการ

สรุปบัญชีแผนงาน งานทาง 2565

รจัดทำแผนรายประมาณการ


ID code	รหัสงาน	หมายเลขทางหลวง	ชื่อคอน
651501054	11100	4	สระกระเทียม
651538093	33300	4	คลองอู่จาง - ร
651538094	33300	4	คลองอู่จาง - ร
651530915	31100	376	ทางเลี่ยงเมือง
651530916	31300	376	ทางเลี่ยงเมือง
		3525	สามแยกกระจะ
651504103	12100	3087	ราชบุรี - แก้ม
651505056	13000	3087	ราชบุรี - แก้ม
651531094	31410	3087	ราชบุรี - แก้ม
651419	22200	3087	ราชบุรี - แก้ม
651636	24100	3090	บ้านเลือก - ท
651422	22200	3090	บ้านเลือก - ท
651620	24100	3206	ห้วยศาลา - จ
651505057	13000	3206	ห้วยศาลา - จ
653068	23300	3206	ห้วยศาลา - จอมบึง ตอน 1

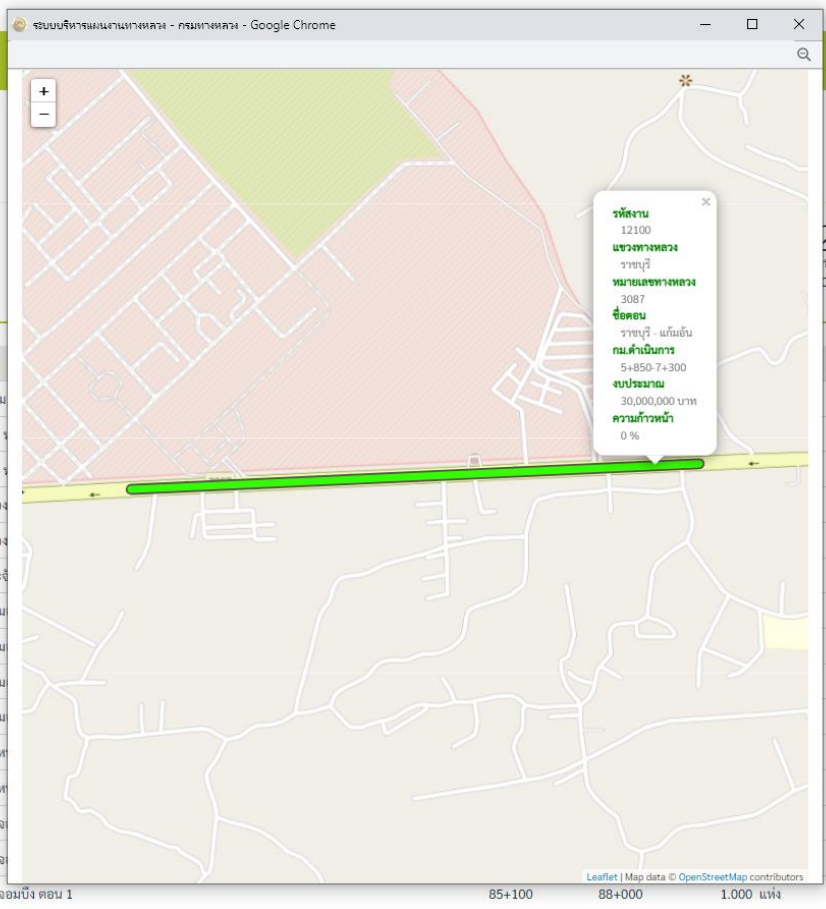

ค้นหาบัญชีแผนงาน▼

งประมาณ	สทล.	แขวง	แขวง		
25,000,000	15	ราชบุรี			
10,000,000	15	ราชบุรี			
10,000,000	15	ราชบุรี			
4,000,000	15	ราชบุรี			
2,000,000	15	ราชบุรี			
30,000,000	15	ราชบุรี			
50,000,000	15	ราชบุรี			
10,000,000	15	ราชบุรี			
10,100,000	15	ราชบุรี			
14,000,000	15	ราชบุรี			
15,000,000	15	ราชบุรี			
15,000,000	15	ราชบุรี			
50,000,000	15	ราชบุรี			
15,000,000	15	ราชบุรี			

ดูแผนที่



รูปที่ 1.1. แผนที่แผนงานทางรหัสงาน12100 แขวงทางหลวงราชบุรี หมายเลขทางหลวง 3087 สถานะแขวงกำลังจัดทำแผนรายประมาณการ บันทึกเป็นแบบร่าง



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

1). ข้อมูลรจัดทำแผนรายประมาณการ

รายละเอียดบัญชีความต้องการ									
งานทาง				สถานะทาง	สถานะเขต	สถานะส่วนกลาง			
ข้อมูลเบื้องต้น									
ประเภทโครงการ	รหัส IDCode	รหัสโครงการ			กิจกรรม				
2565	65194103	โครงการสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			ก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวง				
รหัสงานหลัก	รหัสงาน			รหัสสายย่อย					
12000 : โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาทางหลวง	12100 : งานก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงและปรับปรุงสภาพทางหลวง								
สำนัก	สำนักทางหลวงชนบท			แขวงทางหลวง					
	สำนักทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)			แขวงทางหลวงราชบุรี					
ข้อมูลผู้โยกย้าย									
ทางหลวง	ถนนหลวง	ชื่อถนน/ถนนงาน	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทางหลัก	ทางขนาน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3087	0100	ราชบุรี - นครชัย	5+850	7+300	1,450			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
รายละเอียดโครงการ									
ประมาณการค่าก่อสร้าง (บาท)	ปริมาณงานตามจริง (กม.)	ระยะทางจริง (กม.)	ปริมาณงาน ระยะทาง (กม.) (2024-2025)	ระยะเวลาดำเนินการ (ปี)	หมายเลข Asian Highway (km/h)				
30,000,000.00	1.00 กม.								
จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	เขตเมือง/ที่	จังหวัด (๒)					
ประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านไร่	เขตเมือง	ประจวบคีรีขันธ์					
ประเภทผิวทางเดิม	ประเภทผิวทางที่จะก่อสร้าง	ปี พ.ศ. บูรณาการล่าสุด	ปี พ.ศ.ก่อสร้างบูรณะที่ล่าสุด	เสียงสะท้อน	เขตเศรษฐกิจพิเศษ / EEC				
				<input type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี	<input type="radio"/> ใช่ <input type="radio"/> ไม่ใช่				
สภาพความเสียหายของทางหลวง <input type="radio"/> มาก (>50% ของพื้นที่) <input type="radio"/> ปานกลาง (30%-49% ของพื้นที่) <input type="radio"/> น้อย (< 30% ของพื้นที่)									
ลักษณะความเสียหายสภาพปัจจุบัน <input type="radio"/> รอยร้าว/ช่องแคบ <input type="radio"/> เม็ดทราย/หินหลุด <input type="radio"/> ทรุดตัว/ยุบตัว <input type="radio"/> วัชพืช/ต้นไม้ <input type="radio"/> อื่นๆ									
วิธีการและเหตุผล รายละเอียดความต้องการเบื้องต้น <input checked="" type="checkbox"/> ลักษณะของพื้นที่ <input type="checkbox"/>									
รายละเอียดเบื้องต้น (ตามพิจารณา)									
ประเภทความเสียหาย	วันที่เกิดเหตุ	สถานะ รายงาน ก.ร.บ.จ.	วันที่ ก.ร.บ.จ. เห็นชอบ	วันที่รายงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการ					
การเกิดความเสียหาย	บริเวณที่เกิดความเสียหาย	สาเหตุความเสียหาย	สภาพภูมิประเทศ	ผลกระทบต่อการจราจร	สามารถจัดการจราจรได้หรือไม่				
ความเสียหายที่คิดและจำนวนเงินค่าดำเนินการสำรวจและออกแบบ	หมายเหตุ								
ลักษณะพื้นที่ก่อสร้าง	จุดประสงค์ของการดำเนินการ	ดำเนินการได้ทันที/เมื่อได้รับงบ							
โครงการหลวง	ชื่อโครงการหลวง								
โครงสร้างระบบระบายน้ำเดิม	โครงสร้างระบบระบายน้ำ								
ชื่อชุมชน	แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ								
สถานะทาง สถานะ <input type="radio"/> รอจัดลำดับ <input type="radio"/> จัดลำดับแล้ว <input type="radio"/> รอพิจารณา <input type="radio"/> เห็นชอบ <input type="radio"/> ไม่เห็นชอบ โดย วันที่									

ในขั้นตอนการจัดทำแผนรายประมาณการ รายละเอียดของแผนงานจะยังคงเป็นรายละเอียดบัญชีความต้องการ

รูปที่ 1.2 รายละเอียดแผนงานทางรหัสงาน 12100 แขวงทางหลวงราชบุรี หมายเลขทางหลวง 3087
สถานะแขวงกำลังจัดทำแผนรายประมาณการบันทึกเป็นแบบร่าง



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

2). ข้อมูลพิจารณาแผนรายประมาณการ

≡ ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

dis335, แขวงทางหลวงราชบุรี

ติดตามโครงการ

สรุปบัญชีแผนงาน งานทาง 2565

ค้นหาบัญชีแผนงาน

รอจัดทำแผนรายประมาณการ
16

รอพิจารณาแผนรายประมาณการ

ระหว่างจัดจ้าง

ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง

ดำเนินงานเสร็จสิ้น

รอพิจารณาแผนรายประมาณการ

ID code	รหัสงาน	หมายเลขทางหลวง	ชื่อตอน
651538095	33300	4	สระกระเทียม - คลองอีจาง
651531095	31400	3206	ห้วยศาลา - จอมบึง

จำนวนแผนงาน
2 แผน

หมายเหตุ ::

1. สถานะแขวง ประกอบด้วย
2. สถานะสทล. ประกอบด้วย
3. สถานะส่วนกลาง ประกอบด้วย
4. การพิจารณา ประกอบด้วย
5. จำนวนแผนที่ "รอพิจารณาแผนรายประมาณการ" x/y หมายถึง

- : แบบรับ
- : รอพิจารณา
- : รอพิจารณา
- ☑ : สามารถพิจารณาได้

เมื่อแขวงจัดทำแผนรายประมาณการก็จะเข้าสู่ขั้นตอนรอพิจารณาแผนรายประมาณการจากสำนักงานทางหลวงและส่วนกลาง โดยในขั้นตอนรอพิจารณาแผนรายประมาณการ คือ แผนรายประมาณการที่ส่งแล้ว และรอสำนักงานทางหลวงหรือส่วนกลางพิจารณา ผู้ใช้สามารถ

- กราบจำนวนแผนรายประมาณการที่รอพิจารณา
- กราบสถานะของแผนรายประมาณการ
- ดูแผนที่
- ดูข้อมูลรายละเอียด

หมายเหตุ ::

1. สถานะแขวง ประกอบด้วย
2. สถานะสทล. ประกอบด้วย
3. สถานะส่วนกลาง ประกอบด้วย
4. การพิจารณา ประกอบด้วย
5. จำนวนแผนที่ "รอพิจารณาแผนรายประมาณการ" x/y หมายถึง

- : แบบร่าง
- : รอพิจารณา
- : รอพิจารณา
- ☑ : สามารถพิจารณาได้

- : ส่งแผน
- : เห็นชอบ
- : เห็นชอบ

- : แจ้งแก้ไข
- : แจ้งแก้ไข

☒ : ไม่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากสำนักงานทางหลวงยังไม่เห็นชอบแผน
x : จำนวนแผนที่รอ user ที่ Login พิจารณา

ดูรายละเอียดหน้าถัดไป >>

y : จำนวนแผนทั้งหมดที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาแผน



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

2). ข้อมูลรอพิจารณาแผนรายประมาณการ

≡ ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

dis335, แขวงทางหลวงราชบุรี

ติดตามโครงการ

สรุปบัญชีแผนงาน งานทาง 2565

รอพิจารณาแผนรายประมาณการทั้งหมดมี 2 แผน

ค้นหาบัญชีแผนงาน

รอจัดทำแผนรายประมาณการ 16

รอพิจารณาแผนรายประมาณการ 2

ระหว่างจัดจ้าง 0

ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง 0

ดำเนินงานเสร็จสิ้น 0

รอพิจารณาแผนรายประมาณการ

ID code	รหัสงาน	หมายเลขทางหลวง	ชื่อตอน	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ปริมาณงาน (หน่วย)	งบประมาณตามแผน	สทล.	แขวง	แขวง	สทล.	ส่วนกลาง	ดูแผนที่
651538095	33300	4	สระกระเทียม - คลองอีจาง	67+334	73+958	1,000 แห่ง	10,000,000	15	ราชบุรี				
651531095	31400	3206	ห้วยศาลา - จอมบึง	54+104	85+003	1,000 แห่ง	10,000,000	15	ราชบุรี				

ทั้งสองแผนรายประมาณการมีสถานะรอส่วนกลางอนุมัติ ดูข้อมูล

จำนวนแผนงาน 2 แผน

งบประมาณตามแผน 20,000,000.00 บาท

ดูรายละเอียดหน้าถัดไป >>

หมายเหตุ ::

- สถานะแขวง ประกอบด้วย
- สถานะสทล. ประกอบด้วย
- สถานะส่วนกลาง ประกอบด้วย
- การพิจารณา ประกอบด้วย
- จำนวนแผนที่ "รอพิจารณาแผนรายประมาณการ" x/y หมายถึง

- : แบบร่าง
- : รอพิจารณา
- : รอพิจารณา
- ☒ : สามารถพิจารณาได้

- ⊕ : ส่งแผน
- ⊕ : เห็นชอบ
- ⊕ : เห็นชอบ
- ⊕ : ไม่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากสำนักงานทางหลวงยังไม่เห็นชอบแผน
- x : จำนวนแผนที่รอ user ที่ Login พิจารณา
- : แจ้งแก้ไข
- : แจ้งแก้ไข

y : จำนวนแผนที่ทั้งหมดที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาแผน



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

2). ข้อมูลพิจารณาแผนรายประมาณการ

≡ ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

dis335, แขวงทางหลวงราชบุรี

ติดตามโครงการ


สรุปบัญชีแผนงาน งานทาง 2565

รื้อพิจารณาแผนรายประมาณการ

ID code	รหัสงาน	หมายเลขทางหลวง	ชื่อตอน
651538095	33300	4	สระกระเทียม - คลอง
651531095	31400	3206	ห้วยศาลา - จอมบึง

หมายเหตุ ::

1. สถานะแขวง ประกอบด้วย
2. สถานะสทล. ประกอบด้วย
3. สถานะส่วนกลาง ประกอบด้วย
4. การพิจารณา ประกอบด้วย
5. จำนวนแผนที่ "รื้อพิจารณาแผนรายประมาณการ"

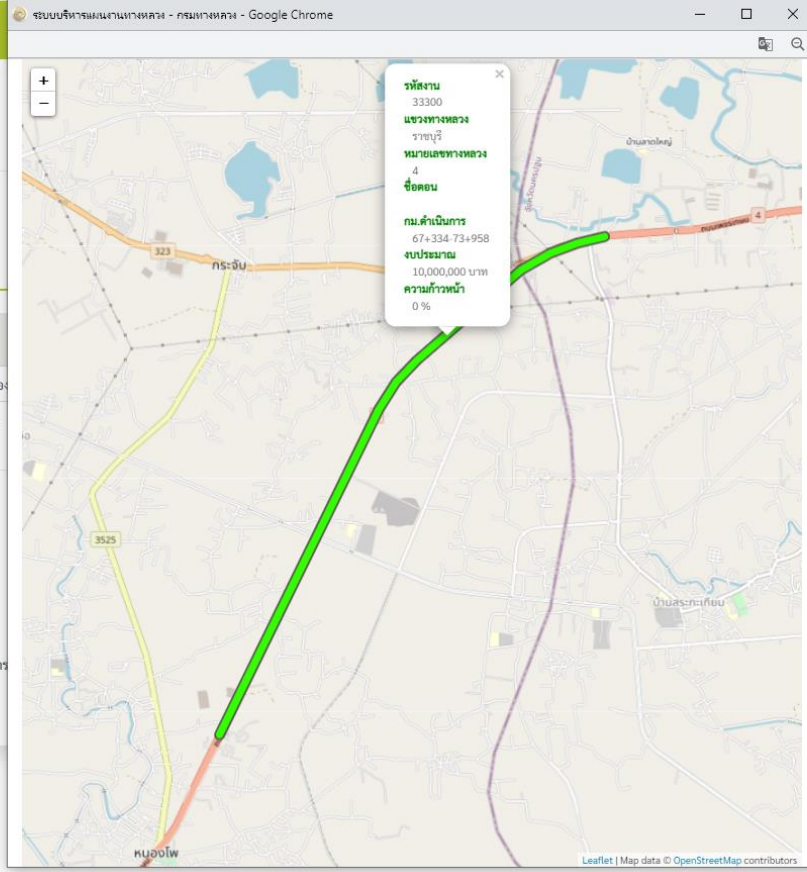

ค้นหาบัญชีแผนงาน

งานเสร็จสิ้น
0

ตามตามแผน	สทล.	แขวง	แขวง	สทล.	ส่วนกลาง	สถานะ	ดำเนินการ
10,000,000	15	ราชบุรี				ดูแผนที่	
10,000,000	15	ราชบุรี					

หมายเหตุ ::
y: จำนวนแผนที่ทั้งหมดที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาแผน

รูปที่ 2.1 แผนที่แผนรายประมาณการ รหัสงาน 33300 แขวงทางหลวงราชบุรี หมายเลขทางหลวง 4 สถานะรื้อส่วนกลางอนุมัติแผนรายประมาณการ




1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

2). ข้อมูลรอบพิจารณาแผนรายประมาณการ

รายละเอียดแผนรายประมาณการ

งานทาง		รหัสงบประมาณ	บัญชีงบประมาณ	วงเงินตาม พ.ร.บ./พ.ร.ก.	วงเงินตามแผนรายประมาณการ
ปีงบประมาณ	ID Code	-	สป. - บัญชี พ.ร.บ.	10,000,000	10,000,000
2565	651538095				
แผนงาน	รหัสงาน	ผลผลิต/โครงการ		กิจกรรม	
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางหลวง		ยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง	
สำนัก	รหัสงาน			รหัสงานย่อย	
สำนักยานยนต์ความปลอดภัย		33300 :: โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง		-	
สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง				
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)	ราชบุรี				



ในขั้นตอนรอบพิจารณาแผนรายประมาณการ รายละเอียดของแผนจะเป็นรายละเอียดแผนรายประมาณการ ประกอบด้วย 3 หัวข้อย่อย ดังนี้

- รายละเอียดโครงการ
- การพิจารณาแผน
- รายการงาน

โดยผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดได้แต่ไม่สามารถรายงานความก้าวหน้าได้ขณะรอบพิจารณา แผนรายประมาณการ



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

2). ข้อมูลรอพิจารณาแผนรายประมาณการ





รายละเอียดโครงการ

วงเงินตามแผนรายประมาณการ	รูปแบบการดำเนินงาน	ปริมาณงาน(ตามแผน)	ปริมาณงาน(ดำเนินการจริง)	เวลาดำเนินการ(วัน)	สถานะ
10,000,000	งานจ้างเหมา	1 แห่ง	-	90	ดำเนินการปกติ
จังหวัด	ระยะทางจริง(กม.)	คิดเป็นปริมาณงาน ระยะทาง(กม.)			
ราชบุรี		5.57	5.58 ต่อ 2 ช่องจราจร		

สภาพทางเดิม
 มาตรฐานทางขึ้น พิเศษ เขตทางซ้ายและขวากว้าง 40.00 ม. เขตทางรวม 80.00 ม. ชนิดผิวทาง AC, 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 ม. โหลทางด้านซ้ายกว้าง 2.50 ม. โหลทางด้านขวา 2.50 ม. บริเวณดำเนินการอยู่ในพื้นที่ ต.หนองอ้อ ต.คอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

รายละเอียดของงาน
 ทำการจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4 ระหว่าง กม.67+334 - กม.73+958 (เป็นช่วงๆ)

เหตุผลและความจำเป็น
 เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 4 ระหว่าง กม.67+334 - กม.73+958 (เป็นช่วงๆ) นั้นเป็นจุดที่ Guard Rail ต่ำ และชำรุดเสียหาย จำเป็นสมควรปรับปรุงและติดตั้งใหม่ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง

หมายเหตุเพิ่มเติม

ไฟล์แนบแผนรายประมาณการ

 กดเพื่อเปิดไฟล์

ทางหลวง	คอนควมคุม	ชื่อตอนในแผนงาน
4	0301	สระกระเทียม - คลองอีจาง

เหตุผลแก้คำผิด

ผู้บันทึกข้อมูล

ผู้บันทึกข้อมูล	วันที่บันทึกข้อมูล
แขวง ราชบุรี	18 สิงหาคม 2564 14:30

หัวข้อรายละเอียดโครงการจะประกอบไปด้วย

1. ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
2. ข้อมูลไฟล์แนบแผนรายประมาณการ
3. ข้อมูลที่ตั้งโครงการ
4. ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูล



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

2). ข้อมูลรอพิจารณาแผนรายประมาณการ



การส่งแผนจากแขวงทางหลวง

หนังสือนำส่ง 	เลขที่เอกสาร สทล.15.2/3888	เอกสารลงวันที่ 05 สิงหาคม 2564	โดย แขวง ราชบุรี	วันที่ส่งแผน 18 สิงหาคม 2564 14:58	
------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---------------------	---------------------------------------	--


สถานะการแก้ไขแผน
 ไม่สามารถแก้ไขแผน

การพิจารณาจากสำนักงานทางหลวง

สถานะ <input type="radio"/> รอพิจารณา <input checked="" type="radio"/> เห็นชอบ <input type="radio"/> แจ้งแก้ไข	หนังสือนำส่ง
เลขที่เอกสาร สทล.15.2/3888	เอกสารลงวันที่ 05 สิงหาคม 2564
ความเห็นเพิ่มเติม	
โดย เขต (ประจวบคีรีขันธ์)	
วันที่พิจารณาล่าสุด 08 กันยายน 2564 09:24	วันที่แจ้งแก้ไขล่าสุด

หัวข้อพิจารณาแผนจะประกอบไปด้วย

1. ข้อมูลการส่งแผนจากแขวงทางหลวง สามารถคลิก **ประวัติการพิจารณาแผนฯ** เพื่อดูประวัติการพิจารณาที่ผ่านมา
2. ข้อมูลการพิจารณาจากสำนักงานทางหลวงและส่วนกลาง
3. ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูล



รายงานงาน

หัวข้อรายงานจะประกอบไปด้วยรายงานทั้งหมด

ลำดับ	รายงานงาน		
1	1.1 REMOVAL OF EXISTING SINGLE W-BEAM GUARDRAIL CLASS...I.. TYPE...I..	288.000 M.	57.00
2	6.8(1) SINGLE W-BEAM GUARDRAIL CLASS...I..TYPE...I..	5,576.000 M.	1,761.50
3	6.10(4.1) REFLECTING TARGET FOR GUARDRAIL แบบสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาด 0.15 M. x 0.10 M. ชนิดหน้าเดียว	1,407.000 EACH	110.50
4	7 งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างทางก่อสร้าง บริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร	1,000 L.S.	6,957.00

1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน



3). ข้อมูลระหว่างจัดจ้าง

- ข้อมูลระหว่างจัดจ้าง หมายถึง แผนรายประมาณการที่ส่วนกลางเห็นชอบแล้ว
- แผนงานหรือโครงการที่จัดอยู่ใน ข้อมูลระหว่างจัดจ้าง คือ แผนงานที่มีรูปแบบการดำเนินงาน
 1. งานจ้างเหมา ที่ยังไม่กำหนดวันที่ลงนามในสัญญา
 2. งานจ้างเหมาและดำเนินการเอง ที่ยังไม่กำหนดวันที่ลงนามในสัญญา
- แผนงานที่มีรูปแบบการดำเนินงาน เป็น “งานดำเนินการเอง” ไม่จัดอยู่ใน ข้อมูลระหว่างจัดจ้าง



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

3). ข้อมูลระหว่างจัดจ้าง

เมื่อส่วนกลางพิจารณาอนุมัติเห็นชอบแผนรายประมาณการ แผนงานดังกล่าวจะมาอยู่ในขั้นตอนระหว่างจัดจ้าง !! **ยกเว้น** แผนงานที่มีรูปแบบการดำเนินงาน เป็น “งานดำเนินการเอง” จะจัดให้อยู่ในขั้นตอนระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง

สรุปบัญชีแผนงาน งานทาง 2565

ค้นหาบัญชีแผนงาน

รวบรวมแผนรายประมาณการ
0

รอพิจารณาแผนรายประมาณการ
39

ระหว่างจัดจ้าง
2

ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง
0

ดำเนินงานเสร็จสิ้น
0


แผนงานที่มีรูปแบบการดำเนินงาน - งานจ้างเหมา
- งานจ้างเหมาและดำเนินการเอง

แผนงานที่มีรูปแบบการดำเนินงาน เป็น “งานดำเนินการเอง”

รหัสงาน	หมายเลขทางหลวง	ชื่อตอน	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ปริมาณงาน (หน่วย)	งบประมาณเห็นชอบ	สทล.	แขวง
22200	12	บ้านกว้าง - พิษณุโลก ตอน 1	194+769	196+480	1.000 แร่ง	12,000,000	5	พิษณุโลกที่ 1
24100	12	บ้าน				0	5	พิษณุโลกที่ 1

ผู้ใช้สามารถคลิกดูแผนที่ของแผนงานที่สนใจ

จำนวนแผนงาน
2 แผน

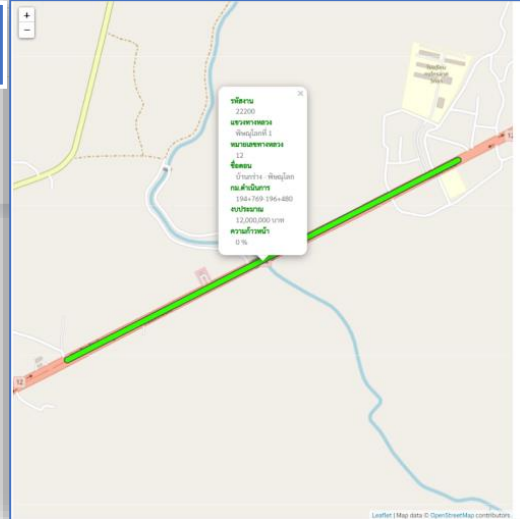

ดูแผนที่
ดูข้อมูล

ดูรายละเอียดและดำเนินการจนเสร็จสิ้นในขั้นตอนนี้ โดยคลิก แผนงานที่ต้องการ



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

4). ข้อมูลระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง

- ข้อมูลระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง หมายถึง ข้อมูลแผนรายประมาณการที่ส่วนกลางเห็นชอบแล้ว
- แผนงานหรือโครงการที่จัดอยู่ในข้อมูลระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง คือ แผนงานที่มีรูปแบบการดำเนินงาน
 1. งานดำเนินการเอง ที่ยังไม่กำหนดวันที่เริ่มงาน
 2. งานจ้างเหมาและดำเนินการเอง ที่ลงนามในสัญญาแต่ยังไม่กำหนดวันที่ตรวจรับงาน
 3. งานจ้างเหมา ที่ลงนามในสัญญาแต่ยังไม่กำหนดวันที่ตรวจรับงาน



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

4). ข้อมูลระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง

ระบบบริหารแผนงาน เพื่อส่วนกลางพิจารณาอนุมัติเห็นชอบแผนรายการ แผนงานหรือโครงการที่จัดอยู่ในข้อมูลระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง
ติดตามโครงการ แผนงานดังกล่าวจะมาอยู่ในขั้นตอนระหว่างจัดจ้าง

สรุบบัญชีแผนงาน งานอาคาร 2565 ค้นหาบัญชีแผนงาน

รอจัดทำแผนรายการประมาณการ
0

รอพิจารณาแผนรายการประมาณการ
0

ระหว่างจัดจ้าง
0

ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง
1

ดำเนินงานเสร็จสิ้น
0

ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง

ID Code	รหัสงาน	ชื่องาน(ตามแผน)	งบประมาณเห็นชอบ สำนัก	สทล. แฉวง
65205947	20540	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ.ชลบุรี	700,000	14 ชลบุรีที่ 1

ผู้ใช้สามารถคลิกดูแผนที่ของแผนงานที่สนใจ

1 แผนที่

ดูแผนที่

ดูข้อมูล

ดูรายละเอียดและดำเนินการจนเสร็จสิ้นในขั้นตอนนี้ โดยคลิก แผนที่ที่ต้องการ





1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลรายละเอียดโครงการระหว่างจัดจ้าง

รายละเอียด

งานทาง

ปีงบประมาณ	ID Code	รหัสงบประมาณ	บัญชีงบประมาณ	วงเงินตาม พ.ร.บ./พ.ร.ก.	วงเงินตามแผนรายประมาณการ
2565	650144	0800629002420378	สร. - บัญชี พ.ร.บ. (งานทาง)	12,000,000	12,000,000
แผนงาน	ผลผลิต/โครงการ	กิจกรรม			
แผนงานพื้นฐานด้านโครงสร้างความสามารถในการแข่งขัน	โครงการทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา	บำรุงรักษาทางหลวง			
สำนัก	รหัสงาน	รหัสงานย่อย			
สำนักบริหารบำรุงทาง	22200 :: งานเสริมผิวเอสฟัลต์	-			
สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง				
สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)	พิษณุโลกที่ 1				



มีเฉพาะประเภทงานทางและงานสะพาน

รายละเอียดโครงการ

วงเงินตามแผนรายประมาณการ	รูปแบบการดำเนินงาน	ปริมาณงาน(ตามแผน)	ปริมาณงาน(ดำเนินการจริง)	เวลาดำเนินการ(วัน)	สถานะ
12,000,000	งานจ้างเหมา	1 แห่ง	-	60	ดำเนินการปกติ
จังหวัด	ระยะทางจริง(กม.)	คิดเป็นปริมาณงาน ระยะทาง(กม.)			
สุโขทัย	1.71	1.71	ต่อ 2 ช่องจราจร		

สภาพทางเดิม

ระหว่าง กม.194+769 - 202+769 มาตรฐานชั้นทาง พิเศษ ผิวทาง Asphalt Concrete กว้างข้างละ 7.0 ม. โหล่ทาง Asphalt Concrete กว้าง 2.50 ม. เกาะกลางกว้าง 2.00 ม. เขตทางกว้างทั้งหมด 20.00 - 30.00 ม. ก่อสร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ. - อายุบริการ - ปี อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

รายละเอียดของงาน

ทำการเสริมผิวเอสฟัลต์ ด้วย ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK พร้อมทั้งทำการที่เส้นจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกด้วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เหตุผลและความจำเป็น

เป็นทางหลวงที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดรวมทั้งผู้สัญจรสามารถเดินทางไปสู่ภาคเหนือ สภาพผิวทางเดิมเสียหายเป็นร้อยละต่อผู้ใช้เส้นทางได้

ขั้นตอนระหว่างจัดจ้างแผนงานทางจะประกอบไปด้วย 10 ขั้นตอนย่อย



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลรายละเอียดโครงการระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง

รายละเอียด

งานอาคาร

ปีงบประมาณ 2565	ID Code 65205947	รหัสงบประมาณ 0800629001410007	บัญชีงบประมาณ สร. - บัญชี พ.ร.บ. (งานอาคาร)	วงเงินตาม พ.ร.บ./พ.ร.ก. 700,000	วงเงินตามแผนรายประมาณการ 700,000
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน	ผลลัพธ์/โครงการ โครงการทางหลวงได้รับการพัฒนา	รหัสงานย่อย 20540 :: ค่าปรับปรุงอาคารที่พิศอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	กิจกรรม อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ -	หมวดทางหลวง
รหัสงาน 20500 :: อาคารสถานที่	รหัสงานย่อย 20540 :: ค่าปรับปรุงอาคารที่พิศอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	รหัสงานย่อย 20540 :: ค่าปรับปรุงอาคารที่พิศอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ -	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ -	หมวดทางหลวง
สำนักงานทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)	รหัสงานย่อย 20540 :: ค่าปรับปรุงอาคารที่พิศอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	รหัสงานย่อย 20540 :: ค่าปรับปรุงอาคารที่พิศอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ -	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ -	หมวดทางหลวง

รายละเอียดโครงการ การพิจารณาแผน ก่อนทำสัญญา ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน งานดำเนินการเอง ข้อมูลทางบัญชี คณะกรรมการ กำหนดแผนดำเนินงานโครงการ ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย

รายละเอียดโครงการ

ชื่องาน(ตามแผน) ค่าปรับปรุงอาคารที่พิศอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ.ชลบุรี	ประเภทอาคาร สำนักงานแขวงทางหลวง	ประเภทอาคารอื่นๆ -	สถานะ ดำเนินการปกติ
รูปแบบการดำเนินงาน ดำเนินการเอง	ปริมาณงาน 1 แห่ง	เวลาดำเนินการ(วัน) 90	
สภาพอาคารเดิม	รายละเอียดของงาน	เหตุผลและความจำเป็น	

ขั้นตอนระหว่างดำเนินงานก่อสร้างแผนงานอาคารจะประกอบไปด้วย 9 ขั้นตอนย่อย

จะเห็นได้ว่าขั้นตอนข้อมูลรายละเอียดโครงการระหว่างจัดจ้าง และ ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างจะมีข้อมูลย่อยที่คล้ายๆกัน ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกเพื่อติดตามและรายงานความก้าวหน้า ดังนี้



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลรายละเอียดโครงการ



รายละเอียดโครงการ	รูปแบบการดำเนินงาน	ปริมาณงาน(ตามแผน)	ปริมาณงาน(ดำเนินการจริง)	เวลาดำเนินการ(วัน)	สถานะ
วงเงินตามแผนรายประมาณการ 12,000,000	งานจ้างเหมา	1 แห่ง	-		60 ดำเนินการปกติ
จังหวัด สุโขทัย	ระยะทางจริง(กม.) 1.71	คิดเป็นปริมาณงาน ระยะทาง(กม.) 1.71	ต่อ 2 ช่องจราจร		
สภาพทางเดิม ระหว่าง กม.194+769 - 202+769 มาตรฐานชั้นทาง พิเศษ ผิวทาง Asphalt Concrete กว้างข้างละ 7.0 ม. โหล่ทาง Asphalt Concrete กว้าง 2.50 ม. เกาะกลางกว้าง 2.00 ม. เขตทาง กว้างทั้งหมด 20.00 - 30.00 ม. ก่อสร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ. - อายุบริการ - ปี อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย			รายละเอียดของงาน ทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ด้วย ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK พร้อมทั้งทำการตีเส้นจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกด้วยจราจรติดป้าย		

1. รายละเอียดโครงการ
ในส่วนนี้คือรายละเอียดของแผนรายประมาณการที่ผ่านการอนุมัติโดยส่วนกลางแล้ว

ไฟล์แนบแผนรายประมาณการ กดเพื่อเปิดไฟล์	ไฟล์แนบ Cost Breakdown กดเพื่อเปิดไฟล์	ไฟล์แนบ เพิ่มเติม ไม่มีไฟล์แนบ(เพิ่มเติม)
ไฟล์เห็นชอบ	ไฟล์แนบแผนรายประมาณการ(เห็นชอบ) ไม่มีไฟล์แนบแผนรายประมาณการ(เห็นชอบ)	ไฟล์แนบ Cost Breakdown(เห็นชอบ) ไม่มีไฟล์แนบ Cost Breakdown(เห็นชอบ)
ผู้บันทึกไฟล์เห็นชอบ	วันที่บันทึกไฟล์เห็นชอบ	

โดยไฟล์แนบส่วนนี้จะแนบโดยส่วนกลางหากไม่เห็นด้วย

2. ไฟล์แนบแผนรายประมาณการ
ในส่วนนี้คือไฟล์แนบที่แขวงเพิ่มในขั้นตอนจัดทำแผนรายประมาณการและไฟล์แนบเห็นชอบในกรณีที่มีส่วนกลางเพิ่มเติม



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลรายละเอียดโครงการ

3. ที่ตั้งโครงการตามแผนรายประมาณการ
ในส่วนนี้คือที่ตั้งโครงการของแผนรายประมาณการที่ผ่านการเห็นชอบโดยส่วนกลางแล้ว

ที่ตั้งโครงการตามแผนรายประมาณการ							
ทางหลวง	ตอนควบคุม	ชื่อตอนในแผนงาน	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทางหลัก	ทางขนาน หมายเหตุ
12	0401	บ้านกร่าง - พิษณุโลก ตอน 1	194+769	196+480	1.731		
เหตุผลแก้ค่าคิด							

ที่ตั้งโครงการดำเนินการจริง							
ทางหลวง	ตอนควบคุม	ชื่อตอนในแผนงาน	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทางหลัก	ทางขนาน หมายเหตุ
12	0401	บ้านกร่าง - พิษณุโลก ตอน 1	194+769	196+480	1.731		
12	0401	บ้านกร่าง - พิษณุโลก ตอน 1	194+769	196+480	1.731		

ผู้บันทึกข้อมูล						
ผู้บันทึกข้อมูล	วันที่บันทึกข้อมูล	ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด	ผู้ส่งแผนรายประมาณการ	วันที่ส่งแผน	
แขวง พิษณุโลก 1	19 สิงหาคม 2564 09:13	แขวง พิษณุโลก 1	14 กันยายน 2564 11:06	แขวง พิษณุโลก 1	14 กันยายน 2564 11:06	

4. ที่ตั้งโครงการดำเนินการจริง
ในส่วนนี้คือที่ตั้งโครงการจริงของแผนรายประมาณการ

5. ผู้บันทึกข้อมูล
ในส่วนนี้คือข้อมูลต่างๆที่ทำการบันทึก , แก้ไขข้อมูล



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลพิจารณาแผน

1. ข้อมูลการส่งแผน

ในส่วนนี้คือรายละเอียดการส่งแผนรวมถึงประวัติการพิจารณาแผนคลิกปุ่ม **ประวัติการพิจารณาแผนฯ** เพื่อดูประวัติที่ผ่านมา

การส่งแผน

หนังสือนำส่ง กดเพื่อเปิดไฟล์

รายละเอียดโครงการ **การพิจารณาแผน** ก่อนทำสัญญา ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน

เลขที่เอกสาร: สทล.5 ขท พิชญโลกที่1/1380 เอกสารลงวันที่: 21 กรกฎาคม 2564 โดย: แขวง พิชญโลก 1 วันที่ส่งแผน: 16 กันยายน 2564 16:20 สถานะการแก้ไขแผน: ไม่สามารถแก้ไขแผน

ประวัติการพิจารณาแผนฯ

ประวัติการพิจารณา								
วันที่	ขั้นตอน	รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	เอกสารลงวันที่	ไฟล์หนังสือ	ไฟล์แผน	ไฟล์ CBD	โดย
02 พ.ย. 2564	ส่วนกลางเห็นชอบ		สร.1/2565	01 พ.ย. 2564				สร. ผู้อำนวย
14 ก.ย. 2564	ส่งแผน	ส่งแผน	สทล.5 ขท พิชญโลกที่ 1/1406	29 ก.ค. 2564				แขวง พิชญโลก 1

การพิจารณาจากสำนักงานทางหลวง

สถานะ: รอพิจารณา เห็นชอบ แจ้งแก้ไข

หนังสือนำส่ง: ไม่มีไฟล์แนบหนังสือนำส่ง

เลขที่เอกสาร: สทล.5.2/4162 เอกสารลงวันที่: 27 กรกฎาคม 2564

ความเห็นเพิ่มเติม

โดย: สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิชญโลก)

วันที่พิจารณาล่าสุด: 16 กันยายน 2564 16:55 วันที่แจ้งแก้ไขล่าสุด

การพิจารณาจากส่วนกลาง

สถานะ: รอพิจารณา เห็นชอบ แจ้งแก้ไข

หนังสือเห็นชอบ: ไม่มีไฟล์แนบหนังสือเห็นชอบ

งบประมาณที่อนุมัติ: 9,000,000 เลขที่เอกสาร: 1234 เอกสารลงวันที่: 02 พฤศจิกายน 2564

ความเห็นเพิ่มเติม

พิจารณาโดย: สร. ผู้อำนวย วันที่พิจารณา: 02 พฤศจิกายน 2564 15:12

เหตุผลในการแก้ไขผลการพิจารณาจากส่วนกลาง

แก้ไขโดย: วันที่แก้ไข:

2. ข้อมูลการพิจารณาจากสำนักงานทางหลวง

ในส่วนนี้คือรายละเอียดการพิจารณาจากสำนักงานทางหลวง

ดูรายละเอียดหน้าถัดไป >>



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลก่อนทำสัญญา

- ข้อมูลก่อนทำสัญญา หมายถึง การบันทึกข้อมูลการหาตัวผู้รับจ้าง
- แผนงานหรือโครงการที่จะต้องบันทึกข้อมูลก่อนทำสัญญา คือ แผนงานที่มีรูปแบบการดำเนินงาน
 1. งานจ้างเหมา
 2. งานจ้างเหมาและดำเนินการเอง
- แผนงานที่มีรูปแบบการดำเนินงาน เป็น “งานดำเนินการเอง” ไม่ต้องบันทึกข้อมูลก่อนทำสัญญา
- สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ DOH Procurement โดยใช้เลขที่โครงการจากระบบ DOH Procurement เป็นรหัสในการเชื่อมข้อมูล
- สามารถลิงค์ไฟล์จากระบบ DOH Procurement

หมายเหตุ ข้อมูลที่บันทึกในระบบ DOH Procurement จะสามารถเชื่อมโยงมายังระบบ PN2021 ได้ในวันถัดไป หากไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ สามารถ กรอกแบบฟอร์มเพิ่มเติมได้ [แบบแจ้งแก้ไขข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้างที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมทางหลวง](#)



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลก่อนทำสัญญา

งานอาคาร		รหัสงบประมาณ	บัญชีงบประมาณ	วงเงินตาม พ.ร.บ./พ.ร.ก.	วงเงินตามแผนรายประมาณการ
ปีงบประมาณ	ID Code	0800629001410007	สร. - บัญชี พ.ร.บ. (งานอาคาร)	700,000	700,000
2565	65205947				
แผนงาน	ผลผลิต/โครงการ			กิจกรรม	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา			อำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง	
รหัสงาน	รหัสงานย่อย			หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ	
20500 :: อาคารสถานที่	20540 :: ค่าปรับปรุงอาคารที่ทกอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			-	
สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง			หมวดทางหลวง	
สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)	ชลบุรีที่ 1				

รายละเอียดโครงการ

การพิจารณาแผน

ก่อนทำสัญญา

ข้อมูลสัญญา/
การดำเนินงาน

งานดำเนินการเอง

ข้อมูลทางบัญชี

คณะกรรมการ

กำหนดแผนดำเนินการโครงการ

ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย

ไม่แสดงข้อมูล ก่อนทำสัญญา สำหรับงานดำเนินการเอง

รูปที่3.1 ระบบไม่แสดงข้อมูลก่อนทำสัญญาสำหรับแผนรายประมาณการที่อยู่ในรูปแบบการดำเนินงานเป็น “งานดำเนินการเอง”



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลก่อนทำสัญญา

- รายละเอียดโครงการ
- การพิจารณาแผน
- ก่อนทำสัญญา**
- ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน
- งานดำเนินการเอง
- ข้อมูลทางบัญชี
- คณะกรรมการ
- กำหนดแผนดำเนินโครงการ
- ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย
- รายการงาน

* หน่วยงานเจ้าของแผน จะสามารถบันทึกรายละเอียดก่อนสัญญาได้ หลังจากส่วนกลางบันทึกวันที่ คค. ทราบร่าง TOR

ร่าง TOR

วันที่คค.ทราบร่าง TOR

ประเภทราคา/ประกาศเชิญชวน

วิธีการจัดหา

ไม่ระบุ

รายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา

ในขั้นตอนนี้หากส่วนกลางยังไม่ได้กำหนด วันที่ คค. ทราบร่าง TOR แหวงจะไม่สามารถแก้ไขหรือรายงานความก้าวหน้าได้ หากต้องการรายงานความก้าวหน้าของข้อมูลแต่ยังไม่วันที่ คค. ทราบร่าง TOR จะต้องติดต่อบริษัท

ลำดับ	ชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	เลขทะเบียนนิติบุคคล	ราคาที่เสนอ
-------	------------------------------	-------------------------------	---------------------	-------------

ไม่มีข้อมูลรายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา

การเสนอราคาและการพิจารณา

เปิดซองในวันที่

วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา	จำนวนผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา	จำนวนผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	วงเงินเสนอราคาต่ำสุด	
			0	
ผู้ยื่นเสนอราคาต่ำสุด	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	เลขทะเบียนนิติบุคคล		
วันที่รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง	วงเงินรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง			
วันที่ยกเลิกประกาศประกวดราคา	ไฟล์ยกเลิกประกาศ ไม่มีไฟล์	ลิงค์ไฟล์ยกเลิกประกาศ ไม่มีไฟล์	เหตุผลที่ยกเลิก	
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	วงเงินประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา	แนบไฟล์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ไม่มีไฟล์	ลิงค์ไฟล์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ไม่มีไฟล์	วันที่คค.ทราบผลผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่ยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา	ไฟล์ยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ไม่มีไฟล์	ลิงค์ไฟล์ยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา กดเพื่อเปิดไฟล์	เหตุผลที่ยกเลิก	



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลก่อนทำสัญญา

ร่าง TOR

วันที่คค.ทราบร่าง TOR
30 กันยายน 2564

เลขที่โครงการ DOH-Procurement เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล

เลขที่โครงการ (ข้อมูลนี้บันทึกในระบบ DOH Procurement จะสามารถเชื่อมโยงมาในระบบ PN2021 ได้ในครั้งต่อไป)

ประกวดราคา/ประกาศเชิญชวน

แก้ไขเลขที่โครงการ

วิธีการจัดหา
ไม่ระบุ

แก้ไขประกวดราคา/ประกาศเชิญชวน

รายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา

ลำดับ	ชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา	มาตรา 56(1) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (๒)	เลขทะเบียนนิติบุคคล	ราคาที่เสนอ
ไม่มีข้อมูลรายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา				

แก้ไขรายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา

การเสนอราคาและการพิจารณา

แก้ไขการเสนอราคาและการพิจารณา

เปิดซองในวันที

วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา	จำนวนผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา	จำนวนผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	วงเงินเสนอราคาต่ำสุด
ผู้ยื่นเสนอราคาต่ำสุด	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	เลขทะเบียนนิติบุคคล	

วงเงินรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

วงเงินรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

วันที่ยกเลิกประกาศประกวดราคา

ไฟล์ยกเลิกประกาศ

ลิงค์ไฟล์ยกเลิกประกาศ

ลิงค์ไฟล์ยกเลิกประกาศ

เหตุผลที่ยกเลิก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

แก้ไขประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

วงเงินประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

แบบไฟล์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ลิงค์ไฟล์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

วันที่คค.ทราบผลผู้ชนะการเสนอราคา

วันที่ยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา

ไฟล์ยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา

ลิงค์ไฟล์ยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา

ลิงค์ไฟล์ยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา

เหตุผลที่ยกเลิก

รูปที่ 3.2 ข้อมูลก่อนทำสัญญาเมื่อส่วนกลางทำการกำหนดวันที่ คค.ทราบค่า TOR แล้ว
จากรูปจะเห็นได้ว่า ผู้ใช้สามารถแก้ไขหรือรายงานความก้าวหน้าของขั้นตอนก่อนทำสัญญาได้



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลก่อนทำสัญญา

- รายละเอียดโครงการ
- การพิจารณาแผน
- ก่อนทำสัญญา**
- ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน
- งานดำเนินการเอง
- ข้อมูลทางบัญชี
- คณะกรรมการ
- กำหนดแผนดำเนินงานโครงการ
- ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย

ว่าง TOR

เลขที่โครงการ DOH-Procurement เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล

วันที่ค.ทราบร่าง TOR
30 กันยายน 2564

เลขที่โครงการ (ข้อมูลที่บันทึกในระบบ DOH Procurement จะสามารถเชื่อมโยงมายังระบบ PN2021 ได้ในวันถัดไป)

1. แก้ไขเลขที่โครงการ

ข้อมูลก่อนทำสัญญาประกอบด้วย

1. ข้อมูลร่าง TOR
ข้อมูลส่วนนี้จะถูกบันทึกโดยส่วนกลาง หากยังไม่มีข้อมูลวันที่ คค.ทราบร่าง แขวงจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลส่วนอื่นได้

เลขที่โครงการ (ข้อมูลที่บันทึกในระบบ DOH Procurement จะสามารถเชื่อมโยงมายังระบบ PN2021 ได้ในวันถัดไป)

64117014287

ระบุเลขที่โครงการสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ DOH Procurement

ข้อมูลเลขที่โครงการได้มาจากการป้อนข้อมูลในระบบ e-gp และได้ นำเลขจาก e-gp มาป้อนข้อมูลในระบบ doh procurement และเมื่อป้อนข้อมูลเลขที่โครงการในระบบ plannet ก็จะสามารถกดเชื่อมข้อมูลได้จากระบบ doh procurement

1. คลิก **แก้ไขโครงการ**
2. ระบุเลขที่โครงการสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ DOH Procurement
3. คลิก **บันทึก** เพื่อบันทึกเลขที่โครงการ

หลังจากบันทึกเลขที่โครงการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสามารถดึงข้อมูลจาก DOH Procurement ได้

ระบบ DOH Procurement คือ ระบบการรายงานการจัดซื้อจัดจ้างของกรมทางหลวง ทาง ศน. เป็นผู้ดูแลระบบ

การเชื่อมโยงระบบ DOH Procurement

เนื่องจากระบบ DOH Procurement จัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญของกรมฯ จึงใช้วิธีรวบรวมข้อมูลสิ้นวันแล้วโอนย้ายข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ายอีกเครื่อง และให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลมายังระบบ PN2021 จากเครื่องแม่ข่ายดังกล่าว จะทำให้ ข้อมูลจะเข้าไป 1 วัน **หมายถึง ถ้าพัสดุลงข้อมูลในระบบ DOH Procurement วันนี้ ข้อมูลในระบบ Plannet จะสามารถ เชื่อมโยงได้ในวันถัดไป**

สามารถตรวจสอบว่า จนท.พัสดุได้ลงระบบฯ หรือยังโดย

Not secure | doh.go.th

The screenshot shows the DOH Procurement system interface. On the left is a navigation menu with various procurement stages. A red box highlights two buttons: 'รายละเอียดโครงการ +' and 'ความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง +'. A blue callout box points to the 'รายละเอียดโครงการ +' button. The main content area shows a list of procurement items. A detailed view of a specific item is shown on the right, with a red box highlighting the 'เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง' (Project Number from the Ministry of Finance) field.

ลำดับ	ประเภทประกาศ	วันที่ประกาศ	วันที่สิ้นสุด
1	ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน	01/02/2565	04/02/2565
2	ประกาศราคากลาง	01/02/2565	02/05/2565

ดูรายละเอียดหน้าถัดไป >>



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลก่อนทำสัญญา

The screenshot shows a procurement system interface. A red box highlights the 'ก่อนทำสัญญา' (Before Contract) icon in the top navigation bar. Below it, there is a form with a 'เลขที่โครงการ DOH-Procurement' field containing '64107081652'. A modal error message is displayed in the center, stating 'แจ้งเตือน!!!' (Warning!!!) and 'หน่วยงานของท่าน ไม่ตรงกับข้อมูลหน่วยงานจากระบบ DOH Procurement' (Your agency does not match the information from the DOH Procurement system). A blue callout box on the right lists three reasons for the error: 1. Not required, 2. Not in the DOH Procurement system, 3. Still cannot connect. The bottom of the screenshot shows a table with columns for 'วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา' (Date of announcement of the winning bidder), 'วงเงินประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา' (Budget for announcement of the winning bidder), 'แนบไฟล์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา' (Attach winning bidder announcement file), 'ลิงค์ไฟล์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา' (Link to winning bidder announcement file), and 'วันที่คค.ทราบผลผู้ชนะการเสนอราคา' (Date of notification of the winning bidder).

1.กรอกเลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลางไม่ถูกต้อง สามารถเข้าไปตรวจสอบได้จาก ระบบ DOH Procurement ที่หน้า web กรมทางหลวง



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลก่อนทำสัญญา

ระบบแจ้งเตือน !!
เนื่องจากเลขที่โครงการดังกล่าว
1.ไม่ถูกต้อง
2.ไม่มีในระบบ DOH Procurement
3.ยังเชื่อมโยงไม่ได้

2. ไม่มีในระบบ DOH Procurement
 ถ้า จนท.พัสดุ ไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ DOH Procurement หรือตัวเลขไม่ถูกต้อง สามารถ แจ้งแก้ไข/เพิ่มเติม ได้ตามแบบฟอร์ม แบบแจ้งแก้ไขข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้างที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมทางหลวง



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลก่อนทำสัญญา

3.ยังเชื่อมโยงไม่ได้

เนื่องจากระบบ DOH Procurement จัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญของกรมฯ จึงใช้วิธีรวบรวมข้อมูลสิ้นวันแล้วโอนย้ายข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ายอีกเครื่อง และให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลมายังระบบ PN2021 จากเครื่องแม่ข่ายดังกล่าว จะทำให้ ข้อมูลจะช้าไป 1 วัน **หมายถึง ถ้าปัดสดลงข้อมูลในระบบ DOH Procurement วันนี้ ข้อมูลในระบบ Plannet จะสามารถ เชื่อมโยงได้ในวันถัดไป**



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลก่อนทำสัญญา

- รายละเอียดโครงการ
- การพิจารณาแผน
- ก่อนทำสัญญา**
- ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน
- งานดำเนินการเอง
- ข้อมูลทางบัญชี
- คณะกรรมการ
- กำหนดแผนดำเนินงานโครงการ
- ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย
- รายงานงาน

ร่าง TOR

วันที่คค.ทราบร่าง TOR
27/10/2564

ประกวดราคา/ประกาศเชิญชวน

วิธีการจัดหา
ไม่ระบุ

2. ข้อมูลประกวดราคา/ประกาศเชิญชวน
ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้

แก้ไขเลขที่โครงการ

1. แก้ไขประกวดราคา/ประกาศเชิญชวน

ประกวดราคา/ประกาศเชิญชวน

2. วิธีการจัดหา

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

e-bidding

วิธีคัดเลือก

วิธีเฉพาะเจาะจง

ปุ่มเชื่อมโยงข้อมูล

วิธีการจัดหาสามารถทำได้ 2 วิธี

1. คลิกปุ่ม **เชื่อมโยงข้อมูล** ระบบจะดึงข้อมูลจากระบบ DOH Procurement
2. หรือระบุข้อมูลที่ต้องการ
3. วิธีการจัดหาแต่ละวิธีจะมีข้อมูลที่ต้องบันทึกต่างกัน

สัญลักษณ์ หมายถึง ข้อมูลที่สามารถเชื่อมได้จากระบบ DOH Procurement

ดูรายละเอียดหน้าถัดไป >>



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลก่อนทำสัญญา

หลังจากเลือกวิธีการจัดหาแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลที่ต้องบันทึกตามวิธีการจัดหาที่ระบุ

ประกวดราคา/ประกาศเชิญชวน

วิธีการจัดหา

วันที่อนุมัติราคากลาง

วันที่เผยแพร่ราคากลาง

วงเงินราคากลาง

ไฟล์ราคากลาง* (ไฟล์ pdf เท่านั้น)

ลิงค์ไฟล์ราคากลาง

วันที่ประกาศ TOR

ไฟล์TOR* (ไฟล์ pdf เท่านั้น)

ลิงค์ไฟล์ TOR

ประเภทผู้รับจ้าง

ชั้นผู้รับจ้าง

วันที่ประกาศประกวดราคา

วงเงินประกวดราคา

ไฟล์ประกวดราคา* (ไฟล์ pdf เท่านั้น)

ลิงค์ไฟล์ประกวดราคา

จำนวนผู้ซื้อเอกสาร

รูปที่3.3 ระบบแสดงข้อมูลที่ต้องบันทึกประกวดราคา/ประกาศเชิญชวน เมื่อเลือกวิธี e-bidding

ประกวดราคา/ประกาศเชิญชวน

วิธีการจัดหา

วันที่อนุมัติราคากลาง

วันที่เผยแพร่ราคากลาง

วงเงินราคากลาง

ไฟล์ราคากลาง* (ไฟล์ pdf เท่านั้น)

ลิงค์ไฟล์ราคากลาง

วันที่ประกาศ TOR

ไฟล์TOR* (ไฟล์ pdf เท่านั้น)

ลิงค์ไฟล์ TOR

ประเภทผู้รับจ้าง

ชั้นผู้รับจ้าง

วันที่ประกาศประกวดราคา

วงเงินประกวดราคา

ไฟล์ประกวดราคา* (ไฟล์ pdf เท่านั้น)

ลิงค์ไฟล์ประกวดราคา

จำนวนผู้ซื้อเอกสาร

รูปที่3.4 ระบบแสดงข้อมูลที่ต้องบันทึกประกวดราคา/ประกาศเชิญชวน เมื่อเลือกวิธีคัดเลือก

จากรูปจะเห็นได้ว่าข้อมูลที่ต้องระบุเมื่อเลือกวิธีคัดเลือกจะต่างกับวิธี e-bidding เพียงมีให้เลือกกำหนดมาตรา 56



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

- ข้อมูลก่อนทำสัญญา

หลังจากเลือกวิธีการจัดหาแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลที่ต้องบันทึกตามวิธีการจัดหาที่ระบุ

ประกวดราคา/ประกาศเชิญชวน

วิธีการจัดหา

หนังสือเชิญชวน
 ทำ ไม่ทำ

วันที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

วงเงินจะซื้อหรือจ้าง

ไฟล์ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง* (ไฟล์ pdf เท่านั้น)

ลิงค์ไฟล์ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

คาดการณ์วันออกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รูปที่ 3.5 ระบบแสดงข้อมูลที่ต้องบันทึกประกวดราคา/ประกาศเชิญชวน เมื่อเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลก่อนทำสัญญา

- รายละเอียดโครงการ
- การพิจารณาแผน
- ก่อนทำสัญญา**
- ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน
- งานดำเนินการเอง
- ข้อมูลทางบัญชี
- คณะกรรมการ
- กำหนดแผนดำเนินงานโครงการ
- ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย
- รายงานงาน

ร่าง TOR

วันที่ค.ทรบร่าง TOR
27 ตุลาคม 2564

เลขที่โครงการ DOH-Procurement เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
64117445485

แก้ไขเลขที่โครงการ

3. สามารถกดเพื่อเชื่อมข้อมูลจากระบบ DOH Procurement

วิธีการจัดหา วิธีคัดเลือก

มาตรา 56(1)(ข)

วันที่อนุมัติราคากลาง 29/11/2564

วันที่เผยแพร่ราคากลาง 29/11/2564

วงเงินราคากลาง 11,605,232.28

ไฟล์ราคากลาง* (ไฟล์ pdf เท่านั้น) เลือกไฟล์

ลิงค์ไฟล์ราคากลาง

วันที่ประกาศ TOR 02/12/2564

ไฟล์TOR* (ไฟล์ pdf เท่านั้น) เลือกไฟล์

ลิงค์ไฟล์ TOR

ประเภทผู้รับจ้าง งานก่อสร้างทาง

ชั้นผู้รับจ้าง

วันที่ประกาศประกวดราคา 02/12/2564

วงเงินประกวดราคา 11,605,232.28

ไฟล์ประกวดราคา* (ไฟล์ pdf เท่านั้น) เลือกไฟล์

ลิงค์ไฟล์ประกวดราคา

จำนวนผู้ซื้อเอกสาร

บันทึก ยกเลิก

3. หลังจากคลิก ระบบจะแสดงข้อมูลจากระบบ DOH Procurement ตามที่ปรากฏสัญลักษณ์
- ข้อมูลที่ไม่ปรากฏสัญลักษณ์ ผู้ใช้จะต้องระบุข้อมูลเอง
4. จากรูปวันที่อนุมัติราคากลางผู้ใช้จะต้องระบุข้อมูลส่วนนี้เอง และบังคับกับวันที่อนุมัติราคากลางหากทำการระบุวันที่เผยแพร่ราคากลาง
5. หากมีลิงค์ไฟล์จากระบบ DOH Procurement แล้วผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องแนบไฟล์



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

- ข้อมูลก่อนทำสัญญา

ประกวดราคา/ประกาศเชิญชวน

วิธีการจัดหา มาตรา 56(1)(ข)

วันที่อนุมัติราคากลาง วันที่เผยแพร่ราคากลาง 29/11/2564

วงเงินราคากลาง 11,605,232.28

ไฟล์ราคากลาง* (ไฟล์ pdf เท่านั้น) ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

ลิงค์ไฟล์ราคากลาง

กรณีระบุวันที่อนุมัติราคากลางเนื่องจากมีการระบุวันที่เผยแพร่ราคากลาง

วันที่ประกาศ TOR 02/12/2564

ไฟล์TOR* (ไฟล์ pdf เท่านั้น) ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

ลิงค์ไฟล์ TOR

ประเภทผู้รับจ้าง งานก่อสร้างทาง

ชั้นผู้รับจ้าง

วันที่ประกาศประกวดราคา 02/12/2564

วงเงินประกวดราคา 11,605,232.28

ไฟล์ประกวดราคา* (ไฟล์ pdf เท่านั้น) ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

ลิงค์ไฟล์ประกวดราคา


จำนวนผู้ซื้อเอกสาร

รูปที่ 3.6 ระบบแจ้งเตือนข้อผิดพลาดเมื่อผู้ใช้ไม่ทำการระบุวันที่อนุมัติราคากลางหลังจากระบุวันที่เผยแพร่ราคากลางแล้ว



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

- ข้อมูลก่อนทำสัญญา

The screenshot shows a web application interface for procurement. At the top, there is a navigation bar with several icons. The icon for 'ก่อนทำสัญญา' (Before Contracting) is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there are fields for 'วันที่คค.ทราบร่าง TOR' and 'เลขที่โครงการ' (64107119898). A modal dialog box is displayed in the center, featuring a red 'X' icon and the text 'แจ้งเตือน!!!' (Warning!!!) and 'ไม่มีข้อมูลชิ้นตอนนี้ จากระบบ DOH Procurement' (No data for this item from the DOH Procurement system). Below the modal, there is a blue text box with the following text: '-หลังจากคลิก  ระบบจะแสดงข้อมูลดังรูป หากไม่มีข้อมูลจากระบบ DOH Procurement -หากไม่มีข้อมูลจากระบบ DOH Procurement ผู้ใช้สามารถระบุข้อมูลได้เอง'.



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลก่อนทำสัญญา

- รายละเอียดโครงการ
- การพิจารณาแผน
- ก่อนทำสัญญา**
- ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน
- งานดำเนินการเอง
- ข้อมูลทางบัญชี
- คณะกรรมการ
- กำหนดแผนดำเนินงานโครงการ
- ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย

ร่าง TOR

วันที่ค.ทรบร่าง TOR
30 กันยายน 2564

3. ข้อมูลรายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา ผู้ใช้งานได้ - เพิ่ม/ลบ/แก้ไขรายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา

ประกวดราคา/ประกาศเชิญชวน

แก้ไขประกวดราคา/ประกาศเชิญชวน

วิธีการจัดหา
ไม่ระบุ

รายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา

แก้ไขรายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา

ลำดับ	ชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา	มาตรา 56(1) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ช)	เลขทะเบียนนิติบุคคล	ราคาที่เสนอ
ไม่มีข้อมูลรายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา				

การเสนอราคาและการพิจารณา

แก้ไขการเสนอราคาและการพิจารณา

เปิดซองในวันที่

วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา	จำนวนผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา	จำนวนผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	วงเงินเสนอราคาต่ำสุด
ผู้ยื่นเสนอราคาต่ำสุด	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	เลขทะเบียนนิติบุคคล	
วันที่รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	วงเงินรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง		
วันที่ยกเลิกประกาศประกวดราคา	ไฟล์ยกเลิกประกาศ ไม่มีไฟล์	ลิงค์ไฟล์ยกเลิกประกาศ ไม่มีไฟล์	เหตุผลที่ยกเลิก



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลก่อนทำสัญญาในส่วนข้อมูลรายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา

- แผนงานประเภท “แผนงานทาง”

- หากแผนงานเป็นงานของสำนักบริหารบำรุงทาง

จะไม่สามารถกำหนดชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคาเองได้โดยจะกำหนดจากฐานข้อมูลผู้ประกอบการเท่านั้น หากไม่พบข้อมูลผู้ประกอบการสามารถแจ้ง สำนักบริหารบำรุงทาง เพื่อเพิ่มข้อมูล

- หากแผนงานเป็นงานของสำนักอื่นนอกเหนือจากสำนักบริหารบำรุงทาง

จะสามารถกำหนดชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคาเองได้

- แผนงานประเภท “แผนงานอาคาร”

จะสามารถกำหนดชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคาเองได้

- แผนงานประเภท “แผนงานสะพาน”

จะไม่สามารถกำหนดชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคาเองได้โดยจะกำหนดจากฐานข้อมูลผู้ประกอบการเท่านั้น หากไม่พบข้อมูลผู้ประกอบการสามารถแจ้ง สำนักบริหารบำรุงทาง เพื่อเพิ่มข้อมูล

- **เพื่อเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลผู้ประกอบการ สร. ติดต่อบางสาวสุชาวรรณ ชูณรงค์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ**

โทร 23528 หรือ 081-985-3516



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

- ข้อมูลก่อนทำสัญญา กรณีสามารถกำหนดชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคาเองได้

ขั้นตอนการเพิ่มรายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา

1. คลิก **แก้ไขรายชื่อรายชื่อบริษัทผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา**
2. คลิก **เพิ่มรายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา**
3. ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน และทำการคลิก **บันทึกข้อมูล**

รายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา

ลำดับ	ชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา	มาตรา 56(1) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ช)	เลขทะเบียนนิติบุคคล	ราคาที่เสนอ

ไม่มีข้อมูลรายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา

1. แก้ไขรายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา

รายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา

ลำดับ	ชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา	มาตรา 56(1) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ช)	เลขทะเบียนนิติบุคคล	ราคาที่เสนอ		

ไม่มีข้อมูลรายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา

2. เพิ่มรายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา

รายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา

3. ผู้ใช้สามารถระบุชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคาเองได้และสามารถกำหนดมาตรา 56 ได้

ลำดับที่ *	<input type="text"/> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> กำหนดชื่อผู้ยื่น <input type="radio"/> จากฐานข้อมูลผู้ประกอบการ <input checked="" type="radio"/> กำหนดเอง </div>	ชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา *	<input type="text"/> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; font-size: small;">มาตรา 56(1)(ช)</div>	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร *	<input type="text"/>	ราคาที่เสนอ *	<input type="text"/>	<input type="button" value="เพิ่มรายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา"/> <input type="button" value="ยกเลิก"/>
		<input type="button" value="บันทึก"/> <input type="button" value="ยกเลิก"/>						

ลำดับ	ชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา	มาตรา 56(1) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ช)	ราคาที่เสนอ		

ไม่มีข้อมูลรายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

- ข้อมูลก่อนทำสัญญา กรณีไม่สามารถกำหนดชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคาเองได้

ขั้นตอนการเพิ่มรายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา

- คลิก **แก้ไขรายชื่อรายชื่อบริษัทผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา**
- คลิก **เพิ่มรายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา**
- ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน และทำการคลิก **บันทึกข้อมูล**

รายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา

ลำดับ	ชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา	มาตรา 56(1) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ช)	เลขทะเบียนนิติบุคคล	ราคาที่เสนอ

ไม่มีข้อมูลรายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา

1. แก้ไขรายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา

รายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา

ลำดับ	ชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา	มาตรา 56(1) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ช)	เลขทะเบียนนิติบุคคล	ราคาที่เสนอ		

ไม่มีข้อมูลรายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา

2. เพิ่มรายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา ค้นหา

รายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา

3. ผู้ใช้ไม่สามารถจะระบุชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคาเองได้ ให้ทำการค้นหาและเลือกรายการที่ต้องการ

เพิ่มรายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา ค้นหา ยกเลิก

ลำดับที่ * กำหนดชื่อผู้ยื่น จากฐานข้อมูลผู้ประกอบการ กำหนดเอง

ชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา * มาตรา 56(1)(ช)

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร *

ราคาที่เสนอ *

บันทึก ยกเลิก

ลำดับ	ชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา	มาตรา 56(1) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ช)	ราคาที่เสนอ		


ไม่มีข้อมูลรายชื่อผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา

หากไม่พบชื่อผู้ยื่นเอกสารที่ต้องการ ให้ทำการติดต่อส่วนกลางเพื่อเพิ่มข้อมูล



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลก่อนทำสัญญา



4. ข้อมูลการเสนอราคาและการพิจารณา ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้

การเสนอราคาและการพิจารณา

ขั้นตอนการแก้ไขการเสนอราคาและการพิจารณา

1. คลิก **แก้ไขการเสนอราคาและการพิจารณา**
2. ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน และทำการกดบันทึกข้อมูล
 - สามารถคลิก เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ DOH Procurement
 - ข้อมูลที่ไม่ปรากฏสัญลักษณ์ ผู้ใช้จะต้องระบุข้อมูลเอง

1. แก้ไขการเสนอราคาและการพิจารณา

2.

รายชื่อผู้เสนอราคาและการพิจารณา

เปิดของในวันที่ 02/11/2564

วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา จำนวนผู้ยื่นเอกสารและเสนอราคา จำนวนผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ **วงเงินเสนอราคาต่ำสุด 4,800,000.00**

ผู้ยื่นเสนอราคาต่ำสุด บริษัท B เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 777777 เลขทะเบียนนิติบุคคล 888888

วันที่รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง วงเงินรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

วันที่ยกเลิกประกาศประกวดราคา ไฟล์ยกเลิกประกาศ* (ไฟล์ pdf เท่านั้น) **ระบบจะกำหนดข้อมูลเริ่มต้นจากวงเงินต่ำสุดของการเสนอราคา** ลิงค์ไฟล์ยกเลิกประกาศ เหตุผลที่ยกเลิก

เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลก่อนทำสัญญา

- รายละเอียดโครงการ
- การพิจารณาแผน
- ก่อนทำสัญญา

5. ข้อมูลประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้

ขั้นตอนการแก้ไขประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

1. คลิก **แก้ไขประกาศผู้ชนะการเสนอราคา**
2. ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน และทำการคลิก **บันทึกข้อมูล**
 - สามารถคลิก เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ DOH Procurement
 - ข้อมูลที่ไม่ปรากฏสัญลักษณ์ ผู้ใช้จะต้องระบุข้อมูลเอง

1. แก้ไขประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

2.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	วงเงินประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา	แนบไฟล์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา* (ไฟล์ pdf เท่านั้น)	ลิงค์ไฟล์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา	วันที่ศ.ทราบผลผู้ชนะการเสนอราคา
02/11/2564	4,800,000.00	<input type="button" value="เลือกไฟล์"/> <input type="button" value="ไม่ได้เลือกไฟล์ใด"/>		
วันที่ยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา	แนบไฟล์ยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา* (ไฟล์ pdf เท่านั้น)	ลิงค์ไฟล์ยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา	เหตุผลที่ยกเลิก	
	<input type="button" value="เลือกไฟล์"/> <input type="button" value="ไม่ได้เลือกไฟล์ใด"/>		<input type="text"/>	



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

- ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน

- แผนงานหรือโครงการที่จะต้องบันทึกข้อมูลสัญญา/ข้อมูลการดำเนินงาน คือ
 1. แผนงานที่มีรูปแบบการดำเนินงาน
 - 1.1. งานจ้างเหมา
 - 1.2. งานจ้างเหมาและดำเนินการเอง
 2. แผนงานที่ยังกำหนดวันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเท่านั้น
- แผนงานที่มีรูปแบบการดำเนินงาน เป็น “งานดำเนินการเอง” ไม่ต้องบันทึกข้อมูลสัญญา/ข้อมูลการดำเนินงาน
- สามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน

งานอาคาร					
ปีงบประมาณ	ID Code	รหัสงบประมาณ	บัญชีงบประมาณ	วงเงินตาม พ.ร.บ./พ.ร.ก.	วงเงินตามแผนรายประมาณการ
2565	65205947	0800629001410007	สร. - บัญชี พ.ร.บ. (งานอาคาร)	700,000	700,000
แผนงาน	ผลผลิต/โครงการ	กิจกรรม			
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน	โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา	อำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง			
รหัสงาน	รหัสงานย่อย	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ			
20500 :: อาคารสถานที่	20540 :: ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-			
สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	หมวดทางหลวง			
สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)	ชลบุรีที่ 1				

- รายละเอียดโครงการ
- การพิจารณาแผน
- ก่อนทำสัญญา
- ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน
- งานดำเนินการเอง
- ข้อมูลทางบัญชี
- คณะกรรมการ
- กำหนดแผนดำเนินการโครงการ
- ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย

ไม่แสดงข้อมูล สัญญา สำหรับงานดำเนินการเอง

รูปที่ 3.7 ระบบไม่แสดง ข้อมูลสัญญา/ข้อมูลการดำเนินงาน สำหรับแผนรายประมาณการที่อยู่ในรูปแบบการดำเนินงานเป็น “งานดำเนินงานเอง”



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน

รายละเอียด

งานทาง		รหัสงบประมาณ		บัญชีงบประมาณ	วงเงินตาม พ.ร.บ./พ.ร.ก.	วงเงินตามแผนรายประมาณการ
ปีงบประมาณ	ID Code	รหัสงบประมาณ	0800629002420378	สร. - บัญชี พ.ร.บ. (งานทาง)	12,000,000	12,000,000
2565	650144					
แผนงาน		ผลผลิต/โครงการ			กิจกรรม	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขัน		โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา			บำรุงรักษาทางหลวง	
สำนัก		รหัสงาน			รหัสงานย่อย	
สำนักบริหารบำรุงทาง		22200 :: งานเสริมผิวแอสฟัลต์			-	
สำนักงานทางหลวง		แขวงทางหลวง				
สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)		พิษณุโลกที่ 1				

รายละเอียดโครงการ
 การพิจารณาแผน
 ก่อนทำสัญญา
 ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน
 งานดำเนินการเอง
 ข้อมูลทางบัญชี
 คณะกรรมการ
 กำหนดแผนดำเนินงานโครงการ
 ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย
 รายงานงาน

ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลสัญญาได้ เนื่องจากยังไม่ได้กำหนดวันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รูปที่ 3.8 ระบบไม่แสดง ข้อมูลสัญญา/ข้อมูลการดำเนินงาน สำหรับแผนรายประมาณการที่ยังไม่กำหนดวันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน

- รายละเอียดโครงการ
- การพิจารณาแผน
- ก่อนทำสัญญา
- ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน
- งานดำเนินการเอง
- ข้อมูลทางบัญชี
- คณะกรรมการ
- กำหนดแผนดำเนินงานโครงการ
- ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย
- รายงานงาน

สัญญา/ข้อตกลง/ใบสั่งซื้อ

[แก้ไขสัญญา/ข้อตกลง/ใบสั่งซื้อ](#)

ประเภทสัญญา (การจัดจ้าง) วิธีคัดเลือก	<input type="checkbox"/> มาตรา 56(1)(ข)	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	สัญญาเลขที่/ใบสั่งซื้อเลขที่	วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 16 ธันวาคม 2564	วันที่ลงนาม
วันที่เริ่มต้นสัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา		ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา	แนบไฟล์สัญญา ไม่มีไฟล์สัญญา	ลิงค์ไฟล์สัญญา ไม่มีไฟล์	วันที่ค.ทราบบวันลงนามสัญญา
ชื่อผู้รับจ้าง	<input type="checkbox"/> มาตรา 56(1)(ข)		เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	วงเงินค่างานตามสัญญา(บาท)	ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ(บาท)	
วันที่แจ้งทำสัญญา	วันที่ผู้รับจ้างมาทำสัญญา		หมายเหตุ (ก-3)			

สรุปผลงานจ้างเหมา

ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้เนื่องจากไม่มีเลขที่สัญญาและวันที่เริ่มต้นสัญญา

ขยาย/ลด สัญญา

ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้เนื่องจากไม่มีเลขที่สัญญาและวันที่เริ่มต้นสัญญา

งค/ลด ค่าปรับ

ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงานประกอบไปด้วย

1. ข้อมูลสัญญา/ข้อตกลง/ใบสั่งซื้อ

!!ในกรณีที่ผู้ใช้มีการบันทึกข้อมูล ขยาย/ลด สัญญา และ/หรือ ข้อมูล งค/ลด ค่าปรับ วันที่เริ่มต้นสัญญา กับระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา จะไม่สามารถแก้ไขได้ หากต้องการแก้ไข จะต้องลบข้อมูล ขยาย/ลด สัญญา และ/หรือ ข้อมูล งค/ลด ค่าปรับ ก่อน



หากผู้ใช้ไม่ระบุเลขที่สัญญาและวันที่เริ่มต้นสัญญาในขั้นตอนของข้อมูลสัญญา/ข้อตกลง/ใบสั่งซื้อ ระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำการแก้ไขข้อมูลในส่วนของสรุปผลงานจ้างเหมา ขยาย/ลด สัญญา และ ข้อมูล งค/ลด ค่าปรับ




1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน









• ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน

ในขั้นตอนแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง/ใบสั่งซื้อ

- 1.ระบบจะกำหนดค่าเริ่มต้นของข้อมูลบางรายการตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อก่อนทำสัญญา
- 2.สามารถคลิก  เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ DOH Procurement
3. ข้อมูลที่ไม่ปรากฏสัญลักษณ์  หรือไม่มีข้อมูลในระบบ DOH Procurement ผู้ใช้จะต้องระบุข้อมูลเอง



สัญญา/ข้อตกลง/ใบสั่งซื้อ

ประเภทสัญญา (การจัดจ้าง) e-bidding	<input type="checkbox"/> มาตรา 56(1)(๓)	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	สัญญาเลขที่/ใบสั่งซื้อเลขที่ 	วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 5/11/2564	วันที่ลงนาม
วันที่เริ่มต้นสัญญา 	ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 100	วันที่สิ้นสุดสัญญา 	แนบไฟล์สัญญา * (ไฟล์ pdf เท่านั้น) <input type="button" value="เลือกไฟล์"/> <small>ไม่ได้เลือกไฟล์ใด</small>	ลิงค์ไฟล์สัญญา 	วันที่ค.ท.รับวันลงนามสัญญา 	
ชื่อผู้รับจ้าง ไม่ระบุ	<input type="checkbox"/> มาตรา 56(1)(๓)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	เลขทะเบียนนิติบุคคล	วงเงินจ้างตามสัญญา(บาท) 	ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ(บาท) 500.00	
วันที่แจ้งทำสัญญา 	วันที่ผู้รับจ้างมาทำสัญญา 	หมายเหตุ (ก-3)				

ระบบจะกำหนดค่าเริ่มต้นของ

- ประเภทสัญญา
- เลขที่โครงการ
- วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
- รายชื่อผู้รับจ้าง

จากที่ผู้ใช้ระบุไว้ในขั้นตอนก่อนทำสัญญา หากต้องการแก้ไขข้อมูลขั้นต้นจะต้องกลับไปแก้ไขในขั้นตอนการทำสัญญา



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน

รายละเอียดโครงการ
 การพิจารณาแผน
 ก่อนทำสัญญา
 ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน
 งานดำเนินการเอง
 ข้อมูลทางบัญชี
 คณะกรรมการ
 กำหนดแผนดำเนินการโครงการ
 ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย
 รายงานงาน

สัญญา/ข้อตกลง/ใบสั่งซื้อ

ประเภทสัญญา (การจัดจ้าง) มาตรา 56(1)(ข) เลขที่โครงการ เลขที่คู่สัญญา สัญญาเลขที่/ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑ วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ลงนาม ๑

e-bidding ๑/11/2564 ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 100 วันที่สิ้นสุดสัญญา ๑ ๙/2/2565 แนบไฟล์สัญญา * (ไฟล์ pdf เท่านั้น) วันที่ค.ทรพบวันลงนามสัญญา ๑

วันที่เริ่มต้นสัญญา ๑ 01/11/2564 วันที่สิ้นสุดสัญญา ๑ ๙/2/2565 เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

ชื่อผู้รับจ้าง มาตรา 56(1)(ข) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เลขทะเบียนนิติบุคคล วงเงินค่างานตามสัญญา(บาท) ๑ 12,000,000.00 ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ(บาท) 500.00

ไม่ระบุ ๑/11/2564 วันที่ผู้รับจ้างมาทำสัญญา ๑

วันที่แจ้งทำสัญญา ๑ หมายเหตุ (ก-3)

หมายเหตุ - วันที่เริ่มต้นสัญญา กับระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา จะไม่สามารถแก้ไขได้ หากมีการบันทึกข้อมูล ขยาย/ลด สัญญา และ/หรือ ข้อมูล งด/ลด ค่าปรับ

ในขั้นตอนแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง/ใบสั่งซื้อ

- วันที่สิ้นสุดสัญญาจะถูกกำหนดโดยคิดจากวันที่เริ่มต้นสัญญาและระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา
- ในกรณีที่ผู้ใช้มีการบันทึกข้อมูล ขยาย/ลด สัญญา และ/หรือ ข้อมูล งด/ลด ค่าปรับ วันที่เริ่มต้นสัญญา กับระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา จะไม่สามารถแก้ไขได้
- คลิกปุ่ม **บันทึก** เพื่อบันทึกในขั้นตอนข้อมูลสัญญา/ข้อตกลง/ใบสั่งซื้อ

เมื่อผู้ใช้กำหนดวันเริ่มต้นสัญญา,ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาและระบบได้คำนวณวันสิ้นสุดสัญญามาแล้ว ขณะเดียวกันระบบก็จะกำหนดแผนดำเนินโครงการจากขั้นตอนนี้อีกด้วย ดังรูป 3.8



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน

รายละเอียดโครงการ
 การพิจารณาแผน
 ก่อนทำสัญญา
 ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน
 งานดำเนินการเอง
 ข้อมูลทางบัญชี
 คณะกรรมการ
 กำหนดแผนดำเนินงานโครงการ
 ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย
 รายงานงาน

แผนการดำเนินงานและเบิกจ่าย

วงเงินค่างานตามสัญญา 12,000,000.00

	ความก้าวหน้า (%)	การเบิกจ่าย (บาท)
พฤศจิกายน 2564	0.00	0.00
ธันวาคม 2564	0.00	0.00
มกราคม 2565	0.00	0.00
กุมภาพันธ์ 2565	0.00	0.00
รวม	0.00	0.00

ผู้แก้ไขข้อมูลแผนการดำเนินงานและเบิกจ่าย

ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

[แก้ไขแผน](#)

รูปที่ 3.9 ระบบกำหนดแผนดำเนินงานโครงการ ตามวันเริ่มต้นสัญญา, และวันสิ้นสุดสัญญา

เมื่อระบบได้กำหนดแผนดำเนินงานโครงการ และหากผู้ใช้งานต้องการแก้ไข วันที่เริ่มต้นสัญญาหรือ ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานตัดสินใจดังรูป 3.9



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน

แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน	ผลผลิต/โครงการ โครงการช่วยเหลือทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา	กิจกรรม บำรุงรักษาทางหลวง
สำนัก สำนักบริหารบำรุงทาง	รหัสงาน 22200 :: งานเสริมผิวแอสฟัลต์	รหัสงานย่อย -
สำนักงานทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)	แนวทางหลวง พิษณุโลกที่ 1	

The screenshot shows a procurement system interface with a modal dialog box in the center. The dialog box contains a warning icon and the text: "แจ้งเตือน บันทึกข้อมูลสัญญา/ข้อตกลง/ใบสั่งซื้อ" (Warning: Save contract/agreement/order information). Below the text, it says: "มีการเปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา แผนการดำเนินงานและเบิกจ่ายจะถูกสร้างใหม่ คุณต้องการบันทึกข้อมูลหรือไม่?" (There is a change in the start-end date of the contract, the work plan, and the disbursement will be newly created. Do you want to save the information?). There are two buttons: "ยกเลิก" (Cancel) and "ดำเนินการต่อ" (Proceed). The background interface shows various fields for contract details, including contract type, start/end dates, and amounts.

รูปที่ 3.10 ระบบแจ้งเตือนแผนดำเนินงานและเบิกจ่ายถูกสร้างใหม่ เมื่อผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน

รายละเอียดโครงการ

การพิจารณาแผน

ก่อนทำสัญญา

ข้อมูลสัญญา/
การดำเนินงาน

ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงานประกอบไปด้วย

2. ข้อมูลสรุปผลงานจ้างเหมา

แก้ไขสัญญา/ข้อตกลง/ใบสั่งซื้อ

สัญญา/ข้อตกลง/ใบสั่งซื้อ

ประเภทสัญญา (การจัดจ้าง) e-bidding	<input type="checkbox"/> มาตรา 56(1)(ข)	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	สัญญาเลขที่/ใบสั่งซื้อเลขที่	วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 05 พฤศจิกายน 2564	วันที่ลงนาม
วันที่เริ่มต้นสัญญา 01 พฤศจิกายน 2564	วันที่สิ้นสุดสัญญา 09 กุมภาพันธ์ 2565	ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 100	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 5920310201	แนบไฟล์สัญญา ไม่มีไฟล์สัญญา	ลิงค์ไฟล์สัญญา ไม่มีไฟล์	วันที่คด.ทราบวันลงนามสัญญา
ชื่อผู้รับจ้าง บริษัท กรุงธนเอ็นอีเนียร์ จำกัด	<input type="checkbox"/> มาตรา 56(1)(ข)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 5920310201	เลขทะเบียนนิติบุคคล 5920310201	วงเงินค่าจ้างตามสัญญา(บาท) 12,000,000.00	ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ(บาท) 500.00	
วันที่แจ้งทำสัญญา	วันที่ผู้รับจ้างมาทำสัญญา	หมายเหตุ (ก-3)				

สรุปผลงานจ้างเหมา

คำก่อสร้างจริง(บาท) ระบบจะตั้งให้อัตโนมัติ	วันที่สิ้นสุดสัญญา (ปรับ/ลดสัญญา) 9/2/2565	ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่	ตรวจรับงานวันที่	ส่งงานเข้า(วัน)	คิดค่าปรับ(วัน) 5	ค่าปรับผิดสัญญาจ้างรวม(บาท) 2,500.00
---	---	---------------------------	------------------	-----------------	----------------------	---

ขยาย/ลด สัญญา

แก้ไขรายละเอียดการขยาย/ลด สัญญา

ครั้งที่	วันที่สิ้นสุดสัญญาเดิม	ประเภท	จำนวนวัน ขยาย/ลด	วันที่สิ้นสุดสัญญา หลังจากขยาย/ลด	สาเหตุการแก้ไขสัญญา
----------	------------------------	--------	------------------	--------------------------------------	---------------------

ไม่มีข้อมูลขยาย/ลด สัญญา

งค/ลด ค่าปรับ

แก้ไขรายละเอียดการงค/ลด ค่าปรับ

ครั้งที่	จำนวนวัน งค/ลด ค่าปรับ	สาเหตุ งค/ลด ค่าปรับ
----------	------------------------	----------------------

ไม่มีข้อมูลงค/ลด ค่าปรับ



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน

ในขั้นตอนแก้ไขสรุปผลงานจ้างเหมา

1. ระบบจะดึงค่าก่อสร้างมาจาก GF ให้อัตโนมัติ หากมีการระบุวันที่ตรวจรับงานแล้วเท่านั้น
2. วันที่สิ้นสุดสัญญา(ปรับ/ลดสัญญา) เริ่มต้นจะมาจากที่ผู้ใช้ได้ระบุไว้ในข้อมูลสัญญา/ข้อตกลง/ใบสั่งซื้อ หากมีการขยาย/ลด สัญญา ระบบจะเปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดใหม่ไว้ในข้อมูลสรุปผลจ้างเหมา เพื่อนำมาคิดค่าปรับ โดยวันที่สิ้นสุดสัญญาในข้อมูลสัญญา/ข้อตกลง/ใบสั่งซื้อ จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลง
3. การคำนวณค่าปรับจะคำนวณจากค่าปรับผิดสัญญาจ้างที่ผู้ใช้ระบุ

สัญญา/ข้อตกลง/ใบสั่งซื้อ

รายละเอียดโครงการ การพิจารณาแผน ก่อนทำสัญญา ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน

สัญญา/ข้อตกลง/ใบสั่งซื้อ

ประเภทสัญญา (การจัดจ้าง) เลขที่โครงการ เลขที่คู่สัญญา

e-bidding มาตรา 56(1)(ข)

วันที่เริ่มต้นสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา ระยะเวลาดำเนินการ

01 พฤศจิกายน 2564 09 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อผู้รับจ้าง เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เลขทะเบียนนิติบุคคล วงเงินค่างานตามสัญญา(บาท) ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ(บาท)

บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด มาตรา 56(1)(ข) 5920310201 5920310201 12,000,000.00 500.00

วันที่แจ้งทำสัญญา วันที่ผู้รับจ้างมาทำสัญญา หมายเหตุ (n-3)

สรุปผลงานจ้างเหมา

ค่าก่อสร้างจริง(บาท) ระบบจะดึงให้อัตโนมัติ

วันที่สิ้นสุดสัญญา (ปรับ/ลดสัญญา) ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ ตรวจสอบงานวันที่

9/2/2565

ส่งงานเข้า(วัน) คิดค่าปรับ(วัน) ค่าปรับผิดสัญญาจ้างรวม(บาท)

5 2,500.00

บันทึก ยกเลิก

ค่าปรับผิดสัญญาจ้าง(บาท) x คิดค่าปรับ(วัน)

ขยาย/ลด สัญญา

แก้ไขรายละเอียดการขยาย/ลด สัญญา

ครั้งที่	วันที่สิ้นสุดสัญญาเดิม	ประเภท	จำนวนวัน ขยาย/ลด	วันที่สิ้นสุดสัญญาหลังจากขยาย/ลด	สาเหตุการแก้ไขสัญญา
ไม่มีข้อมูลขยาย/ลด สัญญา					

งค/ลด ค่าปรับ

แก้ไขรายละเอียดการงค/ลด ค่าปรับ

ครั้งที่	จำนวนวัน งค/ลด ค่าปรับ	สาเหตุ งค/ลด ค่าปรับ
ไม่มีข้อมูลงค/ลด ค่าปรับ		



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน

- รายละเอียดโครงการ
- การพิจารณาแผน
- ก่อนทำสัญญา
- ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน**
- งานดำเนินการเอง
- ข้อมูลทางบัญชี
- คณะกรรมการ
- กำหนดแผนดำเนินการ
- ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย
- รายงานงาน

สัญญา/ข้อตกลง/ใบสั่งซื้อ

ประเภทสัญญา (การจัดจ้าง) e-bidding	☐ มาตรา 56(1)(ข)	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	สัญญาเลขที่/ใบสั่งซื้อเลขที่	วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 05 พฤศจิกายน 2564	วันที่ลงนาม
วันที่เริ่มต้นสัญญา 01 พฤศจิกายน 2564	วันที่สิ้นสุดสัญญา 09 กุมภาพันธ์ 2565	ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 100	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 5920310201	แนบไฟล์สัญญา ไม่มีไฟล์สัญญา	ลิงค์ไฟล์สัญญา ไม่มีไฟล์	วันที่คด.ทรบวันลงนามสัญญา
ชื่อผู้รับจ้าง บริษัท กรุงธนธนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	☐ มาตรา 56(1)(ข)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 5920310201	เลขทะเบียนนิติบุคคล 5920310201	วงเงินค่างานตามสัญญา(บาท) 12,000,000.00	ค่าปรับผิดสัญญาข้างวันละ(บาท) 500.00	
วันที่แจ้งทำสัญญา						
สรุปผลงานจ้างเหมา						
ค่าก่อสร้างจริง(บาท)						

แก้ไขสัญญา/ข้อตกลง/ใบสั่งซื้อ

แก้ไขสรุปผลงานจ้างเหมา

แก้ไขรายละเอียดการขยาย/ลด สัญญา

แก้ไขรายละเอียดการง/ลด ค่าปรับ

ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงานประกอบไปด้วย

3. ข้อมูลขยาย/ลด สัญญา

ในส่วนนี้เป็นข้อมูลสำหรับการขยายหรือลดระยะเวลาของสัญญา - ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้

ขยาย/ลด สัญญา

ครั้งที่	วันที่สิ้นสุดสัญญาเดิม	ประเภท	จำนวนวัน ขยาย/ลด	วันที่สิ้นสุดสัญญาหลังจากขยาย/ลด	สาเหตุการแก้ไขสัญญา
ไม่มีข้อมูลขยาย/ลด สัญญา					

ง/ลด ค่าปรับ

ครั้งที่	จำนวนวัน ง/ลด ค่าปรับ	สาเหตุ ง/ลด ค่าปรับ
ไม่มีข้อมูลง/ลด ค่าปรับ		



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน

- ในขั้นตอนขยาย/ลด สัญญา
1. คลิก **แก้ไขรายละเอียดการขยาย/ลด สัญญา**
 2. คลิก **เพิ่มขยายลด/สัญญา**
 3. กรอกข้อมูลพื้นฐานในการขยาย/ลดสัญญา
- เมื่อผู้ใช้ระบุจำนวนวัน ขยาย/ลด ระบบจะคำนวณวันที่สิ้นสุดสัญญาหลังขยายลดอัตโนมัติ

ขยาย/ล

1.

สุดสัญญา
ขยาย/ลด

สาเหตุการแก้ไขสัญญา

ไม่มีข้อมูลขยาย/ลด สัญญา

ขยาย/ลด สัญญา

2.

ครั้งที่	วันที่สิ้นสุดสัญญาเดิม	ประเภท	จำนวนวัน ขยาย/ลด	วันที่สิ้นสุดสัญญา หลังจากขยาย/ลด	สาเหตุการแก้ไขสัญญา

แก้ไข ลบ

ไม่มีข้อมูลขยาย/ลด สัญญา

****ในขั้นตอนนี้สามารถแก้ไข/ลบรายการขยาย/ลดสัญญาได้**

ขยาย/ลด สัญญา

3.

ครั้งที่ *	วันที่สิ้นสุดสัญญาเดิม	ประเภท *	จำนวนวัน ขยาย/ลด
<input type="text"/>	9/2/2565	กรุณาเลือก	15
วันที่สิ้นสุดสัญญาหลังขยายลด	สาเหตุการแก้ไขสัญญา *	แนบไฟล์* (ไฟล์ pdf เท่านั้น)	
24/2/2565	<input type="text"/>	เลือกไฟล์ <input type="button" value="ไม่ได้เลือกไฟล์ใด"/>	
		แนบไฟล์	
		<input type="button" value="บันทึก"/>	<input type="button" value="ยกเลิก"/>

ครั้งที่	วันที่สิ้นสุดสัญญาเดิม	ประเภท	จำนวนวัน ขยาย/ลด	วันที่สิ้นสุดสัญญา หลังจากขยาย/ลด	สาเหตุการแก้ไขสัญญา

ไม่มีข้อมูลขยาย/ลด สัญญา

เมื่อมีการขยาย/ลดสัญญา ระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขวันที่เริ่มต้นสัญญา

ดูรายละเอียดหน้าถัดไป >>



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน

- รายละเอียดโครงการ
- การพิจารณาแผน
- ก่อนทำสัญญา
- ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน**
- งานดำเนินการเอง
- ข้อมูลทางบัญชี
- คณะกรรมการ
- กำหนดแผนดำเนินการ
- ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย
- รายงานงาน

สัญญา/ข้อตกลง/ใบสั่งซื้อ

ประเภทสัญญา (การจัดจ้าง) e-bidding	<input type="checkbox"/> มาตรา 56(1)(ข)	เลขที่โครงการ	เลขที่คุมสัญญา	สัญญาเลขที่/ใบสั่งซื้อเลขที่	วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 05 พฤศจิกายน 2564	วันที่ลงนาม
วันที่เริ่มต้นสัญญา 01 พฤศจิกายน 2564	วันที่สิ้นสุดสัญญา 09 กุมภาพันธ์ 2565		ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 100	แนบไฟล์สัญญา ไม่มีไฟล์สัญญา	ลิงค์ไฟล์สัญญา ไม่มีไฟล์	วันที่คด.ทราบวันลงนามสัญญา
ชื่อผู้รับจ้าง บริษัท กรุงธรมเออนิเยร์ จำกัด	<input type="checkbox"/> มาตรา 56(1)(ข)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 5920310201	เลขทะเบียนนิติบุคคล 5920310201	วงเงินค่างานตามสัญญา(บาท) 12,000,000.00	ค่าปรับผิดสัญญาข้างวันละ(บาท) 500.00	
วันที่แจ้งทำสัญญา						
สรุปผลงานจ้างเหมา						แก้ไขสรุปผลงานจ้างเหมา
ค่าก่อสร้างจริง(บาท)						สัญญาจ้างรวม(บาท) 2,500.00
ขยาย/ลด สัญญา						แก้ไขรายละเอียดการขยาย/ลด สัญญา

ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงานประกอบไปด้วย

4. ข้อมูลง/ลด ค่าปรับ

ในส่วนนี้เป็นข้อมูลสำหรับง/ลด ค่าปรับของสัญญา - ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้

ง/ลด ค่าปรับ

ครั้งที่	วันที่สิ้นสุดสัญญาเดิม	ประเภท	จำนวนวัน ขยาย/ลด	วันที่สิ้นสุดสัญญาหลังจากขยาย/ลด	สาเหตุการแก้ไขสัญญา
----------	------------------------	--------	------------------	----------------------------------	---------------------

ไม่มีข้อมูลขยาย/ลด สัญญา

ครั้งที่	จำนวนวัน ง/ลด ค่าปรับ	สาเหตุ ง/ลด ค่าปรับ
----------	-----------------------	---------------------

ไม่มีข้อมูลง/ลด ค่าปรับ



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน

- ในขั้นตอนงด/ลด ค่าปรับ
1. คลิก **แก้ไขรายละเอียดการงด/ลด ค่าปรับ**
 2. คลิก **เพิ่มงด/ลด ค่าปรับ**
 3. กรอกข้อมูลพื้นฐานในการงด/ลด ค่าปรับ

งด/ลด ค่าปรับ

ครั้งที่	จำนวนวัน งด/ลด ค่าปรับ	สาเหตุ งด/ลด ค่าปรับ	<input checked="" type="checkbox"/> แก้ไขรายละเอียดการงด/ลด ค่าปรับ

ไม่มีข้อมูลงด/ลด ค่าปรับ

งด/ลด ค่าปรับ

ครั้งที่	จำนวนวัน งด/ลด ค่าปรับ	สาเหตุ งด/ลด ค่าปรับ	<input type="checkbox"/> เพิ่มงด/ลด ค่าปรับ	ยกเลิก

ไม่มีข้อมูลงด/ลด ค่าปรับ

****ในขั้นตอนนี้สามารถแก้ไข/ลบรายการงด/ลดค่าปรับสัญญาได้**

แก้ไข ลบ

งด/ลด ค่าปรับ

3.

ครั้งที่ *	จำนวนวัน งด/ลดค่าปรับ	สาเหตุการแก้ไขสัญญา *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

แนบไฟล์* (ไฟล์ pdf เท่านั้น)

ครั้งที่	จำนวนวัน งด/ลด ค่าปรับ	สาเหตุ งด/ลด ค่าปรับ	<input type="checkbox"/> เพิ่มงด/ลด ค่าปรับ	ยกเลิก

ไม่มีข้อมูลงด/ลด ค่าปรับ



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

- **ข้อมูลงานดำเนินการเอง**

- แผนงานหรือโครงการที่จะต้องบันทึกข้อมูลงานดำเนินการเอง คือ
แผนงานที่มีรูปแบบการดำเนินงาน
 1. งานดำเนินการเอง
 2. งานจ้างเหมาและดำเนินการเอง
- แผนงานที่มีรูปแบบการดำเนินงาน เป็น “งานจ้างเหมา” ไม่ต้องบันทึกข้อมูลดำเนินการเอง
- สามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลงานดำเนินการเอง

รายละเอียด

งานทาง

ปีงบประมาณ 2565	ID Code 650356	รหัสงบประมาณ 0800629002410254	บัญชีงบประมาณ สร. - บัญชี พ.ร.บ. (งานทาง)	วงเงินตาม พ.ร.บ./พ.ร.ก. 9,000,000	วงเงินตามแผนรายประมาณการ 9,000,000
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขัน		ผลิตภัณฑ์/โครงการ โครงการช่วยเหลือทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา		กิจกรรม บำรุงรักษาทางหลวง	
สำนัก สำนักบริหารบำรุงทาง		รหัสงาน 24100 :: งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์		รหัสงานย่อย -	
สำนักงานทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)		แขวงทางหลวง พิษณุโลกที่ 1			

รายละเอียดโครงการ
 การพิจารณาแผน
 ก่อนทำสัญญา
 ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน
 งานดำเนินการเอง
 ข้อมูลทางบัญชี
 คณะกรรมการ
 กำหนดแผนดำเนินการ
 ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย
 รายการงาน

ไม่แสดงข้อมูล งานดำเนินการเอง สำหรับงานจ้างเหมา

รูปที่3.11 ระบบไม่แสดงข้อมูลงานดำเนินการเอง สำหรับแผนรายประมาณการที่อยู่ในรูปแบบการดำเนินงานเป็น “งานจ้างเหมา”



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลงานดำเนินการเอง

งานอาคาร	
ปีงบประมาณ	ID Code
2565	65205947
แผนงาน	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน	
รหัสงาน	
20500 :: อาคารสถานที่	
สำนักงานแหล่งวง	
สำนักงานแหล่งวงที่ 14 (ชลบุรี)	

ข้อมูลงานดำเนินการเองประกอบไปด้วย

1. ข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการเอง

วันที่สิ้นสุดดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง หมายถึง วันที่เสร็จสิ้นแผนงานดังกล่าว หากมีการระบุวันที่ในส่วนนี้ จะหมายถึง แผนงานดังกล่าว ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

รหัสงานย่อย	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ
20540 :: ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-
แขวงทางหลวง	หมวดทางหลวง
ชลบุรีที่ 1	

- รายละเอียดโครงการ
- การพิจารณาแผน
- ก่อนทำสัญญา
- ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน
- งานดำเนินการเอง**
- ข้อมูลทางบัญชี
- คณะกรรมการ
- กำหนดแผนดำเนินงานโครงการ
- ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย

รายละเอียดการดำเนินการเอง

งบประมาณดำเนินการเอง(บาท)	วันที่เริ่มดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ(วัน)	วันที่สิ้นสุดดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดดำเนินการ(ที่เกิดขึ้นจริง)
700,000.00	01 พฤศจิกายน 2564	60	31 ธันวาคม 2564	

1. แก้ไขรายละเอียดการดำเนินการเอง

รายละเอียดการดำเนินการเอง

งบประมาณดำเนินการเอง(บาท)	วันที่เริ่มดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ(วัน)	วันที่สิ้นสุดดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดดำเนินการ(ที่เกิดขึ้นจริง)
2. 700,000.00	01/11/2564	60	31/12/2564	

บันทึก ยกเลิก

ในขั้นตอนแก้ไขรายละเอียดการดำเนินการเอง

1. คลิก **แก้ไขรายละเอียดการดำเนินการเอง**
2. ระบุข้อมูลพื้นฐานสำหรับรายละเอียดการดำเนินการเอง



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลงานดำเนินการเอง

ข้อมูลงานดำเนินการเองประกอบไปด้วย
2. ข้อมูลใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
ในส่วนนี้คือข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง - ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

วันที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	คำอธิบาย	ยอดเงิน	ไฟล์แนบ
ไม่มีข้อมูลใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง					

1. [แก้ไขใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง](#)

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

วันที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	คำอธิบาย	ยอดเงิน	ไฟล์แนบ
ไม่มีข้อมูลใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง					

2. [เพิ่มรายการงานดำเนินการเอง](#) ยกเลิก

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

วันที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	คำอธิบาย	ยอดเงิน	ไฟล์แนบ
3.	ใบสั่งซื้อ				เพิ่มรายการงานดำเนินการเอง ยกเลิก ไฟล์แนบ* (ไฟล์ pdf เท่านั้น) <input type="button" value="เลือกไฟล์"/> <input type="button" value="ไม่ได้เลือกไฟล์ใด"/>

บันทึก ยกเลิก

วันที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	คำอธิบาย	ยอดเงิน	ไฟล์แนบ
ไม่มีข้อมูลใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง					

ในขั้นตอนเพิ่ม/แก้ไข ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

1. คลิก **แก้ไขใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง**
2. คลิก **เพิ่มรายการงานดำเนินการเอง**
3. ระบุข้อมูลพื้นฐานของข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

- ข้อมูลทางบัญชี

- ข้อมูลทางบัญชีเป็นการแสดงการเบิกจ่ายจากระบบ GF



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลทางบัญชี

งานอาคาร	
ปีงบประมาณ	ID Code
2565	65205947
แผนงาน	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	
รหัสงาน	
20500 :: อาคารสถานที่	
สำนักงานทางหลวง	
สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)	

ข้อมูลทางบัญชีประกอบไปด้วย

1. ข้อมูลทางการบัญชี
ในส่วนนี้ระบบจะแสดงชื่อรายการตามพรบ.
2. ข้อมูลรายการขออนุมัติเงินงวด
ในส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดของรายการที่ทางส่วนกลางได้ขออนุมัติเงินงวด

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	หมวดทางหลวง
สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)	ชลบุรีที่ 1	

รายละเอียดโครงการ การพิจารณาแผน ก่อนทำสัญญา ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน งานดำเนินการเอง **ข้อมูลทางบัญชี** คณะกรรมการ กำหนดแผนดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย

ข้อมูลทางการบัญชี

ชื่อรายการตาม พรบ.
ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ.ชลบุรี 1 แห่ง

เป็นแผนงานที่ใช้รหัสงบประมาณร่วมกับแผนงานอื่น

รายการขออนุมัติเงินงวด

เลขที่หนังสือ	วันที่ขออนุมัติเงินงวด	คำขอจากระบบ PlanNet
สร.1/4648	06 ตุลาคม 2564	<input checked="" type="checkbox"/>

หาก “เป็นแผนงานที่ใช้รหัสงบประมาณร่วมกับแผนงานอื่น” หมายถึง ระบบ plannet ไม่สามารถดึงข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GF ได้ ผู้ใช้จะต้องป้อนข้อมูลการเบิกจ่ายเอง เช่น แผนงาน งบฉุกเฉิน



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลทางบัญชี

ข้อมูลทางบัญชีประกอบไปด้วย

3. ข้อมูลการจัดสรร (ในGF)

ในส่วนนี้คือรายละเอียดการจัดสรรเงินจากระบบ GF หากเป็นการจัดสรรโดยที่ไม่มี การขออนุมัติเงินจากระบบ plannet ผู้ใช้จะต้องทำการผูกข้อมูลกับระบบ gf

—การจัดสรรงบ (ในGF)

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	-/+	ยอดเงิน
10065/2565/4	18 ตุลาคม 2564	+	700,000.00

1.

—การจัดสรรงบ (ในGF)

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	ยอดเงิน(ดึงจากระบบ GFMS)	4. ยอดเงิน
10065/2565/4	18 ต.ค. 2564	700,000.00	<input type="text"/>

2.

3.

ในขั้นตอนการผูกข้อมูลกับระบบ gf

1. คลิก **แก้ไข**
2. คลิก **เลือก** เพื่อเลือกใบ GF ที่ยังไม่ได้มีการผูกกับแผนงาน
3. กรอกข้อมูลพื้นฐานในการเพิ่มจัดสรรยอดเงิน
4. ทำการคลิก **เพิ่ม** เพื่อเพิ่มรายการจัดสรร

เลือกใบ GF

เลขที่ GF


เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	ยอดเงิน
ไม่มีข้อมูล		



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน


• ข้อมูลทางบัญชี

ในขั้นตอนการแก้ไขรายการจัดสรรงบ (ใบGF)

1. คลิกแก้ไข
2. คลิก  เพื่อเลือกรายการที่ต้องการแก้ไข
3. ระบุยอดเงินที่ต้องการแก้ไข โดยระบบจะไม่อนุญาตให้แก้ไขเลขที่ GF , วันที่อนุมัติเงินงวด , ยอดเงินที่ดึงจากระบบ GF ได้
4. ทำการคลิก แก้ไข เพื่อแก้ไขรายการจัดสรรงบ

การจัดสรรงบ (ใบGF)


เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	-/+	ยอดเงิน
10065/2565/4	18 ตุลาคม 2564	+	700,000.00

1. 

การจัดสรรงบ (ใบGF)

เลขที่ GF วันที่อนุมัติเงินงวด ยอดเงิน(ดึงจากระบบ GFMS) ยอดเงิน

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	-/+	ยอดเงิน
10065/2565/4	18 ต.ค. 2564	+	700,000.00

2. 

การจัดสรรงบ (ใบGF)

เลขที่ GF วันที่อนุมัติเงินงวด ยอดเงิน(ดึงจากระบบ GFMS) ยอดเงิน

เลขที่ GF	วันที่อนุมัติเงินงวด	-/+	ยอดเงิน
10065/2565/4	18 ต.ค. 2564	+	700,000.00

3.

4.

กฎการระบุยอดเงิน

ในขั้นตอนการลบรายการจัดสรรงบ (ใบGF)

1. คลิก **แก้ไข**
2. คลิก  เพื่อลบรายการที่ต้องการ



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลทางบัญชี

ข้อมูลทางบัญชีประกอบไปด้วย

4. ข้อมูลสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ
 ในส่วนนี้คือรายละเอียดของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยระบบจะแสดงข้อมูลเป็นรูปแบบยอดสะสม และดึงข้อมูลมาจากระบบ GF

5. ข้อมูลสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกัน
 ในส่วนนี้คือรายละเอียดของการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกัน โดยระบบจะแสดงข้อมูลเป็นรูปแบบยอดสะสม และดึงข้อมูลมาจากระบบ GF

เงินงวดล่าสุด :: 18 ตุลาคม 2564

—สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ

รหัสงบประมาณ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญาและเบิกจ่าย					คงเหลือ	
		ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	รวม (บาท)	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	
0800629001410007	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00

ข้อมูล ณ วันที่ :: 4 พฤศจิกายน 2564 11:41 น.

—สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกัน)

รหัสงบประมาณ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญาและเบิกจ่าย					คงเหลือ	
		ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	รวม (บาท)	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	

ไม่มีข้อมูลการเบิกจ่าย(เงินกัน)



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลทางบัญชี

ข้อมูลทางบัญชีประกอบไปด้วย

6. ข้อมูลการเบิกงวดสุดท้าย

ในส่วนนี้คือเมื่อผู้ใช้ทำการเบิกจ่ายงบประมาณงวดสุดท้ายแล้วผู้ใช้งานจะต้องมารอรายละเอียดที่หัวข้อนี้ ผู้ใช้สามารถแก้ไขการเบิกจ่ายงวดสุดท้ายได้ และทำให้สถานะของแผนนี้หมายถึง “เบิกจ่ายแล้วเสร็จ”

การเบิกเงินงวดสุดท้าย

เบิกเงินงวดสุดท้าย

วันที่เบิกเงินงวดสุดท้าย

ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

1. แก้ไขการเบิกเงินงวดสุดท้าย

2. การเบิกเงินงวดสุดท้าย

เบิกเงินงวดสุดท้าย

วันที่เบิกเงินงวดสุดท้าย

ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

3.

- ในขั้นตอนการแก้ไขการเบิกในงวดสุดท้าย
1. คลิก **แก้ไขการเบิกในงวดสุดท้าย**
 2. ระบุข้อมูลพื้นฐานในการเบิกงวดสุดท้าย
 3. คลิก **บันทึก**



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลคณะกรรมการ

- ข้อมูลคณะกรรมการ หมายถึง การบันทึกข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการตามประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง
- แผนงานหรือโครงการที่จะต้องบันทึกข้อมูลคณะกรรมการ คือ
แผนงานที่มีรูปแบบการดำเนินงาน
 1. งานจ้างเหมา
 2. งานจ้างเหมาและดำเนินการเอง
- แผนงานที่มีรูปแบบการดำเนินงาน เป็น “งานดำเนินการเอง” ไม่ต้องบันทึกข้อมูลสัญญา/ข้อมูลการดำเนินงาน
- สามารถบันทึกคณะกรรมการได้ 2 วิธี
 - นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ xls,xlsx เท่านั้น
 - ระบุข้อมูลด้วยตัวเอง
- สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบได้



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลคณะกรรมการ

งานอาคาร		รหัสงบประมาณ	บัญชีงบประมาณ	วงเงินตาม พ.ร.บ./พ.ร.ก.	วงเงินตามแผนรายประมาณการ
ปีงบประมาณ	ID Code				
2565	65205947	0800629001410007	สร. - บัญชี พ.ร.บ. (งานอาคาร)	700,000	700,000
แผนงาน		ผลผลิต/โครงการ		กิจกรรม	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา		อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง	
รหัสงาน		รหัสงานย่อย		หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ	
20500 :: อาคารสถานที่		20540 :: ค่าปรับปรุงอาคารที่พิทักษ์และสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	
สำนักงานทางหลวง		แขวงทางหลวง		หมวดทางหลวง	
สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)		ชลบุรีที่ 1			

รายละเอียดโครงการ

การพิจารณาแผน

ก่อนทำสัญญา

ข้อมูลสัญญา/
การดำเนินงาน

งานดำเนินการเอง

ข้อมูลทางบัญชี

คณะกรรมการ

กำหนดแผนดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย

ไม่แสดงข้อมูล คณะกรรมการ สำหรับงานดำเนินการเอง

รูปที่3.12 ระบบไม่แสดงข้อมูลงานดำเนินการเอง สำหรับแผนรายประมาณการที่อยู่ในรูปแบบการดำเนินงานเป็น “งานดำเนินการเอง”



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลคณะกรรมการ

วิธีที่1 นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ xls,xlsx

1. คลิกปุ่ม **นำเข้าข้อมูล คณะกรรมการ**

รายละเอียดโครงการ
 การพิจารณาแผน
 ก่อนทำสัญญา
 ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน
 งานดำเนินการเอง
 ข้อมูลทางบัญชี
 คณะกรรมการ
 กำหนดแผนดำเนินงานโครงการ
 ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย
 รายงานงาน

คณะกรรมการ

คณะกรรมการTOR

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	กรรมการ
			ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการ TOR

คณะกรรมการราคากลาง

ตามคำสั่งเลขที่	ลงวันที่	ราคากลาง	ประเมินครั้งที่
		0.00	

1 นำเข้าข้อมูล คณะกรรมการ เพิ่มเดิม/แก้ไข คณะกรรมการ

แก้ไขคำสั่ง

ลำดับ

ประเภทกรรมการ *

2. กรุณาเลือก

กรรมการ* (ไฟล์ xls,xlsx เท่านั้น)

3. ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

- 2. เลือก **ประเภทคณะกรรมการ**
- 3. คลิก **เลือกไฟล์** เพื่อแนบไฟล์กรรมการชนิดของไฟล์ต้องเป็น xls,xlsx เท่านั้น
- 4. คลิก**นำเข้าข้อมูล** เพื่อเพิ่มข้อมูลคณะกรรมการ

ผู้ใช้สามารถคลิก ตัวอย่างไฟล์ข้อมูลกรรมการ เพื่อดูไฟล์ตัวอย่างก่อนตัดสินใจแนบไฟล์



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลคณะกรรมการ

วิธีที่2 กรอกข้อมูลเพื่อเพิ่มข้อมูลกรรมการ
1. คลิกปุ่ม **เพิ่มเติม/แก้ไข/คณะกรรมการ**

คณะกรรมการ

คณะกรรมการTOR

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ
ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการ TOR			

2. คลิกปุ่ม **เพิ่มรายการเพื่อเพิ่ม**

คณะกรรมการ

คณะกรรมการTOR

เพิ่มคณะกรรมการ

3. ประเภทกรรมการ *

กรุณาเลือก

ลำดับ *

ชื่อ-สกุล *

ตำแหน่ง

กรรมการ *

กรุณาเลือก

4.

3. ทำการระบุข้อมูลพื้นฐานในการเพิ่มคณะกรรมการ
4. คลิก **บันทึก** เพื่อบันทึกข้อมูลคณะกรรมการ



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลคณะกรรมการ

- รายละเอียดโครงการ
- การพิจารณาแผน
- ก่อนทำสัญญา
- ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน
- งานดำเนินการเอง
- ข้อมูลทางบัญชี
- คณะกรรมการ
- กำหนดแผนดำเนินโครงการ
- ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย
- รายการงาน

เมื่อเพิ่มคณะกรรมการเสร็จสิ้น รายการที่เพิ่มก็จะแสดงตามประเภทที่เพิ่มคณะกรรมการ

เพิ่มกรรมการ ย้อนกลับ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ
1	นาย A	ประธานTOR	ประธาน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ	ชื่อ-สกุล

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

ลำดับ	ชื่อ-สกุล

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล

ผู้ควบคุมงาน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล

แก้ไขคณะกรรมการ

ประเภทกรรมการ *

คณะกรรมการTOR

ลำดับ *

1

ชื่อ-สกุล *

นาย A

ตำแหน่ง

ประธานTOR

กรรมการ *

ประธาน

บันทึก ยกเลิก

ผู้ใช้สามารถเลือกแก้ไขหรือลบรายการคณะกรรมการได้

- เลือก หากต้องการแก้ไขข้อมูล
- เลือก หากต้องการลบข้อมูล

รูปที่3.13 หน้าจอแก้ไขคณะกรรมการ



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลกำหนดแผนดำเนินงานโครงการ

- ข้อมูลกำหนดแผนดำเนินงานโครงการเป็นข้อมูลที่เกิดจากผู้ใช้ได้กำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของแผนงานหรือโครงการ
- มีไว้เพื่อให้ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดดำเนินการของแผนงานหรือโครงการ
- แผนงานหรือโครงการที่จะต้องบันทึก ข้อมูลกำหนดดำเนินงานโครงการ คือแผนงานที่มีรูปแบบการดำเนินงาน
 - งานจ้างเหมา ที่มีการกำหนดวันที่เริ่มต้นสัญญาแล้ว
 - งานดำเนินการเอง ที่มีการกำหนดวันที่เริ่มต้นดำเนินงานแล้ว
 - งานจ้างเหมาและดำเนินการ ที่มีการกำหนดวันที่เริ่มต้นสัญญาหรือกำหนดวันที่เริ่มต้นดำเนินงานแล้ว อย่างไรก็ตามอย่างหนึ่ง



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลกำหนดดำเนินโครงการ

รายละเอียด

งานทาง

ปีงบประมาณ 2565	ID Code 650356	รหัสงบประมาณ 0800629002410254	บัญชีงบประมาณ สร. - บัญชี พ.ร.บ. (งานทาง)	วงเงินตาม พ.ร.บ./พ.ร.ก. 9,000,000	วงเงินตามแผนรายประมาณการ 9,000,000
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน		ผลผลิต/โครงการ โครงการช่วยเหลือวงได้รับการศึกษา		กิจกรรม บำรุงรักษาทางหลวง	
สำนัก สำนักบริหารบำรุงทาง		รหัสงาน 24100 :: งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์		รหัสงานย่อย -	
สำนักงานทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)		แขวงทางหลวง พิษณุโลกที่ 1			



แผนการดำเนินงานและเบิกจ่าย

ไม่สามารถแสดงข้อมูลแผนดำเนินงานได้เนื่องจาก ยังไม่มีวันที่เริ่มต้นสัญญา (กรณีงานจ้างเหมา) หรือยังไม่ได้กำหนดวันที่เริ่มต้นดำเนินงาน(สำหรับงานดำเนินการเอง)

รูปที่ 3.14 ระบบไม่แสดงข้อมูลกำหนดแผนดำเนินโครงการ

สำหรับแผนรายประมาณการที่อยู่ในรูปแบบการดำเนินงานเป็น “งานจ้างเหมาที่ยังไม่กำหนดวันที่เริ่มต้นสัญญา ”

หรือ สำหรับแผนรายประมาณการที่อยู่ในรูปแบบการดำเนินงานเป็น “งานดำเนินการเองที่ยังไม่กำหนดวันที่เริ่มต้นดำเนินงาน ”

หรือ สำหรับแผนรายประมาณการที่อยู่ในรูปแบบการดำเนินงานเป็น “งานจ้างเหมาดำเนินการเองที่ยังไม่กำหนดวันที่เริ่มต้นสัญญาหรือวันที่เริ่มต้นดำเนินงาน
อย่างใดอย่างหนึ่ง”



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลกำหนดดำเนินโครงการ

รายละเอียด

งานทาง

ปีงบประมาณ	ID Code
2565	650144

แผนงาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในกา

สำนัก
สำนักบริหารบำรุงทาง

สำนักงานทางหลวง
สำนักงานหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

ข้อมูลกำหนดดำเนินโครงการจะประกอบด้วย

1. ข้อมูลแผนการดำเนินงานและเบิกจ่าย

ในส่วนนี้ระบบจะกำหนดข้อมูลเริ่มต้นตามวันเริ่มต้นสัญญาหรือวันที่เริ่มต้นดำเนินงานจนถึงวันที่สิ้นสุดสัญญาหรือวันที่สิ้นสุดดำเนินงานตามที่ผู้ใช้ระบุในหัวข้อข้อมูลสัญญา - ผู้ใช้สามารถแก้ไขแผนได้

รหัสงาน	รหัสงานย่อย
22200 :: งานเสริมผิวแอสฟัลต์	-
แขวงทางหลวง	
พิษณุโลกที่ 1	

- รายละเอียดโครงการ
- การพิจารณาแผน
- ก่อนทำสัญญา
- ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน
- งานดำเนินการเอง
- ข้อมูลทางบัญชี
- คณะกรรมการ
- กำหนดแผนดำเนินโครงการ
- ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย
- รายการงาน

แผนการดำเนินงานและเบิกจ่าย

วงเงินจ้างตามสัญญา(บาท)	งบประมาณดำเนินการเอง(บาท)	รวมงบประมาณ(บาท)
12,000,000.00	0	12,000,000.00
ความก้าวหน้า (%)		การเบิกจ่าย (บาท)
พฤศจิกายน 2564	0.00	0.00
ธันวาคม 2564	0.00	0.00
มกราคม 2565	0.00	0.00
กุมภาพันธ์ 2565	0.00	0.00
รวม	0.00	0.00

แก้ไขแผน




1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลกำหนดแผนดำเนินงานโครงการ

ในขั้นตอนการแก้ไขแผน

1. คลิก **แก้ไขแผน**
2. ระบุข้อมูล %ความก้าวหน้า และยอดเบิกจ่าย ในเดือนที่ต้องการ
ยอดเงินต้องไม่เกินวงเงินค่างานตามสัญญา(บาท)
3. คลิก **บันทึก**



แผนการดำเนินงานและเบิกจ่าย

2.

วงเงินค่างานตามสัญญา(บาท)	งบประมาณดำเนินการเอง(บาท)	รวมงบประมาณ(บาท)
12,000,000.00	0	12,000,000.00
ความก้าวหน้า (%)		การเบิกจ่าย (บาท)
พฤศจิกายน 2564	0.00	0.00
ธันวาคม 2564	0.00	0.00
มกราคม 2565	0.00	0.00
กุมภาพันธ์ 2565	0.00	0.00
รวม	0.00	0.00

สามารถเพิ่ม/ลบเดือนที่ต้องการ แต่ไม่สามารถลบเดือนที่อยู่ระหว่างวันที่เริ่มต้นสัญญา - วันสิ้นสุดสัญญา

3.



ข้อมูลกำหนดดำเนินโครงการจะประกอบด้วย

2. ข้อมูลผู้แก้ไขข้อมูลแผนการดำเนินงานและเบิกจ่าย
ในส่วนนี้ระบบจะกำหนดข้อมูลเมื่อมีการแก้ไขแผนล่าสุด

ผู้แก้ไขข้อมูลแผนการดำเนินงานและเบิกจ่าย



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลผลการดำเนินงาน / เบิกจ่าย

- ข้อมูลผลการดำเนินงาน / เบิกจ่าย เป็นข้อมูลที่เกิดจากผู้ใช้ได้กำหนดแผน
- มีไว้เพื่อให้ผู้ใช้รายงานความก้าวหน้าของแผนงานหรือโครงการ
- แผนงานหรือโครงการที่จะต้องบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงาน / เบิกจ่าย คือ
แผนงานที่มีรูปแบบการดำเนินงาน
 - งานจ้างเหมา ที่มีการกำหนดวันที่เริ่มต้นสัญญาแล้ว
 - งานดำเนินการเอง ที่มีการกำหนดวันที่เริ่มต้นดำเนินงานแล้ว
 - งานจ้างเหมาและดำเนินการ ที่มีการกำหนดวันที่เริ่มต้นสัญญาหรือกำหนดวันที่เริ่มต้นดำเนินงานแล้ว อย่างไม่อย่างหนึ่ง



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลผลการดำเนินงาน / เบิกจ่าย

รายละเอียด

งานทาง					
ปีงบประมาณ	ID Code	รหัสงบประมาณ	บัญชีงบประมาณ	วงเงินตาม พ.ร.บ./พ.ร.ก.	วงเงินตามแผนรายประมาณการ
2565	650356	0800629002410254	สร. - บัญชี พ.ร.บ. (งานทาง)	9,000,000	9,000,000
แผนงาน		ผลผลิต/โครงการ		กิจกรรม	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน		โครงการทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา		บำรุงรักษาทางหลวง	
สำนัก		รหัสงาน		รหัสงานย่อย	
สำนักบริหารทางหลวง		24100 :: งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์		-	
สำนักงานทางหลวง		แขวงทางหลวง			
สำนักงานหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)		พิษณุโลกที่ 1			



ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย

ไม่สามารถแสดงข้อมูลแผนดำเนินงานโครงการได้เนื่องจาก ยังไม่มีวันที่เริ่มต้นสัญญา (กรณีงานจ้างเหมา) หรือยังไม่ได้กำหนดวันที่เริ่มต้นดำเนินงาน(สำหรับงานดำเนินการเอง)

รูปที่ 3.15 ระบบไม่แสดงข้อมูลผลการดำเนินงาน / เบิกจ่าย

สำหรับแผนรายประมาณการที่อยู่ในรูปแบบการดำเนินงานเป็น “งานจ้างเหมาที่ยังไม่กำหนดวันที่เริ่มต้นสัญญา ”
 หรือ สำหรับแผนรายประมาณการที่อยู่ในรูปแบบการดำเนินงานเป็น “งานดำเนินการเองที่ยังไม่กำหนดวันที่เริ่มต้นดำเนินงาน ”
 หรือ สำหรับแผนรายประมาณการที่อยู่ในรูปแบบการดำเนินงานเป็น “งานจ้างเหมาดำเนินการเองที่ยังไม่กำหนดวันที่เริ่มต้นสัญญาหรือวันที่เริ่มต้นดำเนินงาน
 ใดๆอย่างหนึ่ง”



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลผลการดำเนินงาน / เบิกจ่าย

งานทาง _____

ปีงบประมาณ 2565 ID Code 650144

แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขัน

สำนัก สำนักบริหารบำรุงทาง 22200 :: งานเสริมผิวแอสฟัลต์

สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง พิษณุโลกที่ 1

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

ข้อมูลผลการดำเนินงาน / เบิกจ่ายจะประกอบด้วย

1. ข้อมูลผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย

ในส่วนนี้ระบบจะกำหนดข้อมูลเริ่มต้นตามที่ได้กำหนดแผน -ผู้ใช้สามารถรายงานความก้าวหน้าได้

- รายละเอียดโครงการ
- การพิจารณาแผน
- ก่อนทำสัญญา
- ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน
- งานดำเนินการเอง
- ข้อมูลทางบัญชี
- คณะกรรมการ
- กำหนดแผนดำเนินโครงการ
- ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย
- รายงานงาน

ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย

รายงานความก้าวหน้า

		2564		2565		รวม
		พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	
ความก้าวหน้า (%)	แผน 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	สะสม 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	สะสม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
การเบิกจ่าย (บาท)	แผน 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	สะสม 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	สะสม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ปัญหา						

-ผู้แก้ไขข้อมูลผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย

ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลผลการดำเนินงาน / เบิกจ่าย

ในขั้นตอนรายงานความก้าวหน้า

1. คลิก **รายงานความก้าวหน้า**
2. ระบุข้อมูล %แผนความก้าวหน้า, %ดำเนินการจริง และ ปัญหา/อุปสรรคในเดือนที่ต้องการ
3. คลิก **บันทึก**



1. รายงานความก้าวหน้า

		2564		2565		รวม
		พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	
ความก้าวหน้า (%)	แผน 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	สะสม 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
การเบิกจ่าย (บาท)	แผน 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	สะสม 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ปัญหา	สะสม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.

ยอดเงินการเบิกจ่ายมาจากแผนดำเนินโครงการที่ผู้ใช้ได้ระบุยอดเงินการเบิกจ่ายไป

หมายเหตุ (ก-2,ก-3)
0

3. **บันทึก** ยกเลิก

สามารถเพิ่ม/ลบเดือนที่ต้องการ แต่ไม่สามารถลบเดือนที่อยู่ระหว่างวันที่เริ่มต้นสัญญา - วันสิ้นสุดสัญญา

หากเป็นแผนงานที่ไม่ได้ใช้รหัสงบประมาณร่วมกับแผนงานอื่น ระบบ plannet จะสามารถดึงข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GF ได้โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องป้อนข้อมูลการเบิกจ่ายเอง แต่หากเป็นแผนงานที่ใช้รหัสงบประมาณร่วมกับแผนงานอื่น ผู้ใช้จะต้องป้อนข้อมูลการเบิกจ่ายเอง



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลผลการดำเนินงาน / เบิกจ่าย

ข้อมูลผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย จะประกอบด้วย

2. ข้อมูลไฟล์แนบ รูปการดำเนินงาน
ผู้ใช้สามารถแนบ/ลบ รูปการดำเนินงานได้

- ในขั้นตอนการแนบรูปดำเนินงาน
1. คลิก **แนบรูปการดำเนินงาน**
 2. คลิก **select file** เพื่อเลือกรูปที่ต้องการแนบ
 3. คลิก **เรียกดู** เพื่อเรียกดูรูปภาพ
 4. คลิก **ลบ** เพื่อลบรูปภาพ
 5. คลิก **บันทึก** เพื่อบันทึกรูปภาพที่แนบ


ไฟล์แนบ รูปการดำเนินงาน

1. แนบ รูปการดำเนินงาน

2. **แนบ รูปการดำเนินงาน**

Select File Please select file(s) to upload.

ไฟล์รูปภาพ	เรียกดู	ลบ
ไม่มีข้อมูลไฟล์รูปภาพ		

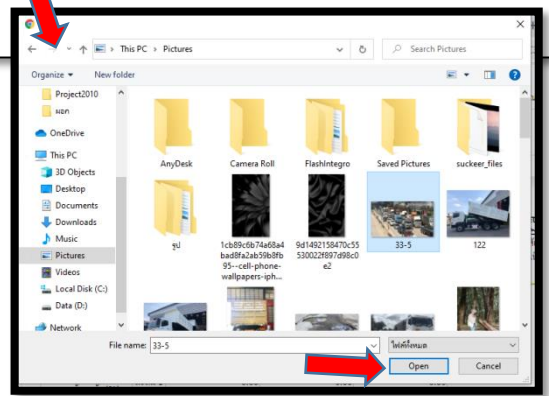

5. **บันทึก** ยกเลิก ในขั้นตอนนี้จำเป็นต้องแนบรูปอย่างน้อย 1 รูปภาพ

ไฟล์แนบ รูปการดำเนินงาน

Select File 1 file(s) in queue.

33-5.jpg (image/jpeg) - 70.26 kb Remove

Upload



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

- **ข้อมูลผลการดำเนินงาน / เบิกจ่าย**

ข้อมูลผลการดำเนินงาน / เบิกจ่ายจะประกอบด้วย

3. ข้อมูลผู้แก้ไขข้อมูลผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย
ในส่วนนี้ระบบจะกำหนดข้อมูลเมื่อมีการรายงานความก้าวหน้าล่าสุด

—ผู้แก้ไขข้อมูลแผนการดำเนินงานและเบิกจ่าย

ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
แขวง สงขลา

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด
16 ธันวาคม 2564 06:37



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

- **ข้อมูลรายงาน**

- แผนงานหรือโครงการที่จะต้องบันทึกข้อมูลรายงานคือ
แผนงานที่อยู่ในประเภทงานทางและงานสะพาน



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลรายงาน

รายละเอียด

งานทาง	
ปีงบประมาณ	ID Code
2565	650144
แผนงาน	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน	
สำนัก	
สำนักบริหารบำรุงทาง	
สำนักงานทางหลวง	
สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)	

ข้อมูลรายงานจะประกอบด้วย

- ข้อมูลรายงาน
ในส่วนนี้คือรายละเอียดรายงานการทั้งหมด - ผู้ใช้สามารถแก้ไขรายงานการได้
- ข้อมูลผู้แก้ไขข้อมูลรายงาน
ในส่วนนี้ระบบจะกำหนดข้อมูลเมื่อมีการแก้ไขรายงานการล่าสุด

- รายละเอียดโครงการ
- การพิจารณาแผน
- ก่อนทำสัญญา
- ข้อมูลสัญญา/การดำเนินงาน
- งานดำเนินการเอง
- ข้อมูลทางบัญชี
- คณะกรรมการ
- กำหนดแผนดำเนินโครงการ
- ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย
- รายงาน

รายการงาน

ลำดับ	รายการงาน	รายละเอียดเพิ่มเติม	ปริมาณงาน หน่วย	ราคาต่อหน่วย
1	TACK COAT		34,640.00 ตร.ม.	15.25
2	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE		100.00 คัน	2,581.00
3	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK		34,640.00 ตร.ม.	309.75
4	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)		1,220.00 ตร.ม.	392.00
5	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION		1.00 LS.	5,500.00

[แก้ไขรายงาน](#)

ผู้แก้ไขข้อมูลรายงาน _____
 ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด _____



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลรายการงาน

ในขั้นตอนการแก้ไขรายการงาน

1. คลิก **แก้ไขรายการงาน**
2. ระบุที่ต้องการแก้ไข
3. คลิก **บันทึก**

1. **แก้ไขรายการงาน**

เอง ข้อมูลทางบัญชี คณะกรรมการ กำหนดแผนดำเนินงานโครงการ ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย รายการงาน

[เลือกรายการงานที่มีอยู่แล้ว](#) [เพิ่มรายการงานใหม่](#)

ลำดับ	รายการงาน	รายละเอียดเพิ่มเติม	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	
1	1.1 Removal Of Existing Asphalt Concrete Surface(งานรื้อผิวลาดยางเดิม)		0.000	SQ.M.	0.00	
2	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)		1,220.000	ตร.ม.	392.00	
3	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION		1.000	LS.	5,500.00	
4	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK		34,640.000	ตร.ม.	309.75	
5	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE		100.000	ตัน	2,581.00	
6	TACK COAT		34,640.000	ตร.ม.	15.25	

3. **บันทึก** ยกเลิก



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

• ข้อมูลรายการงาน

ในขั้นตอนการเพิ่มรายการงาน

1. คลิก **แก้ไขรายการงาน**
2. สามารถคลิก **เลือกรายการงานที่มีอยู่แล้ว** หรือ **เพิ่มรายการใหม่** เพื่อเพิ่ม
3. รายการที่จะถูกเพิ่มจำนวนแถวให้ระบุรายละเอียดข้อมูล
4. คลิก **บันทึก**

1.

2.

3.7

รายละเอียดเพิ่มเติม	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
	34,640.000	ตร.ม.	15.25
	100.000	ตัน	2,581.00
3 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	34,640.000	ตร.ม.	309.75
4 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	1,220.000	ตร.ม.	392.00
5 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	1.000	LS.	5,500.00
6	0.000		0.00
3.7	0.000		0.00

4.

เลือกรายการงาน

หมวดหมู่งาน:

ชื่อรายการงาน:

1. REMOVAL OF EXISTING STRUCTURE

- 1.2 Removal Of Existing Concrete Pavement(งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม)
- 1.3 Removal Of Existing Concrete Bridge(งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม)
- 1.4 Removal Of Existing Box Culverts(งานรื้อท่อเหลี่ยมเดิม)
- 1.5.1 Removal Of Existing Pipe Culverts Dia 0.30 m.(งานรื้อท่อกลมเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม.)
- 1.5.2 Removal Of Existing Pipe Culverts Dia 0.40 m.(งานรื้อท่อกลมเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.)
- 1.5.3 Removal Of Existing Pipe Culverts Dia 0.50 m.(งานรื้อท่อกลมเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.50 ม.)
- 1.5.4 Removal Of Existing Pipe Culverts Dia 0.60 m.(งานรื้อท่อกลมเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.)
- 1.5.5 Removal Of Existing Pipe Culverts Dia 0.80 m.(งานรื้อท่อกลมเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.80 ม.)
- 1.5.6 Removal Of Existing Pipe Culverts Dia 1.00 m.(งานรื้อท่อกลมเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม.)
- 1.5.7 Removal Of Existing Pipe Culverts Dia 1.20 m.(งานรื้อท่อกลมเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม.)
- 1.5.8 Removal Of Existing Pipe Culverts Dia 1.50 m.(งานรื้อท่อกลมเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 ม.)
- 1.6 Removal Of Existing Timber Bridges(งานรื้อสะพานไม้เดิม)
- 1.7 Removal Of Existing Bailey Bridges(งานรื้อสะพาน Bailey เดิม)



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

5). ดำเนินการเสร็จสิ้น

- สำหรับแผนงานหรือโครงการที่มีรูปแบบการดำเนินงาน “งานจ้างเหมา”
 - หมายถึง แผนรายประมาณการที่ส่วนกลางเห็นชอบแล้ว และมีเลขที่สัญญา,มีวันที่ตรวจรับงานแล้ว
- สำหรับแผนงานหรือโครงการที่มีรูปแบบการดำเนินงาน “งานดำเนินการเอง”
 - หมายถึง แผนรายประมาณการที่ส่วนกลางเห็นชอบแล้ว และต้องมีวันที่สิ้นสุดดำเนินการ(เกิดขึ้นจริง)
- สำหรับแผนงานหรือโครงการที่มีรูปแบบการดำเนินการ “งานจ้างเหมาและดำเนินการเอง”
 - หมายถึง แผนรายประมาณการที่ส่วนกลางเห็นชอบแล้ว ต้องมีเลขที่สัญญา,มีวันที่ตรวจรับงานแล้ว และต้องมีวันที่สิ้นสุดดำเนินการ(เกิดขึ้นจริง)



1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าดำเนินงาน

5). ดำเนินการเสร็จสิ้น

ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

ติดตามโครงการ

สรุปบัญชีแผนงาน งานทาง 2565

เมื่อแผนงานหรือโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นจะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือดำเนินงานเสร็จสิ้น โดยขั้นตอนนี้ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดแผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ใช้สามารถ - เรียกดูแผนที่ - ดูรายละเอียด

- รอจัดทำแผนรายการประมาณการ 0
- รอพิจารณาแผนรายการประมาณการ 39
- ระหว่างจัดจ้าง 2
- ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง 0
- ดำเนินงานเสร็จสิ้น 0**

ดำเนินงานเสร็จสิ้น รายละเอียด

ID code	รหัสงาน	หมายเลขทางหลวง	ชื่อตอน	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ปริมาณงาน (หน่วย)	งบประมาณเห็นชอบ	สทล.	แขวง	เลขที่สัญญา		
ไม่มีข้อมูลแผนรายการประมาณการ-งานทาง												
จำนวนแผนงาน							งบประมาณเห็นชอบรวม					
0 แผน							0.00 บาท					

เรียกดูแผนที่
